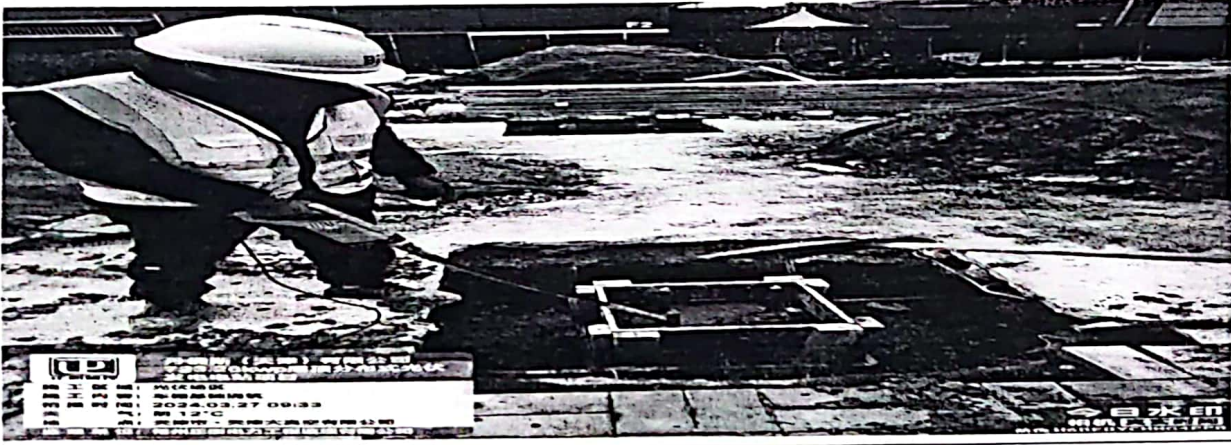


隐蔽旁站监理记录表

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-YBPZ-002

日期及气候: 2024.03.27 晴	工程地点: 天津丹佛斯福源道厂区
旁站监理的部位及工序: 车棚基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 9:00	旁站监理结束时间: 16:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 2、现场施工人员 10 人。 3、检查标高符合图纸设计要求, 定位放线符合要求。 4、模板、钢筋安装牢固, 基础尺寸符合图纸设计要求。 	
监理情况: 到达现场后, 检查施工单位现场质检、安全人员, 已到岗。 施工器具和材料已准备完成, 且设备运行正常。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽、防护手套等劳保用品	
发生情况: 无涨模、跑模现象, 振捣到位。	
处理意见: 无	
施工企业: 浙江华伏太阳能科技有限公司 施工项目部 (签字): 张洪叔 2024 年 3 月 27 日	监理企业: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员 (签字): 王仕华 2024 年 3 月 27 日
