


旁站监理记录表

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM6-ZHJL--001

日期及天气：2024.04.10 晴	施工单位：浙江华伏太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：车棚基础垫层浇筑	
旁站监理开始时间：2024.04.10 下午 17 点 40 分	旁站监理结束时间：2024.04.10 下午 18 点 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、东区车棚基础垫层浇筑； 2、施工人员 2 人，施工机械：混凝土灌车、振捣器 1 台，浇筑顺序及方法：按照施工方案、操作工艺施工； 3、施工工具：插入式振动棒 1 根、铁锹、木抹子、钢抹子； 4、质检员、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位； 5、混凝土浇筑过程符合设计要求；	
发现的问题及处理情况： 1、质检员已到位。 2、施工机械良好。 3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全。 4、混凝土塌落值 符合要求。 5、振捣方法：紧插慢拔，振捣点布置成梅花形，振捣间距不大于 500mm；振捣点时间及移位符合要求。 6、模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象。	
旁站监理人员（签字）： 邵荣 2024 年 4 月 12 日	

注：本表一式一份，监理项目部留存。

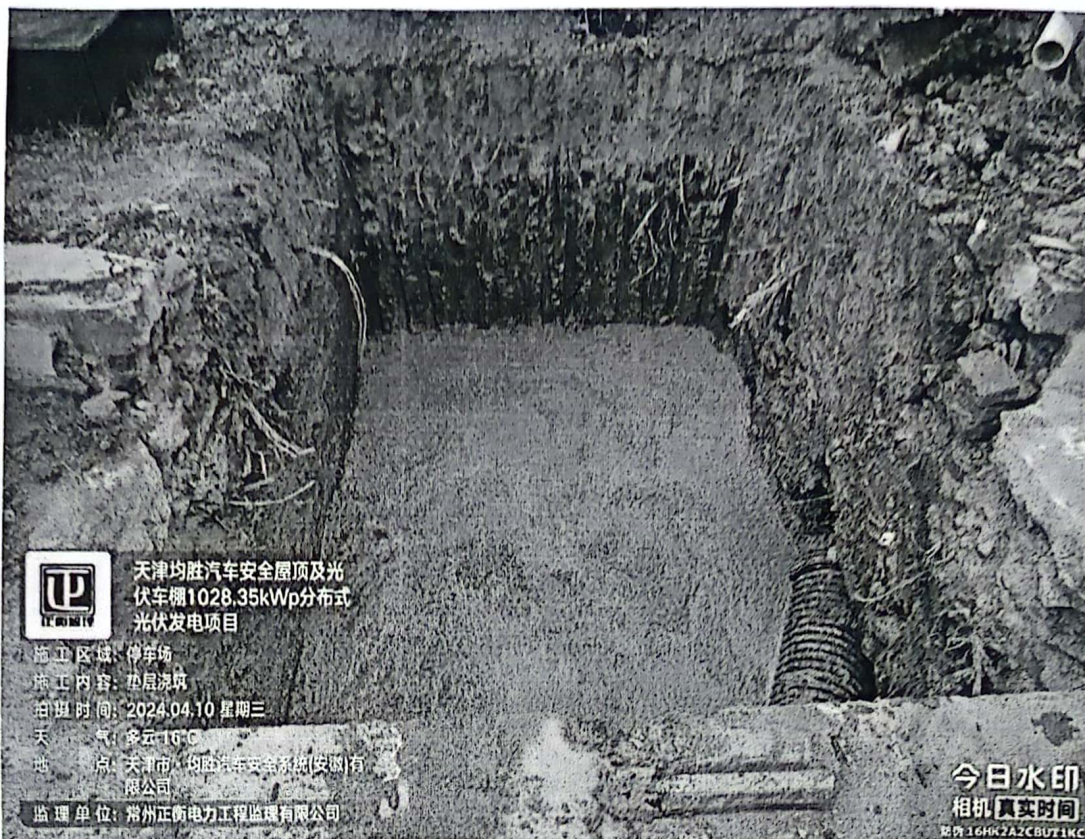

天津均胜汽车安全屋顶及光伏车棚1028.35kWp分布式光伏发电项目

施工区域: 停车场

施工内容: 垫层浇筑

拍摄时间: 2024.04.10 星期三

天气: 多云 16°C

地点: 天津市·均胜汽车安全系统(安徽)有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实时间

型号: 16H02A2C8UT1MC



天津均胜汽车安全屋顶及光伏车棚1028.35kWp分布式光伏发电项目

施工区域: 停车场

施工内容: 垫层浇筑

拍摄时间: 2024.04.10 星期三

天气: 多云 14°C

地点: 天津市·均胜汽车安全系统(安徽)有限公司

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机 真实时间

型号: 3TCUM702URUULH
