


旁站监理记录表

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目 编号:JNTX-JSDD-PZ-001

|                                                                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 日期及天气: 2024 年 07 月 08 日 晴                                                                                                    | 施工地点: 4 号车棚   |
| 旁站监理的部位或工序: 车棚基础垫层浇筑                                                                                                         |               |
| 旁站监理开始时间: 7:00                                                                                                               | 旁站监理结束时间 9:30 |
| 施工情况: 1、施工开始时间 8:00, 结束时间 9:30<br>2、现场施工人数 6 人, 管理人员 1 人。<br>3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。<br>4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C20 混凝土约 7 方。 |               |
| 监理情况:<br>1、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆情况发生。<br>2、表面平整度满足要求。<br>3、使用 C20 商品混凝土。                                                          |               |
| 发现问题:<br>振捣不均匀                                                                                                               |               |
| 处理意见:<br>加强对混凝土的振捣工作                                                                                                         |               |
| 备注 (包括处理结果)                                                                                                                  |               |
| 旁站监理人员: 丁峰<br>日期: 2024 年 7 月 8 日                                                                                             |               |



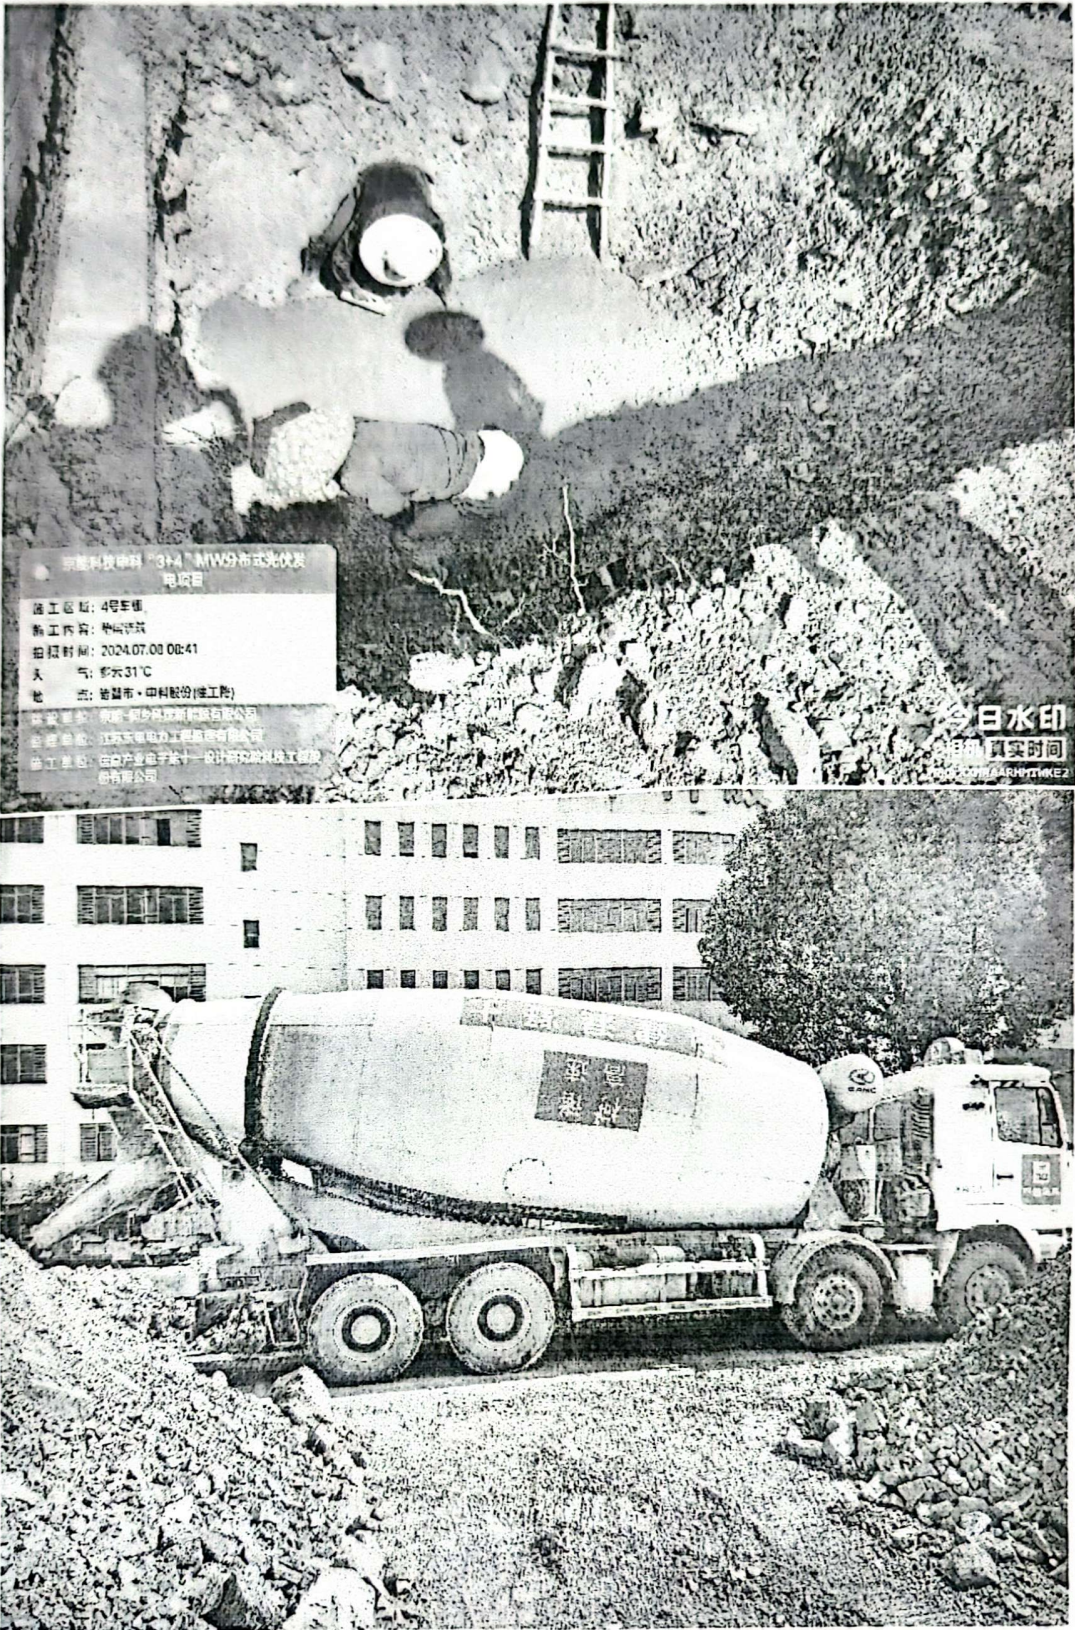

## 旁站监理记录表

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目 编号:JNTX-JSDD-PZ-002

|                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及天气: 2024 年 07 月 13 日 阴                                                                                                       | 施工地点: 4 号车棚    |
| 旁站监理的部位或工序: 车棚基础沉台浇筑                                                                                                            |                |
| 旁站监理开始时间: 11:40                                                                                                                 | 旁站监理结束时间 12:40 |
| 施工情况: 1、施工开始时间 11:40, 结束时间 12:40<br>2、现场施工人数 6 人, 管理人员 1 人。<br>3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。<br>4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C30 混凝土约 33 方。 |                |
| 监理情况:<br>1、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆情况发生。<br>2、表面平整度满足要求。<br>3、使用 C30 商品混凝土。                                                             |                |
| 发现问题:<br>现场施工人员未佩戴安全帽                                                                                                           |                |
| 处理意见:<br>加强现场管理                                                                                                                 |                |
| 备注 (包括处理结果)                                                                                                                     |                |
| 旁站监理人员: 陈<br>日期: 2024 年 7 月 13 日                                                                                                |                |



旁站监理记录表 JNTX-JSDD-PZ-002(附图)



旁站监理记录表

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目 编号:JNTX-JSDD-PZ-003

|                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 日期及天气: 2024 年 07 月 14 日 阴                                                                                                      | 施工地点: 行政楼     |
| 旁站监理的部位或工序: 水泥墩基础浇筑                                                                                                            |               |
| 旁站监理开始时间: 6:40                                                                                                                 | 旁站监理结束时间 8:40 |
| 施工情况: 1、施工开始时间 6:40, 结束时间 8:40<br>2、现场施工人数 10 人, 管理人员 1 人。<br>3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。<br>4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C40 混凝土约 12 方。 |               |
| 监理情况:<br>1、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆情况发生。<br>2、表面平整度满足要求。<br>3、使用 C40 商品混凝土。                                                            |               |
| 发现问题:<br>现场振捣不均匀                                                                                                               |               |
| 处理意见:<br>加强振捣                                                                                                                  |               |
| 备注 (包括处理结果)                                                                                                                    |               |
| 旁站监理人员: 陈<br>日期: 2024 年 7 月 14 日                                                                                               |               |



旁站监理记录表 JNTX-JSDD-PZ-003(附图)




旁站监理记录表

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目 编号:JNTX-JSDD-PZ-004

|                                                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 日期及天气: 2024 年 07 月 23 日 晴                                                                                                      | 施工地点: 宿舍楼     |
| 旁站监理的部位或工序: 水泥墩基础浇筑                                                                                                            |               |
| 旁站监理开始时间: 6:40                                                                                                                 | 旁站监理结束时间 9:40 |
| 施工情况: 1、施工开始时间 6:40, 结束时间 9:40<br>2、现场施工人数 10 人, 管理人员 1 人。<br>3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。<br>4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C40 混凝土约 24 方。 |               |
| 监理情况:<br>1、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆情况发生。<br>2、表面平整度满足要求。<br>3、使用 C40 商品混凝土。                                                            |               |
| 发现问题:<br>现场振捣不均匀                                                                                                               |               |
| 处理意见:<br>加强振捣                                                                                                                  |               |
| 备注 (包括处理结果)                                                                                                                    |               |
| 旁站监理人员: 陈<br>日期: 2024 年 7 月 23 日                                                                                               |               |



旁站监理记录表 JNTX-JSDD-PZ-004(附图)

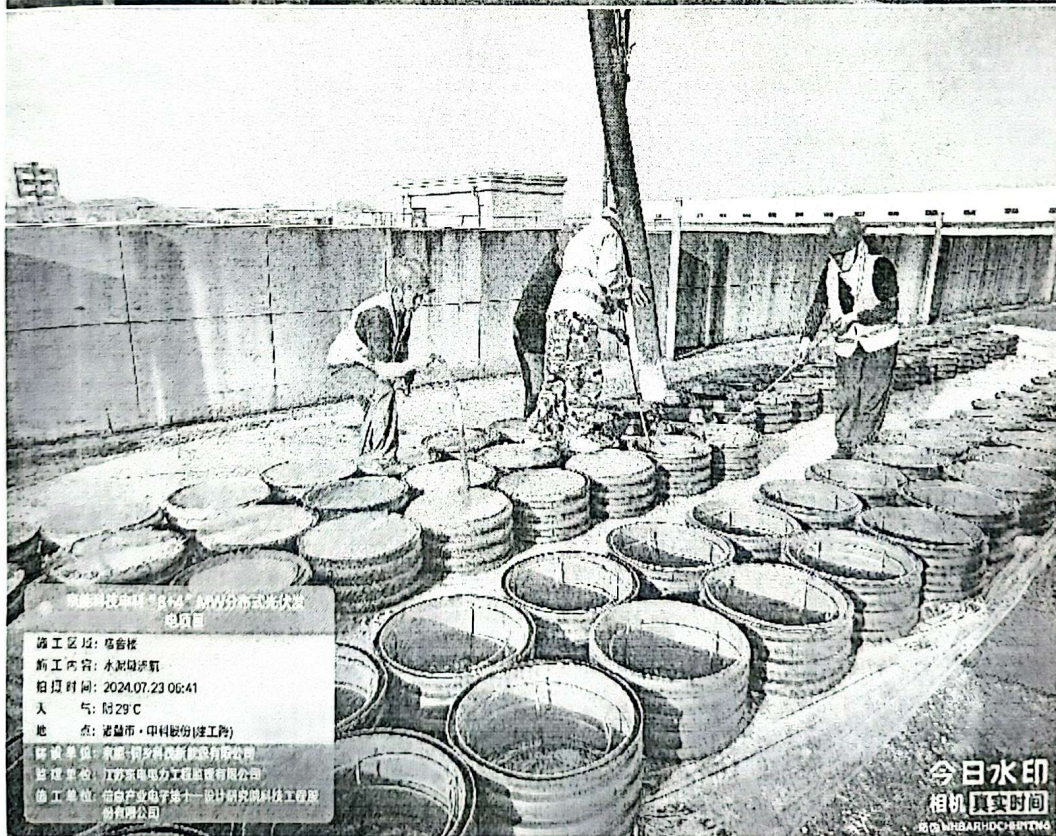

## 旁站监理记录表

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目 编号:JNTX-JSDD-PZ-005

|                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及天气: 2024 年 07 月 23 日 晴                                                                                                      | 施工地点: 4 号车棚    |
| 旁站监理的部位或工序: 4 号车棚短柱浇筑                                                                                                          |                |
| 旁站监理开始时间: 10:40                                                                                                                | 旁站监理结束时间 12:40 |
| 施工情况: 1、施工开始时间 10:40, 结束时间 12:40<br>2、现场施工人数 6 人, 管理人员 1 人。<br>3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。<br>4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C30 混凝土约 8 方。 |                |
| 监理情况:<br>1、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆情况发生。<br>2、表面平整度满足要求。<br>3、使用 C30 商品混凝土。                                                            |                |
| 发现问题:<br>现场临时用电电源线破损                                                                                                           |                |
| 处理意见:<br>更换电源线                                                                                                                 |                |
| 备注 (包括处理结果)                                                                                                                    |                |
| 旁站监理人员: 邵<br>日期: 2024 年 7 月 23 日                                                                                               |                |





## 旁站监理记录表

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目 编号:JNTX-JSDD-PZ-006

|                                                                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及天气: 2024 年 07 月 28 日 晴                                                                                                       | 施工地点: 3 号车棚    |
| 旁站监理的部位或工序: 3 号车棚垫层浇筑                                                                                                           |                |
| 旁站监理开始时间: 10:40                                                                                                                 | 旁站监理结束时间 12:40 |
| 施工情况: 1、施工开始时间 10:40, 结束时间 12:40<br>2、现场施工人数 6 人, 管理人员 1 人。<br>3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。<br>4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C15 混凝土约 12 方。 |                |
| 监理情况:<br>1、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆情况发生。<br>2、表面平整度满足要求。<br>3、使用 C15 商品混凝土。                                                             |                |
| 发现问题:                                                                                                                           |                |
| 处理意见:                                                                                                                           |                |
| 备注 (包括处理结果)                                                                                                                     |                |
| 旁站监理人员: 陈<br>日期: 2024 年 7 月 28 日                                                                                                |                |



旁站监理记录表 JNTX-JSDD-PZ-006(附图)



诸暨市恒兴混凝土有限公司发货单

|                 |              |      |      |                     |      |                   |
|-----------------|--------------|------|------|---------------------|------|-------------------|
| 施工单位            | 诸暨市恒兴混凝土有限公司 |      | 驾驶员  | 齐伟武                 | 本车方量 | 12 M <sup>3</sup> |
| 工程名称            | 诸暨市恒兴混凝土有限公司 |      | 运输车号 | 10-1                | 计划方量 | 12 M <sup>3</sup> |
| 施工部位            | 诸暨市恒兴混凝土有限公司 |      | 运距   |                     | 已完方量 | 12 M <sup>3</sup> |
| 强度等级            | C15          | 出货单号 | 发货时间 | 2024-07-28 08:27:19 | 累计车次 | 1                 |
| 塌落度             | 200±30mm     | 配比编号 | 到达时间 |                     | 发货人  | 180-78            |
| 管径              |              | 合同编号 | 卸货时间 |                     | 签收人  | 180-78            |
| 备注: 15858225286 |              |      |      |                     |      |                   |




旁站监理记录表

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目 编号:JNTX-JSDD-PZ-007

|                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及天气: 2024 年 07 月 31 日 晴                                                                                                      | 施工地点: 3 号车棚    |
| 旁站监理的部位或工序: 3 号车棚沉台浇筑                                                                                                          |                |
| 旁站监理开始时间: 8:40                                                                                                                 | 旁站监理结束时间 12:30 |
| 施工情况: 1、施工开始时间 8:40, 结束时间 12:30<br>2、现场施工人数 6 人, 管理人员 1 人。<br>3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。<br>4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C30 混凝土约 29 方。 |                |
| 监理情况:<br>1、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆情况发生。<br>2、表面平整度满足要求。<br>3、使用 C30 商品混凝土。                                                            |                |
| 发现问题:                                                                                                                          |                |
| 处理意见:                                                                                                                          |                |
| 备注 (包括处理结果)                                                                                                                    |                |
| 旁站监理人员: 杨<br>日期: 2024 年 7 月 31 日                                                                                               |                |



旁站监理记录表 JNTX-JSDD-PZ-007(附图)

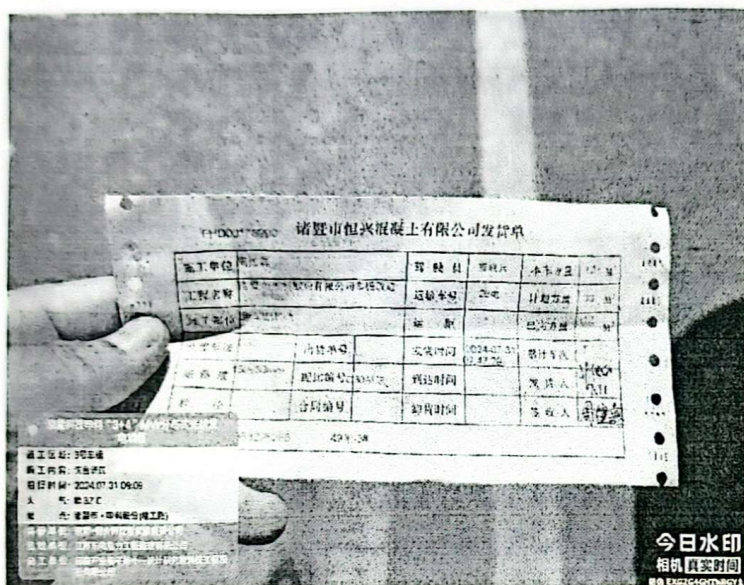

旁站监理记录表

工程名称:京能科技申科“3+4”MW 分布式光伏发电项目 编号:JNTX-JSDD-PZ-008

|                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 日期及天气: 2024 年 08 月 08 日 晴                                                                                                      | 施工地点: 1#2#5#车棚 |
| 旁站监理的部位或工序: 1#2#5#车棚垫层浇筑                                                                                                       |                |
| 旁站监理开始时间: 9:40                                                                                                                 | 旁站监理结束时间 12:30 |
| 施工情况: 1、施工开始时间 9:40, 结束时间 12:30<br>2、现场施工人数 6 人, 管理人员 1 人。<br>3、现场配备振动棒振捣, 施工机具设备完好, 运转正常。<br>4、当班完成混凝土浇筑施工, 使用 C15 混凝土约 22 方。 |                |
| 监理情况:<br>1、浇筑顺序与施工方案一致, 无漏浆情况发生。<br>2、表面平整度满足要求。<br>3、使用 C15 商品混凝土。                                                            |                |
| 发现问题:                                                                                                                          |                |
| 处理意见:                                                                                                                          |                |
| 备注 (包括处理结果)                                                                                                                    |                |
| 旁站监理人员: 张<br>日期: 2024 年 8 月 8 日                                                                                                |                |



