

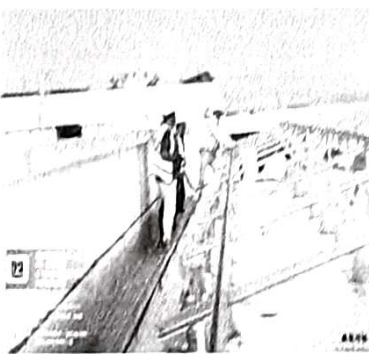
旁站监理记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：DBFCWS-ZH-JL-PZ-001

日期：2025 年 04 月 14 日 天气：晴	施工单位：浙江华伏太阳能科技有限公司
旁站监理的部位或工序：1#至 2#楼中间电缆沟浇筑	
旁站开始时间：2020 年 08 月 08 日 14 时 00 分	旁站结束时间：2025 年 04 月 08 日 15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况： - 商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 - 施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 1 台。 - 现场有混凝土工 4 人、钢筋工 1 人、人员是☒否☐符合要求。 - 质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 - 施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 - 混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。 - 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 - 混凝土标号 C30，浇筑 6 m³，混凝土试块是☒否☐见证取样，混凝土坍落度实测 1 次，分别为 162mm 是☒否☐符合要求。 - 收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☒加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：周飞	2025 年 04 月 14 日

旁站监理记录

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：DBFCWS-ZH-JL-PZ-002

日期及气候：2025 年 05 月 3 日	工程地点：1#、2#楼
旁站监理的部位或工序：1 号楼至配电室，2 号楼至配电室，电缆敷设	
旁站监理开始时间：8：30	旁站监理结束时间：17：00
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 4、7 人施工，操作员 1 名， 5、吊车一台 6、现场设备配备齐全，可以开始电缆敷设。 	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、电缆型号：3*95、1*35、3*70、3*25、	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：浙江华伏太阳能科技有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：刘健	旁站监理人员：周勇
日 期：2025 年 05 月 3 日	日 期：2025 年 05 月 3 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。

监理旁站记录表

工程名称：德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：DBFCWS-ZH-JL-PZ-003

工程名称	德必福宠物食品（滁州）有限公司 0.78MW 屋顶分布式光伏发电项目	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司																																	
旁站部位或 关键工序	配电室低压并网柜电缆头制作																																			
旁站开始时间	2025 年 05 月 04 日 8: 20 分	旁站结束时间	2025 年 05 月 04 日 19: 00																																	
电缆规格型号	ZC-YJV、3*25、ZC-YJV、3*70、 ZC-YJV、3*95	电缆头部位	低压并网柜																																	
质检人员		施工人员																																		
监理旁站情况： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">号</th> <th style="width: 75%;">检查内容</th> <th style="width: 20%;">检查结果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>电缆外观无损伤，预留长度合适</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td></td> <td>电缆绝缘检测合格</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td></td> <td>电缆头配件、附件齐全，无损伤</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td></td> <td>削开电缆端部后，电缆线芯检查无损伤</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td></td> <td>电缆头制作工艺程序按规范标准进行</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td></td> <td>热缩电缆终端头制作符合制造厂工艺规定</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td></td> <td>接地线铜鼻子表面镀锡，光滑、干净</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td></td> <td>铜鼻子与电缆线芯压接合格</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td></td> <td>电缆头相色标识明显，相序正确</td> <td>符合要求</td> </tr> <tr> <td></td> <td>电缆头制作完后，堵漏、防潮、密封措施到位，绝缘检测合格</td> <td>符合要求</td> </tr> </tbody> </table>				号	检查内容	检查结果		电缆外观无损伤，预留长度合适	符合要求		电缆绝缘检测合格	符合要求		电缆头配件、附件齐全，无损伤	符合要求		削开电缆端部后，电缆线芯检查无损伤	符合要求		电缆头制作工艺程序按规范标准进行	符合要求		热缩电缆终端头制作符合制造厂工艺规定	符合要求		接地线铜鼻子表面镀锡，光滑、干净	符合要求		铜鼻子与电缆线芯压接合格	符合要求		电缆头相色标识明显，相序正确	符合要求		电缆头制作完后，堵漏、防潮、密封措施到位，绝缘检测合格	符合要求
号	检查内容	检查结果																																		
	电缆外观无损伤，预留长度合适	符合要求																																		
	电缆绝缘检测合格	符合要求																																		
	电缆头配件、附件齐全，无损伤	符合要求																																		
	削开电缆端部后，电缆线芯检查无损伤	符合要求																																		
	电缆头制作工艺程序按规范标准进行	符合要求																																		
	热缩电缆终端头制作符合制造厂工艺规定	符合要求																																		
	接地线铜鼻子表面镀锡，光滑、干净	符合要求																																		
	铜鼻子与电缆线芯压接合格	符合要求																																		
	电缆头相色标识明显，相序正确	符合要求																																		
	电缆头制作完后，堵漏、防潮、密封措施到位，绝缘检测合格	符合要求																																		
☒ 旁站过程正常，相关施工符合设计及规范要求。 ☐ 旁站过程发现问题及处理：无。																																				
旁站监理人员：周百 日期：2025.05.04																																				

表 A.0.6 旁 站 记 录

工程名称: 德必福宠物食品(滁州)有限公司 0.75MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: DBFCWS-ZH-JL-PZ-004

旁站的关键部位、 关键工序	1#楼屋面逆变器交流电缆 头制作安装	施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司
旁站开始时间	2025 年 05 月 07 日 07 时 30 分	旁站结束时间	2025 年 05 月 07 日 17 时 00 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。
- 2、施工管理人员 1 人、安装人员 3 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。
- 3、电缆型号, 电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。
- 4、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全, 无损伤。
- 5、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。
- 6、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 7、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 8、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。

发现问题及处理情况:

发现问题: 电缆头制作过程中发现铜鼻子压接棱角未打磨平。

采取措施: 现场告知施工人员, 对压接头进行打磨。

整改完成已打磨平

旁站监理人员(签字) 周飞

2025 年 05 月 07 日

注: 本表一式 1 份, 项目监理机构留存。
