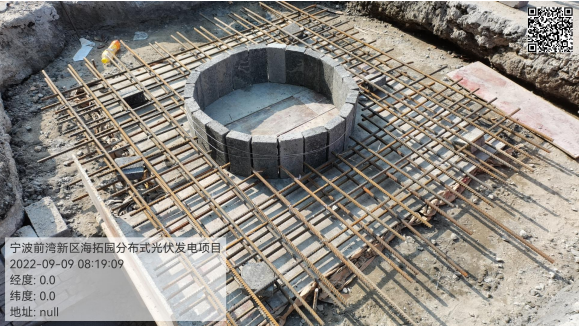
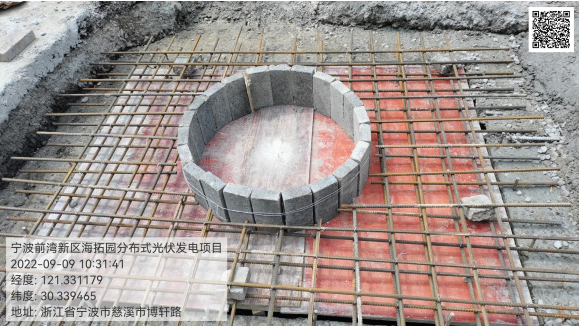
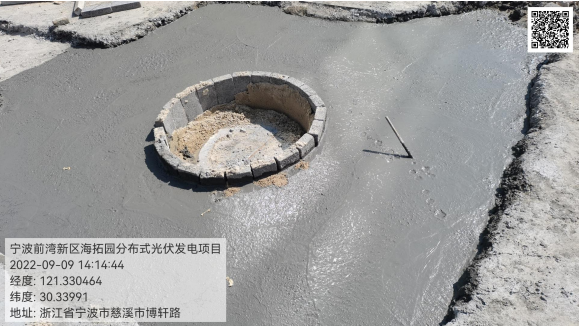
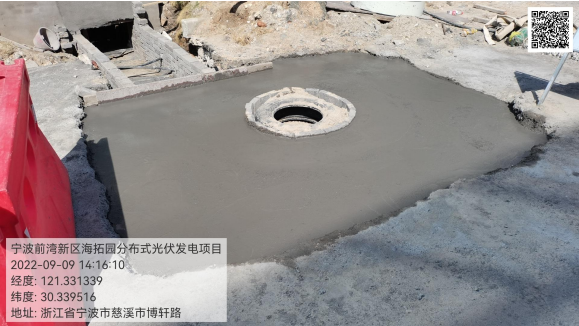


旁站监理记录表

工程名称：宁波前湾新区海拓园7.0MWP分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-QWHTY-PZJL-20220909

日期及天气：2022年09月09日 晴	施工单位：宁波信基建设有限公司
旁站监理的部位或工序：杭州湾新区海拓智创园内五座电缆井井口砼浇筑	
旁站监理开始时间：14：00	旁站监理结束时间：16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、海拓智创园内五座电缆井井口进行砼浇筑。 2、现场施工人员：6人，管理人员：3人。 3、施工机械：商砼车两辆，震动棒两把，铁锹四把，小推车两辆等。 4、图纸要求混凝土强度等级达到C30强度，现场采用C30强度商品砼，符合图纸要求。现场在浇筑过程中要求工人对电缆井周边设施保护好的同时进行浇筑砼，在支模模具内混凝土浇筑振捣充分，表面抹灰平整，作业过程安全，施工过程符合要求。  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-09-09 08:19:09 经度: 0.0 纬度: 0.0 地址: null  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-09-09 10:31:41 经度: 121.331179 纬度: 30.339465 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-09-09 14:14:44 经度: 121.330464 纬度: 30.33991 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路  宁波前湾新区海拓园分布式光伏发电项目 2022-09-09 14:16:10 经度: 121.331339 纬度: 30.339516 地址: 浙江省宁波市慈溪市博轩路	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：	
年 月 日	

注：本表一式 3 份，由监理项目部留存。
