

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布 式光伏发电项目

初验报告

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目部

2019 年 04 月

一、 检验概况			
工程名称	上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目		
初检依据	见附页		
二、 工程概况			
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位	浙江诸安建设集团有限公司	建设管理单位	上海航天智慧能源技术有限公司
上海航天通讯电子设备研究所分布式光伏发电项目，位于上海市闵行区中春路 1777 号，地理位置经纬度 31.0565 度 N, 121.3886 度 E。利用单位房顶，主要有产品总装试验楼，天线测试楼，科研办公楼，综合研发楼，电装调试楼，试验楼等 6 幢楼。楼面主要以混凝土为主，只有极少部分为彩钢瓦屋面，都具有极好的承载能力，占房顶总面积 10000 平方左右，拟装机容量 0.92MWp，总投资 500 万元，拟多点 380V 低压侧并网，采用自发自用，余电上网的方式运营。 本工程自 2019 年 01 月 08 日正式开工，在各参建单位共同努力下，土建和电气安装工程，7 个光伏发电区域的施工，于 2019 年 04 月完工，施工项目部均向项目监理部提出预验收申请。			

三、 综合评价	
质 量 体 系 及 实 施 情 况	上海航天电子通讯设备研究所1MWp分布式光伏发电项目施工单位在施工过程中按照质保体系要求开展工作，组织机构健全，制定了一系列工程管理程序，并认真执行，做到了施工过程可控、在控，质量体系运转正常，保证了工程施工质量。质量目标明确，质量规划和质量手册齐全，施工记录完整。质量管理体系、技术管理制度、物资管理制度、计量管理制度齐全。
料 主 检 要 查 技 情 术 况 资	施工前期资料基本完整，过程资料欠缺需要及时整理归档，质保资料未整理，材料复试资料未提供需要整理。
工 程 情 况 重 点 抽 查	箱逆变、全站电缆、全站防雷及接地装置、屋顶支架、组件、保护屏柜等电气设备安装固定牢固、可靠；垂直度、水平度、安装尺寸偏差符合规范要求；设备各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，密封良好；设备无锈蚀，油漆层或外镀层完整，相色标志正确，设备接地良好。但现场仍存在施工质量问题。
四、附件： 监理初验缺陷整改反馈表等	
五、主要改进建议： 见附页	
六、结论 本次检查验收，主要对工程施工项目部技术资料、现场工程质量进行了检查验收，通过检查确实发现了一些问题，希望项目部针对存在的问题进行积极的整改，整改完成后报项目监理项目部复检。	
验收负责人（签字）： _____ 日 期： _____年__月__日	

附页 1

验收依据

法律法规文件

- 中华人民共和国建筑法（主席令第 46 号 2011 年 7 月 1 日起施行）
- 建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号 2000 年 1 月 30 号起执行）
- 中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 电力工程部分 2011 版
- 中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分 2013 版
- 《中华人民共和国合同法》
- 《中华人民共和国招标投标法》
- 国务院（1999）第 279 号令《建设工程质量管理条例》。
- 国务院（2003）第 393 号令《建设工程安全生产管理条例》。

工程管理文件

- 《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》（国家电网工〔2003〕153 号）
- 电力行业标准 DL/T5434-2009《电力工程建设监理规范》。
- 电力建设施工质量验收及评价规程 DL/T52101-9—2009
- 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量[2010]19 号）

号）

- 《输变电站工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW248-2008 ）
- 《国家电网公司业、监理、施工项目部标准化管理手册(2014 版)》

工程设计文件及规程规范

- 本工程承包合同、设计文件及变更资料
- 本工程的监理合同及《监理大纲》；
- 标准、规程、规范 、地质勘测报告
- 本工程监理依据的主要技术标准、规程、规范包括但不限于：

序号	标 准 名 称	标准号
1	《建筑工程施工质量验收统一标准》	GB 50300-2001
2	《建筑地基基础工程施工质量验收规范》	GB 50202-2002
3	《砌体工程施工质量验收规范》	GB 50203-2011
4	《混凝土结构工程施工质量验收规范》（2011 版）	GB 50204-2002
5	《屋面工程施工质量验收规范》	GB 50207-2002
6	《地下防水工程施工质量验收规范》	GB 50208-2011

7	《建筑地面工程施工质量验收规范》	GB 50209-2010
8	《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》	GB 50210-2001
9	《建筑防腐工程施工及验收规范》	GB 50212-2002
10	《给水排水管道工程施工及验收规范》	GB 50268-2008
11	《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50303-2002
12	《工程测量规范》	GB 50026-2007
13	《钢筋焊接及验收规程》	JGJ 18-2012
14	《建筑用砂》	GB/T 14684-2011
15	《建筑用卵石、碎石》	GB/T 14685-2011
16	《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》	JGJ 52-2006
17	《钢筋混凝土用钢 第 1 部分：热轧光圆钢筋》	GB 1499.1-2008
18	《钢筋混凝土用钢 第 2 部分：热轧带肋钢筋》	GB 1499.2-2007
19	《电气装置安装工程质量检验及评定规程》	DL/T5161.1~17-2002
20	《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》	GB50147-2010
21	《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》	GB50149-2010
22	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》	GB 50150-2006
23	《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》	GB 50168-2006
24	《电气装置安装工程接地装置施工及验收规程》	GB 50169—2006
25	《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》	GB 50171-2012
26	《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》	GB 50254-1996

监理初验缺陷整改反馈表

工程名称：上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

根据 2019 年 04 月 18 日工程投运前阶段验收情况，存在以下缺陷，按相应处理措施整改后复验：

内容： 2019 年 04 月 18 日监理项目部组织监理人员及施工单位相关人员对施工现场及施工资料进行初检。对工程施工质量及施工资料发现如下质量问题：

一、支架混凝土模块制作

- 1；屋面卫生未清理干净。
- 2；混凝土模块模具胀模。
- 3；模块表面有蜂窝麻面现象。
- 4；预埋件深度不符合要求。

二、逆变器设备及施工

- 1、逆变器未加装防护雨搭
- 2、防火封堵不符合规范。
3. 逆变器 4 平方进线排列不整齐。

三、屋面支架组件安装

- 1、屋面施工残留纸片未清理干净。
- 2、屋面接地有个别不符合要求
- 3、屋面组件边压安装不牢固，
- 4、屋面部分电缆保护软管保护不到位。
- 5、屋面部分 MC4 接头紧固不到位。
- 6、屋面电缆桥架盖板个别固定不牢固。
- 7、屋面组件上有异物、尘土等立即清理。

四、工程资料及其他

- 1、工程材料设备厂家资料、复试报告未报审。
- 2、工程施工资料、竣工资料不完整。

五、整改期限

以上问题由总承包项目部接到通知后立即整改，对施工资料进行自查，整改完成后报监理项目部复查。


现场问题照片见附件《监理初检问题清单》。

复查意见		复查人		复查日期	
------	--	-----	--	------	--

附件：

监理初检问题清单

主送	上海航天智慧能源技术有限公司	
工程名称	上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目	
建设管理单位	上海航天智慧能源技术有限公司	业主项目经理：陈晨
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	总监：徐耀生
设计单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	设计总：苗莉云
施工单位	浙江诸安建设集团有限公司	施工项目经理：刘东方
检查日期	2019 年 04 月 18 日	
检查人	陈晨，张金星，刘东方	
一、 现场问题：		
1 支架连接部位螺丝缺少垫片		
		
2、组件电缆较乱未整理。		

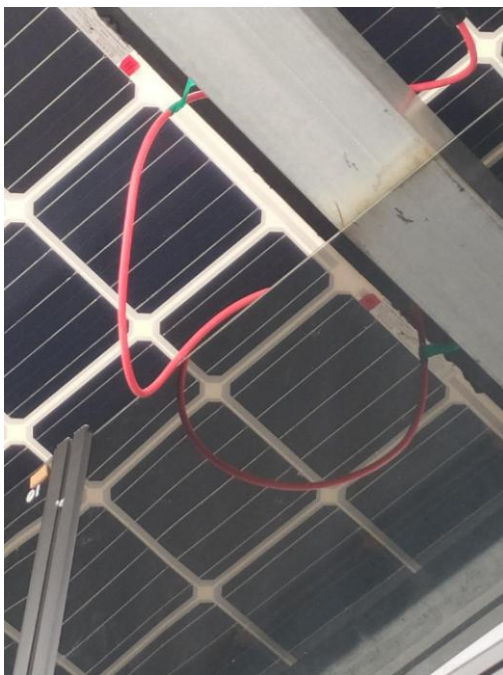


3、屋面施工残留纸片未清理干净。



4、屋面组件边压安装不牢固，



5、屋面部分电缆保护软管保护不到位。

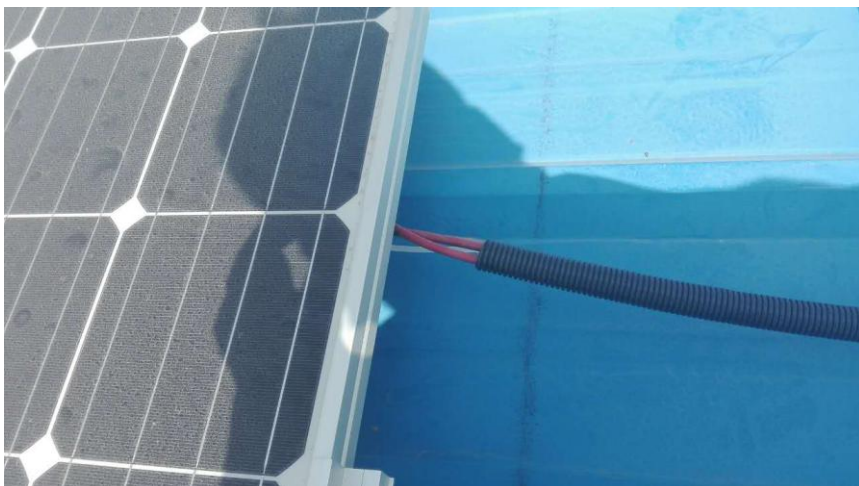

6、屋面部分 MC4 接头紧固不到位。



7、屋面电缆桥架盖板个别固定不牢固。



8、屋面组件上有异物、尘土等立即清理。

上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目部

2019 年 04 月 18 日
