
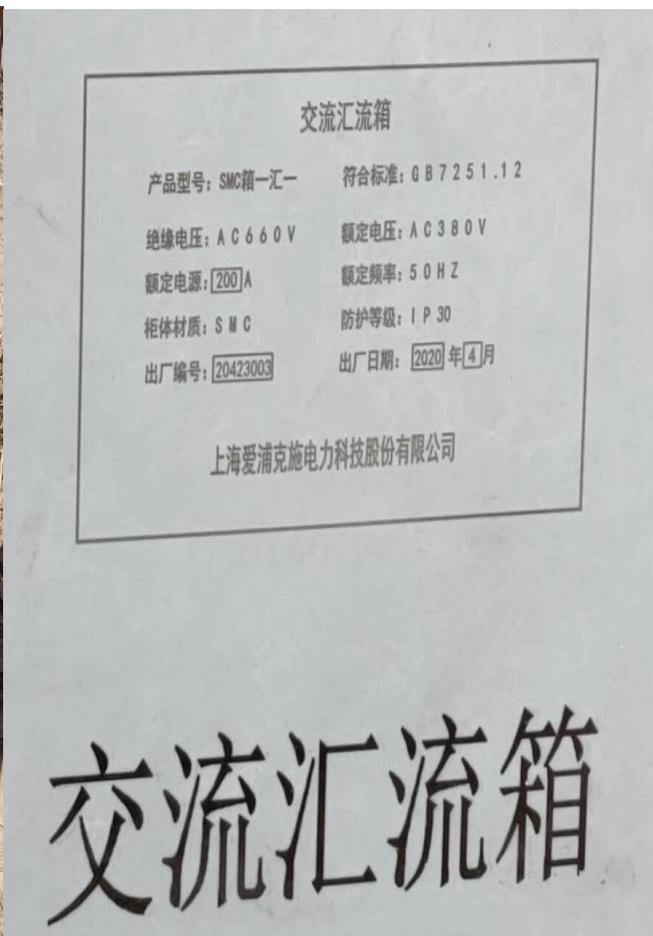


监理复验整改清单

工 程 名 称	崇礼区 9、28 个村级光伏扶贫电站项目
建 设 单 位	张家口崇礼区城镇建设发展有限公司
运 维 单 位	张家口崇礼区城发新能源有限公司
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位（一标段）	山东军辉建设集团有限公司
设计单位（一标段）	河北冀电电力工程设计咨询有限公司
参加复验人员	建设单位：张贵成 运维单位：李长城 乔占虎 杨海博 监理单位：贲振军 施工单位：张建峰
复验时间	2020 年 04 月 28 日

三道沟电站汇流箱外观尺寸、柜体防护等级、断路器型号不符合设计要求，详见设计图纸 JD-F-1905Z-D07；近期运维单位在巡查时发现个别电站存在断路器烧毁现象，建议把型号 200A 的断路器更换为型号 225A 的断路器（国标一线品牌）

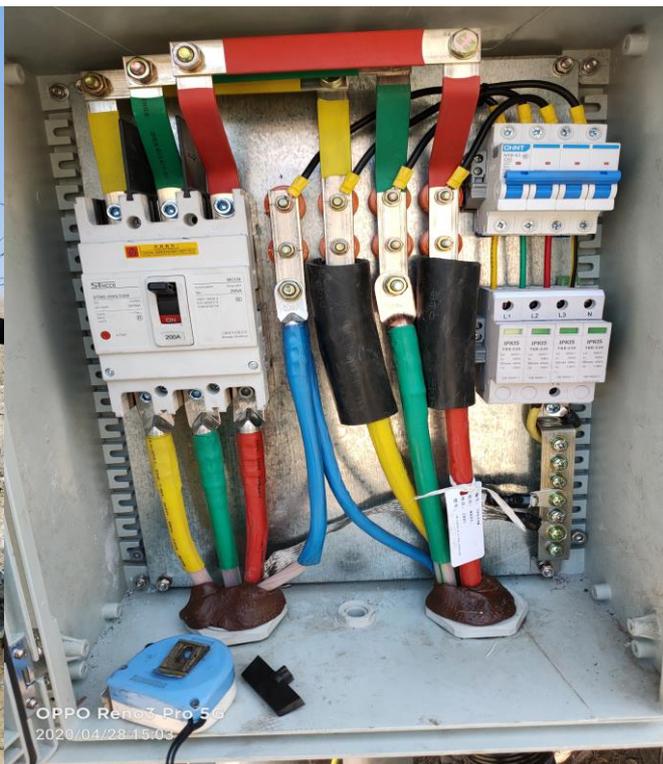

更换并网柜标识



逆变器无标识



并网柜基础不符合设计要求（详见图纸 JD-F1905Z-T0101）



PE穿线管安装不规范



密封圈未安装到位



角钢断面未做防腐



防雷接地扁钢黄绿漆漏刷



接地线松动



支架斜撑角钢未安装螺栓



箱变内没有配备灭火器



箱变外观破损无标识



防雷接地扁钢没有做防腐、没有回填、直埋电缆无指示桩



箱变基础抹灰不符合要求



箱变四周无围栏 (详见图纸B19050S-T0101-03)



T接杆处镀锌套管处未做防火封堵, 管壁毛刺未处理

