

廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 监 理 初 检 报 告

廊坊和平铝业分布式光伏发电项目监理部



2023年03月

一、 检验概况			
工程名称	廊坊和平铝业分布式光伏发电项目		
初检依据	见附页		
二、 工程概况			
设计单位	杭州鸿晟电力设计咨询有限公司	监理单位	江苏泽翊工程项目管理有限公司
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	建设管理单位	杭州杭阳新能源开发有限公司
<p>廊坊和平铝业分布式光伏发电项目</p> <p>本项目共铺设 12600 块 460W 光伏组件，共三个屋面 1#挤压车间 4535 块，2#挤压车间 3384 块，3#挤压车间 4680 块组件，选用 43 台 110kw 逆变器 2 台 40kw 逆变器，经逆变后至新增的 15 台光伏并网柜 5 台并网总柜，所发电量先由厂区负荷消纳，剩余部分倒送至电网，从而实现“自发自用余电上网”。</p> <p>本工程自 2022 年 12 月 23 日正式开工，在各参建单位共同努力下，3 个屋面光伏发电区域的施工，于 2023 年 03 月 15 日完工，施工项目部向项目监理部提出预验收申请。</p>			
三、 综合评价			
质量体系及实施情况	<p>廊坊和平铝业分布式光伏发电项目施工单位在施工过程中按照质保体系要求开展工作，组织机构健全，制定了一系列工程管理程序，并认真执行，做到了施工过程可控、在控，质量体系运转正常，保证了工程施工质量。质量目标明确，质量规划和质量手册齐全，施工记录完整。质量管理制度、技术管理制度、物资管理制度、计量管理制度齐全。</p>		

料 主 检 要 查 技 情 术 况 资	所有工程材料质保资料齐全。所有工程材料已做复试实验。但施工资料仍存在不完整现象需进一步完善。
工 程 情 重 况 点 抽 查	屋顶支架、组件、汇流箱、电缆桥架电缆敷设、接地安装等安装固定牢固、可靠；垂直度、水平度、安装尺寸偏差符合规范要求；各部件完好无损；电气连接可靠，接触良好，无锈蚀，油漆层或外镀层完整，接地良好。但现场仍存在施工质量问题。
四、附件：监理初验缺陷整改反馈表等	
五、主要改进建议： 见附页	
六、结论 本次检查验收，主要对工程施工项目部技术资料、现场工程质量进行了检查验收，通过检查确实发现了一些问题，希望项目部针对存在的问题进行积极的整改，整改完成后报项目监理项目部复检。	

附页 1

验收依据

- 中华人民共和国建筑法（主席令第 29 号 2019 年 4 月 23 日起施行）
- 建设工程质量管理条例（国务院令第 279 号 2000 年 1 月 30 号起执行）
- 中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 电力工程部分 2016 版
- 中华人民共和国 工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分 2013 版
- 《中华人民共和国合同法》
- 《中华人民共和国招标投标法》
- 国务院（1999）第 279 号令《建设工程质量管理条例》。
- 国务院（2003）第 393 号令《建设工程安全生产管理条例》。

工程管理文件

- 《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》（国家电网工（2003）153 号）
- 电力行业标准 DL/T5434-2021《电力工程建设监理规范》。
- 电力建设施工质量验收及评价规程 DL/T 5210.1-2021
- 《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》（基建质量[2010]19

号）

- 《输变电站工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW10248.1--2016）
- 《国家电网公司业、监理、施工项目部标准化管理手册(2021 版)》

工程设计文件及规程规范

- 本工程承包合同、设计文件及变更资料
- 本工程的监理合同及《监理大纲》；
- 标准、规程、规范、地质勘测报告
- 本工程监理依据的主要技术标准、规程、规范包括但不限于：

序号	标准名称	标准号
1	光伏并网技术要求	GB/T 19939-2005
2	光伏电站接入电力系统技术规定	GB/T 19964-2012
3	光伏电站接入电力系统设计规范	GB/T 50866-2013
4	光伏发电接入配电网设计规范	GB/T 50865-2013
5	光伏发电系统接入配电网技术规定	GB/T 29319-2012
6	光伏电站设计规范	GB 50797-2012
7	光伏电站施工规范	GB 50794-2012
8	光伏发电工程施工组织设计规范	GB/T 50795-2012
9	光伏发电工程验收规范	GB/T 50796-2012
10	光伏电站并网验收规范	Q/GDW 1999—2013
11	光伏电站无功补偿技术规范	GB/T 29321-2012
12	并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法	GB/T 30427-2013
13	光伏发电系统用电缆	
	第一部分：一般要求	CEEIA B218.1-2012
	第二部分：交直流传输电力电缆	CEEIA B218.2-2012
	第三部分：控制电缆	CEEIA B218.3-2012
	第四部分：计算机及仪表电缆	CEEIA B218.4-2012
14	并网光伏电站启动验收技术规范	GB/T37658-2019
15	光伏发电调度运行管理规范	Q/GDW 1997—2013
16	并网光伏发电监控系统技术规范	NB/T 32016-2013
17	光伏电站环境影响评价技术规范	NB/T 32001-2012
18	光伏电站太阳能资源实时监测技术规范	NB/T 32012-2013
19	制造商提供的有关技术文件、安装手册（指导书）	

中间验收监理初验缺陷整改反馈表

工程名称：廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

根据 2023 年 03 月 13 日工程屋面组件安装阶段验收情况，存在以下缺陷，按相应处理措施整改后复验：

内容：2023 年 03 月 13 日监理项目部组织监理人员及施工单位相关人员对施工现场及施工资料进行初检，业主单位共同参加。对工程施工质量及施工资料发现如下质量问题：

一、屋面支架组件安装

- 1、组件压条安装不符合要求。
- 2、接地扁铁连接处，搭接面不足。
- 3、屋面彩钢瓦损坏现象较严重。
- 4、组件中、边压块安装不到位。
- 5、光伏专用线有外露现象，穿管不符合要求。
- 6、逆变器穿线管未做防火封堵。
- 7、桥架盖板绑扎不到位。
- 8、接地扁铁未固定。
- 9、接地扁铁接地点未刷黄绿漆。

二、工程资料



- 1、工程材料设备厂家资料、复试报告未报审。
- 2、工程施工资料不完整。

附件:

监理初检问题清单

主 送	浙江阳明电力建设有限公司	
工 程 名 称	廊坊和平铝业分布式光伏发电项目	
建设管理单位	杭州杭阳新能源开发有限公司	业主项目经理:
监 理 单 位	江苏泽翊工程项目管理有限公司	总 监: 王海东
设 计 单 位	杭州鸿晟电力设计咨询有限公司	设 总:
施 工 单 位	浙江阳明电力建设有限公司	施工项目经理:
检 查 日 期	2023年03月13日	
检 查 人	张亚博 邱华 戚越	



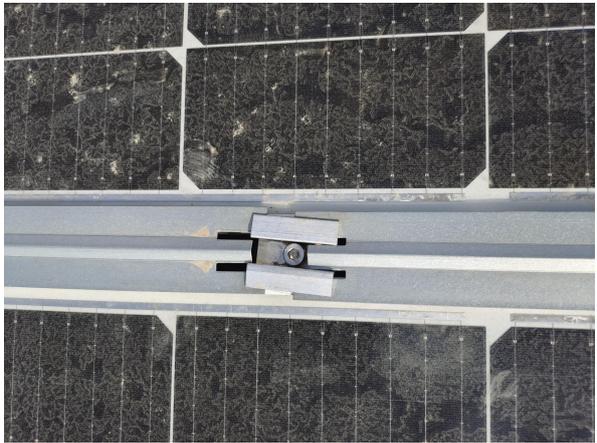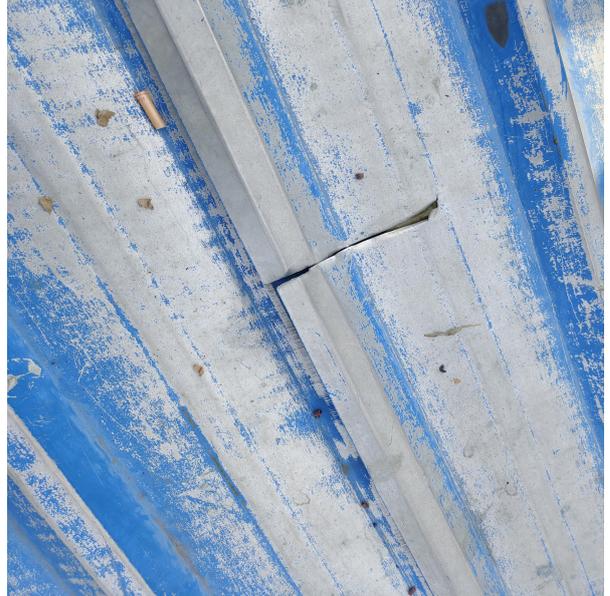



以上问题由总承包项目部接到通知后立即整改，对施工资料进行自查，整改完成后报监理项目部复查。

宜兴怡光环保自发自用光伏项目监理项目部

2023年03月13日
