

工程签证单

工程名称: 山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏项目

编号: JLZT-GCQZ 003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

晋中浙泰光伏发电有限公司 业主项目部:

事由: 工程签证事宜

内容:

1、因现场 1#、6#、3#、4#四个箱逆变基础下方有吉利厂区的污水及雨水排放管道,影响到设备基础垫层及后续工作无法正常施工,按照要求现场已整改完毕,所增加材料清单及工作量清单(详见附表六),请贵方审核。

2、现场 8 个箱逆变基础基坑开挖期间由于所提供的地下管网图纸与现场不符,在开挖过程中不慎将 1#、6#、3#、4#四个基础基坑内排水管道挖破。我方已紧急修复,所增加材料清单及工作量清单(详见附表七),请贵方审核。

施工项目部(章)

项目负责人:

日期:



监理项目部审查意见:

情况属实,请业主方给予意见。

监理项目部(章):

总监理工程师:

日期:



建设管理单位审批意见:

情况属实,后应附所量尺寸照片

李刚

2017.12.03

建设管理单位(章):

项目负责人:


日期:



注: 本表一式 3 份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存 1 份。

附表六：

整改污水管道、雨水管道工作量及材料清单


序号	名称	规格	工作内容	单位	数量	备注
一、工作量明细						
1	挖掘机	一台	开挖土方	天	2	
2	工程车	一辆	倒运土方	天	2	
3	管道工	5人	安装管道、检查井	天	3	
4	清理工	2人	部分人工开挖	天	2	
5						
6						
7						
8						
二、材料明细						
1	检查井	630*300A		个	8	
2	检查井	630*500A		个	4	
3	井筒管	630*6000		根	3	
4	井盖	630		个	12	
5	PE波纹管	300*6000		根	7	
6	PE波纹管	500*6000		根	2	
7	橡胶垫	300/500/630		个	28	
监理单位审查意见: 情况属实，请业主方给予意见。 监理单位（章）： 总监理工程师：红松林 日期：2017.12.2 建设管理单位审批意见： 按图施工，质量符合要求 李刚 2017-12-03 建设管理单位（章）： 项目负责人：张永平 日期：2017-12-5						

附表七:



维修污水管道、雨水管道工作量及材料清单

序号	名称	规格	工作内容	单位	数量	备注
一、工作量明细						
1	管道工	2人	安装管道、检查井	天	3	
2	清理工	2人	部分人工开挖	天	3	
3						
4						
5						
6						
二、材料明细						
1	PE波纹管	300*6000		根	3	
2	PE钢皮管	300*6000		根	1	
3	热缩套	300		个	2	
4						
5						
6						
监理项目部审查意见: 情况属实，请业主方给予意见。 山西利一阳8.8MW分布式光伏项目工程 监理单位：山西利一阳新能源有限公司 日期：2017.12.2 建设管理单位审批意见: 隋以属美 按图施工，工程量按实结算 李明 2017.12.03						
建设管理单位(章): 项目负责人: [Signature] 日期: 2017-12-5						

附件：维修管道照片

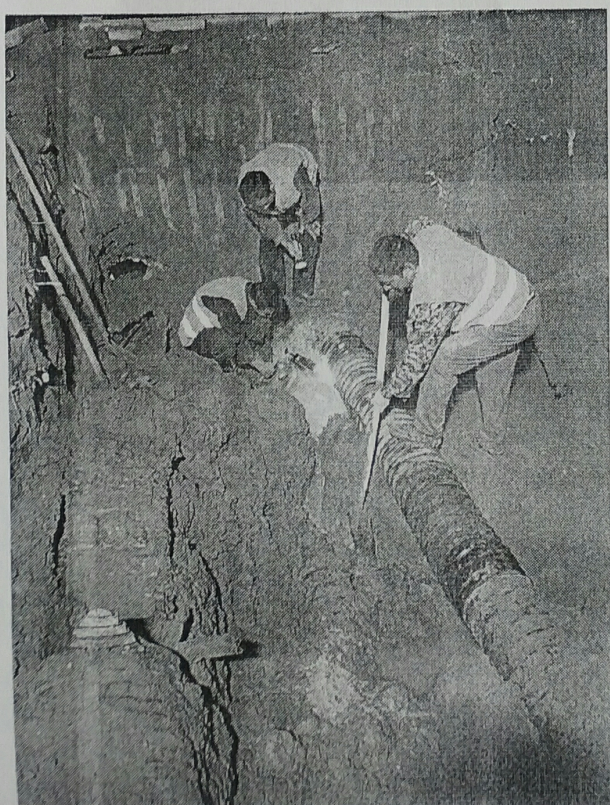

附件：整改管道照片

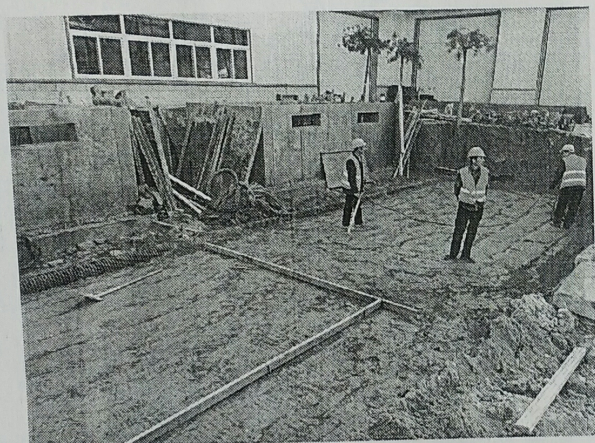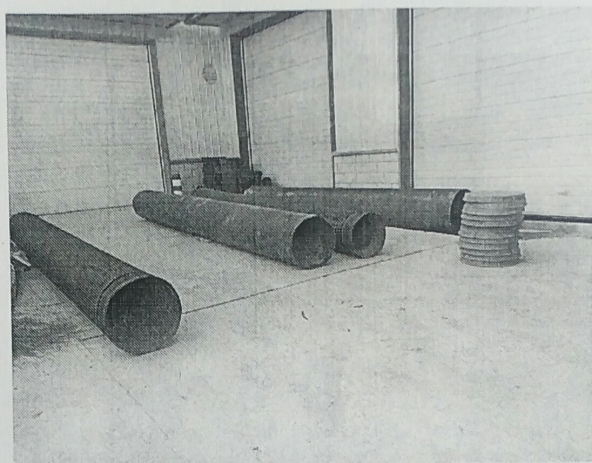

附件：整改管道照片

