

工程量签证单

编号: JLV-02

工程名称	浙江吉利汽车路桥V项目基地 12.672MW 分布式光伏发电项目土建安装工程	合同编号	CHN-JAL-20171018
施工单位	信邦建设工程有限公司	建设单位	浙江正泰新能源开发有限公司

签证内容: 施工期间增加的相关人工和费用。

- 一、每个车间屋面开展安装施工前, 应业单位 (吉利-沃尔沃, 下同) 及建设方要求, 需将车间屋面以前施工安装时遗留的杂物清理干净。焊装车间在屋面安装前, 调用人员清理屋面使用 15 个人工; 总装车间屋面使用 30 个人工清理屋面, 合计共使用 45 个人工。
- 二、焊装车间屋面在组件安装前, 业单位要求将屋面所有夹具安装位置, 屋面锈斑处清理干净并涂刷防锈漆对屋面进行保护。经业方指定, 要求使用“苏格仕纳米水性防锈漆”, 单桶包装容量 15L, 每桶到现场采购价 (含税及运费) 630 元一桶。焊装车间屋面面积约 58000 平方米, 刷漆共使用人工 160 个, 油漆用量 9 桶, 刷漆用辅材及工具费用 525 元。
- 三、2017 年 12 月 16 日复工后, 因停工期间降雨偏多, 施工未完成的 9 座箱变基础内积水较多, 我方为抽除停工期间的积水使用 6 个人工, 25KW 发电机 2 个台班, 三相潜水泵 2 台/日。
- 四、总装车间、生产准备车间西侧绿化带内及马路两侧管沟因隐蔽埋管道较多, 不适宜用机械开挖。业方及建设方要求我方用人工开挖, 共人工开挖管沟约 72 米, 使用人工 195 个。

以上由施工期间增加的相关人工及项目费用签证内容, 请监理、甲方审核答复!

施工单位 (盖章):

编制人:

负责人:

日期:

监理工程师审核意见:

情况属实

监理单位 (盖章):

总/专业监理工程师:

日期:

专业工程师审核意见:

工程量属实

项目工程师:

日期:

项目经理审核意见:

工程量属实, 具体费用请采购人员核实。

建设单位 (盖章):

项目负责人:

日期:


注明: 1、本签证单只有经监理和建设单位各审核人员均签字认可后方能生效。

签证图片:

一、屋面清理原有安装垃圾



二、屋面刷漆

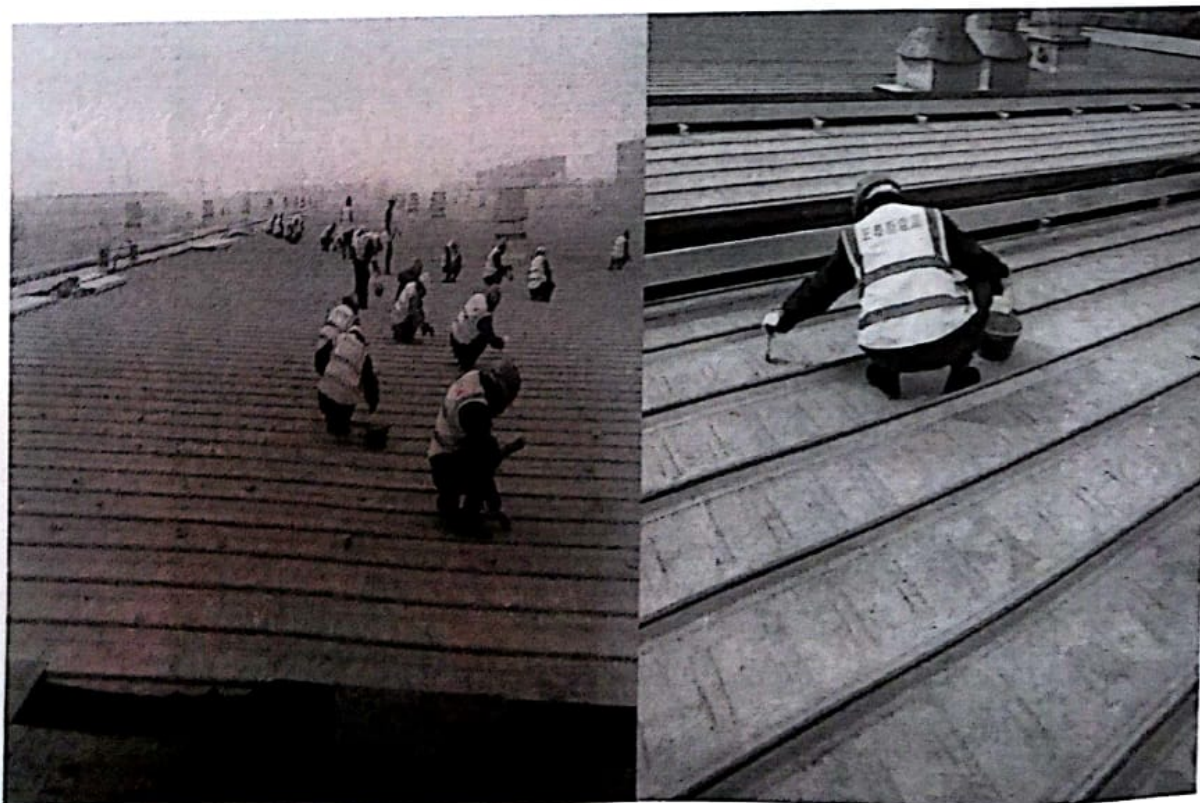

三、复土后箱变基础内抽水



四、电缆管道人工开挖

