

图纸会审专题例会会议纪要

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：HD-GFZT-01

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018 年 05 月 27 日
组织单位	衡东县兴衡光伏发电有限公司	主持人	严卫忠
会议议题	关于工程施工图纸会审等相关事宜		

业主方：

- 1、设计院出图设计方案受施工方影响较大；
- 2、设计院到目前为止还没有提供项目的相关描述，比如设计理念、设计步骤、电站配置、电站工作方式区分等；初次设计会议结束后发送我方（衡东县城建投）。
- 3、设计院出图第一版图纸，后续涉及到降低材质、降低标准必须具体说明原因，所有的图纸变更审查和复查，以不耽误施工和工期为前提；
- 4、特殊区域覆土层厚的地块，总包方要反馈给设计院，设计单位需重新优化设计。

总包方：

- 1、工程施工过程中存在设计遗漏或者设计变更等信息时，可通过联系单（盖章）形式发往现场，可作为施工依据，最终会在竣工图中完善；

监理方：

- 1、光伏区域内的箱变基础必须要定位在光伏区道路入口处及检修道两侧，便于后期运维；
- 2、支架立柱抱箍，现场与图纸不符，需设计单位给与说明或者图纸变更。
- 3、支架安装图纸内没有详细结构图。
- 4、所有支架螺栓，图纸只表明规格，却没有注明长度。
- 5、支架结构图与现场安装存在很大缺陷，总包单位未对支架厂家做详细技术交底（设计存在缺陷）。
- 6、所有电气设备图纸与厂家提供的图纸有差异，到底按哪一份为标准？
- 7、所有设备基础电缆预留孔不明确。



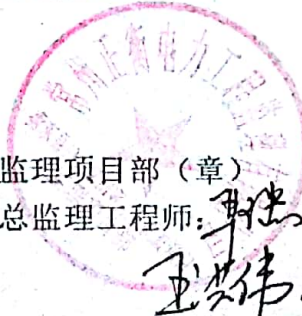

注：后附会议签到表一份。

施工图会检纪要

编号: HD-TZHS-TJ-01

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

签发: 常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018.05.27
会议主持人	严卫忠		
会检图册: 1、GFBW-01-D0201; 2、GFBW-01-J0101; 3、GFBW-01-T0101; 4、GFBW-01-T0101 5、GFBW-01-T0201 ; 6、GFBW-02-D101; 7、GFBW-02-D102; 8、GFBW-02-D103 9、GFBW-02-D104; 10、GFBW-02-J0101; 11、GFBW-02-T0101			
本次会议内容: 针对目前设计单位已提交的土建图纸进行图纸会审。 后附图纸会审会议纪要内容			
会签意见: 业主项目部 (章) 业主项目经理: 	会签意见:  监理项目部 (章) 总监理工程师: 	会签意见: 设计单位 (章) 设总: 	会签意见: 施工项目部 (章) 项目经理: 

注 会检纪要由监理项目部起草, 经业主项目经理签发后执行。

衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目 会议签到表

姓 名	工 作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
侯 宏 喜	县城建投	董 事 长	13908442445
刘 伟	县城建投	县长助理	
王 强 伟	正 衡	监 理 (工 建)	
王 强	正 衡	监 理 (电 气)	15934333394
王 强	正 衡	资 料 员	17158916889
王 强	县重点办	规划办副经理	13575281964
王 强	县城建投	工程总监	13574787829
王 强	县城建投		18692010298
王 强	力 峰	项目经理	18874735530
王 强	村 委		18873013990
王 强	村 委		18175824195
王 强	中 天 华 创		
王 强	常德正衡建投	项目负责人	13616135505
2018年 5月27日			
