


监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2017 年 12 月 第 2 期

监理项目部 (章):



总监理工程师 (代表):

[Signature]

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2017 年 12 月 08 日

1、主要工程施工进度（66KV 升压站已完成）

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
王三沟新增区	桩基基础浇筑	1408 个	1408 个	3292 个	3292 个	已完成
	支架安装	370 组	340 组	340 组	823 组	
	组件安装					
	防雷接地系统					
	箱逆变基础	5	5	5	5 个	已完成
	箱变安装					
	逆变器安装					
	汇流箱安装					
	电缆敷设	40%	40%	40%	100%	
	电缆沟	30%	60%	60%	100%	
	监控、测控系统					
	电缆桥架					
	10KV 汇集线路基坑	15	10	10	尚不明确	

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
下三家增补区	桩基成孔	150	110	610	尚不明确	
	桩基基础浇筑					
	支架安装					
	组件安装					
	防雷接地系统					
	箱逆变基础					
	箱变安装					
	逆变器安装					
	汇流箱安装					
	电缆敷设					
	电缆沟					
	监控、测控系统					

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
王三沟增补区	桩基成孔	156 个	156 个	1320 个	1320 个	已完成
	桩基基础浇筑	510 个	510 个	1320 个	1320 个	已完成
	支架安装	40 组	40 组	330 组	330 组	已完成
	组件安装	54 组	54 组	330 组	330 组	已完成
	防雷接地系统	70%	65%	95%	100%	
	箱逆变基础					
	箱变安装					
	逆变器安装					
	汇流箱安装	10 台	7 台	10 台	尚不明确	
	电缆敷设	70%	65%	95%	100%	
	电缆沟	70%	70%	100%	100%	已完成
	监控、测控系统					

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
赵家沟新增区	桩基成孔	284	284	1848	1848 个	已完成
	桩基基础浇筑	1036	1036	1848	1848 个	已完成
	支架安装	200 组	204 组	204 组	462 组	
	组件安装	100 组	120 组	120 组	462 组	
	防雷接地系统	30%	26%	26%	100%	
	箱逆变基础	2	2	2	2	已完成
	箱变安装					
	逆变器安装					
	汇流箱安装	5 台	5 台	5 台	尚不明确	
	电缆敷设	20%	20%	20%	100%	
	电缆沟	30%	30%	30%	100%	
	监控、测控系统					

2、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	地埋4mm ² 线未穿保护套管	CYHG-ZH-TZ-043	否	
2	电缆沟深度不符合设计要求	CYHG-ZH-TZ-044	否	
3	电缆沟回填不符合设计规范 要求	CYHG-ZH-TZ-045	否	

3、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
本周安全文明施工措施到位				

4、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注

5、下周主要工作事项


序号	主 要 事 项 内 容	责 任 人	备 注
1	赵家沟支架、组件安装	王登营	
2	王三沟支架、组件安装	王登营	
3	下三家增补区域钻孔施工	王登营	
4	王三沟增补区域电气施工	王登营	
5	王三沟新增场区电气施工	王登营	
6	赵家沟新增区域电气施工	王登营	

6、工程照片

电缆沟回填不符合设计规范要求



电缆沟深度不符合设计要求

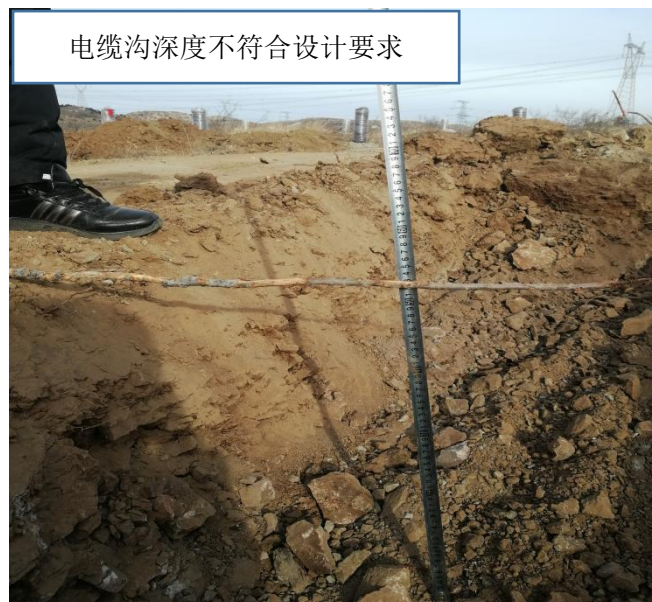

地埋 4mm² 线未穿保护套管



赵家沟支架安装

