


监 理 周 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2017 年 10 月 第 2 期

监理项目部 (章):



总监理工程师 (代表): 王望

常州正衡电力工程监理有限公司

报告日期: 2017 年 10 月 6 日

1、主要工程施工进度（66KV 升压站已完成）

分项工程	施工工序	计划完成	实际完成	累计完成	工程总量	备注
下三家光伏区	桩基基础浇筑			706 组	706 组	已完成
	支架安装	136 组	136 组	706 组	706 组	已完成
	组件安装			570 组	706 组	
	防雷接地系统	50%	50%	90%	100%	
	箱逆变基础	1	1	4	4	已完成
	箱变安装			3	4	
	逆变器安装			3	4	
	汇流箱安装	4	4	40	40	
	电缆敷设	5%	5%	10%	100%	
	电缆沟	5%	5%	10%	100%	
	监控、测控系统					
赵家沟支架、组件 144 组修补全部完成						
北台子桩基打孔 150 组，共完成 260 组；桩基浇筑 120 组						
王三沟桩基打孔 400 个						
联合新增场区道路建设完成						

2、主要工序和设备材料质量情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
1	钢筋笼主筋材料不符			已退场
2	桩基基础错位	考核单12	否	

3、安全文明施工情况

序号	问题描述	监理工作联系单/ 监理工程师通知单	是/否已整改	备注
本周安全文明施工措施到位				

4、存在问题及对策建议

序号	存在问题	对策建议	备注
1	桩基浇筑错位现象严重	桩基打孔前复测桩点，拉线打孔	

5、下周主要工作事项

序号	主要事项内容	责任人	备注
1	北台子桩基基础浇筑，加强旁站	王登营	
2	王三沟桩基基础浇筑，加强旁站	王登营	
3	联合新增场区桩基打孔，加强巡查	王登营	
4	下三家场区电缆敷设，检查隐蔽工程	王登营	

6、工程照片






王三沟桩基
打孔



下三家高压电缆
敷设

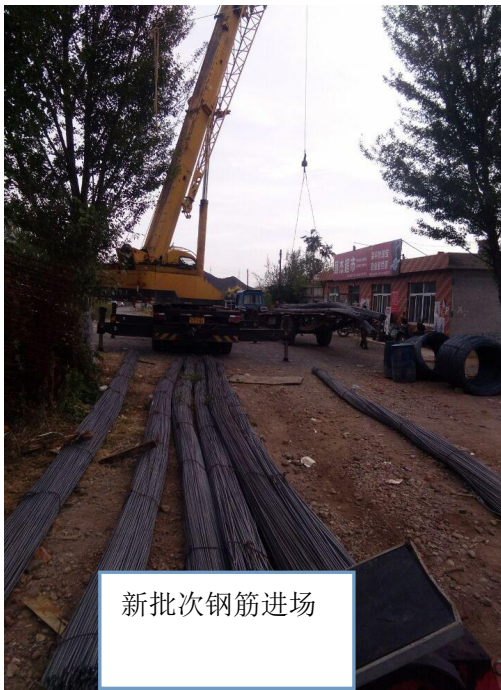

新批次钢筋进场



北台子桩基基础
错位
