

上海电力新能源光伏项目工程建设周报

2016 年 1 期



项目：北海铁山港营盘镇石庄光伏大棚发电项目	填报周期：2016 年 9 月 23 日--9 月 30 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、进场道路共计 (0.7) 公里，已完成 (0) 公里，完成总量 (0) %。场内道路共计 (0) 公里，已完成 (0) 公里，完成总量 (0) %。 2、基础条基/桩基共计 (32244) 个/根，完成 (0) 个，完成总量 (0) %； 3、支架安装完成 (0) MWp，完成总量 (0) %； 4、组件安装完成 (0) MWp，完成总量 (0) % 5、箱变、逆变器基础总计 (40) 基，开挖完成 (0) 基，砼浇筑完成 (0) 基，土方回填 (0) 基。箱变安装 (0) 台、逆变器安装 (0) 组，箱变及逆变器安装完成总量 (0) %。 6、场内集电线路共计 (0) 公里，电缆沟开挖 (0) 公里，完成总量 (0) %；电缆敷设完成 (0) 公里，完成总量 (0) %。 7、升压站土建 (1)、综合楼：综合楼基础开挖完成 0%，填充墙完成 0%； (2)、配电室：配电室基础完成 100%，室内电缆沟完成 0%，填充墙砌成 0%。 (3)、SVG 小室：完成 0%。 8、升压站一次设备安装已完成 (0) %、二次设备安装已完成 (0) %；是否开始调试（没有） 9、送出线路共计 (6.4) 公里，建设塔基总计 (18) 基，基础浇筑完成 (0) 基，完成总量 (0) %，杆塔组立完成 (0) %，架线完成总量 (0) %； 10、升压站原计划反送电时间：（2016 年 12 月 20 日），按建设进度计划时间（****年**月**日） 11、已并网发电 (0) MW，完成总量 (0) %。	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、道路工程	
2、开关站/升压站	配电楼基础开挖。
3、综合楼/附属建筑	综合楼基础未开挖。
4、场内桩基施工	打桩 8 根，做试验。
5、支架及组件安装	未开始。
6、逆变器及箱变	未开始。

7、送出工程 (含对侧)	未开始:			
8、现场调试	未开始:			
9、出图情况	图纸不全:			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货(0), 已到货数量(0)% 延误原因及催货措施
	支架	**月**日 --**年**日	**月**日 --**年**日	
	组件	**月**日 --**年**日	**月**日 --**年**日	
	逆变器	**月**日 --**年**日	**月**日 --**年**日	
	箱变	**月**日 --**年**日	**月**日 --**年**日	
	主变/开关	**月**日 --**年**日	**月**日 --**年**日	
	二次设备	**月**日 --**年**日	**月**日 --**年**日	
	电缆设备	**月**日 --**年**日	**月**日 --**年**日	
	外线设备	**月**日 --**年**日	**月**日 --**年**日	
11、人员/机械情况	本周监理人员(2)人、场内施工土建(20)人、安装(0)人、外线施工(0)人 铲车(3)台, 打桩机(1)台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、首个基础施工	2016年 10月8日	2016年 10月5日		
2、首套组件安装	2016年 10月28日			
3、线路倒送电	2016年 12月15日			


4、首个发电单元并网	2016 年 12 月 16 日			
5、全容量并网	2016 年 12 月 30 日			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	进场道路协调，场平协调。			
未解决的协调问题解决进展	正在协调			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	督促施工单位抓紧时间修路。			
2、综合楼工程	督促基础开挖，加强安全管理。			
3、升压站及开关站工程	督促基础开挖，加强安全管理。			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程				
6、外线工程	对外线铁塔基础抓紧协调			
7、其他				

填报人： 张荣建 审核人： 李维军 时间： 2016 年 09 月 30 日


工程现场照片：

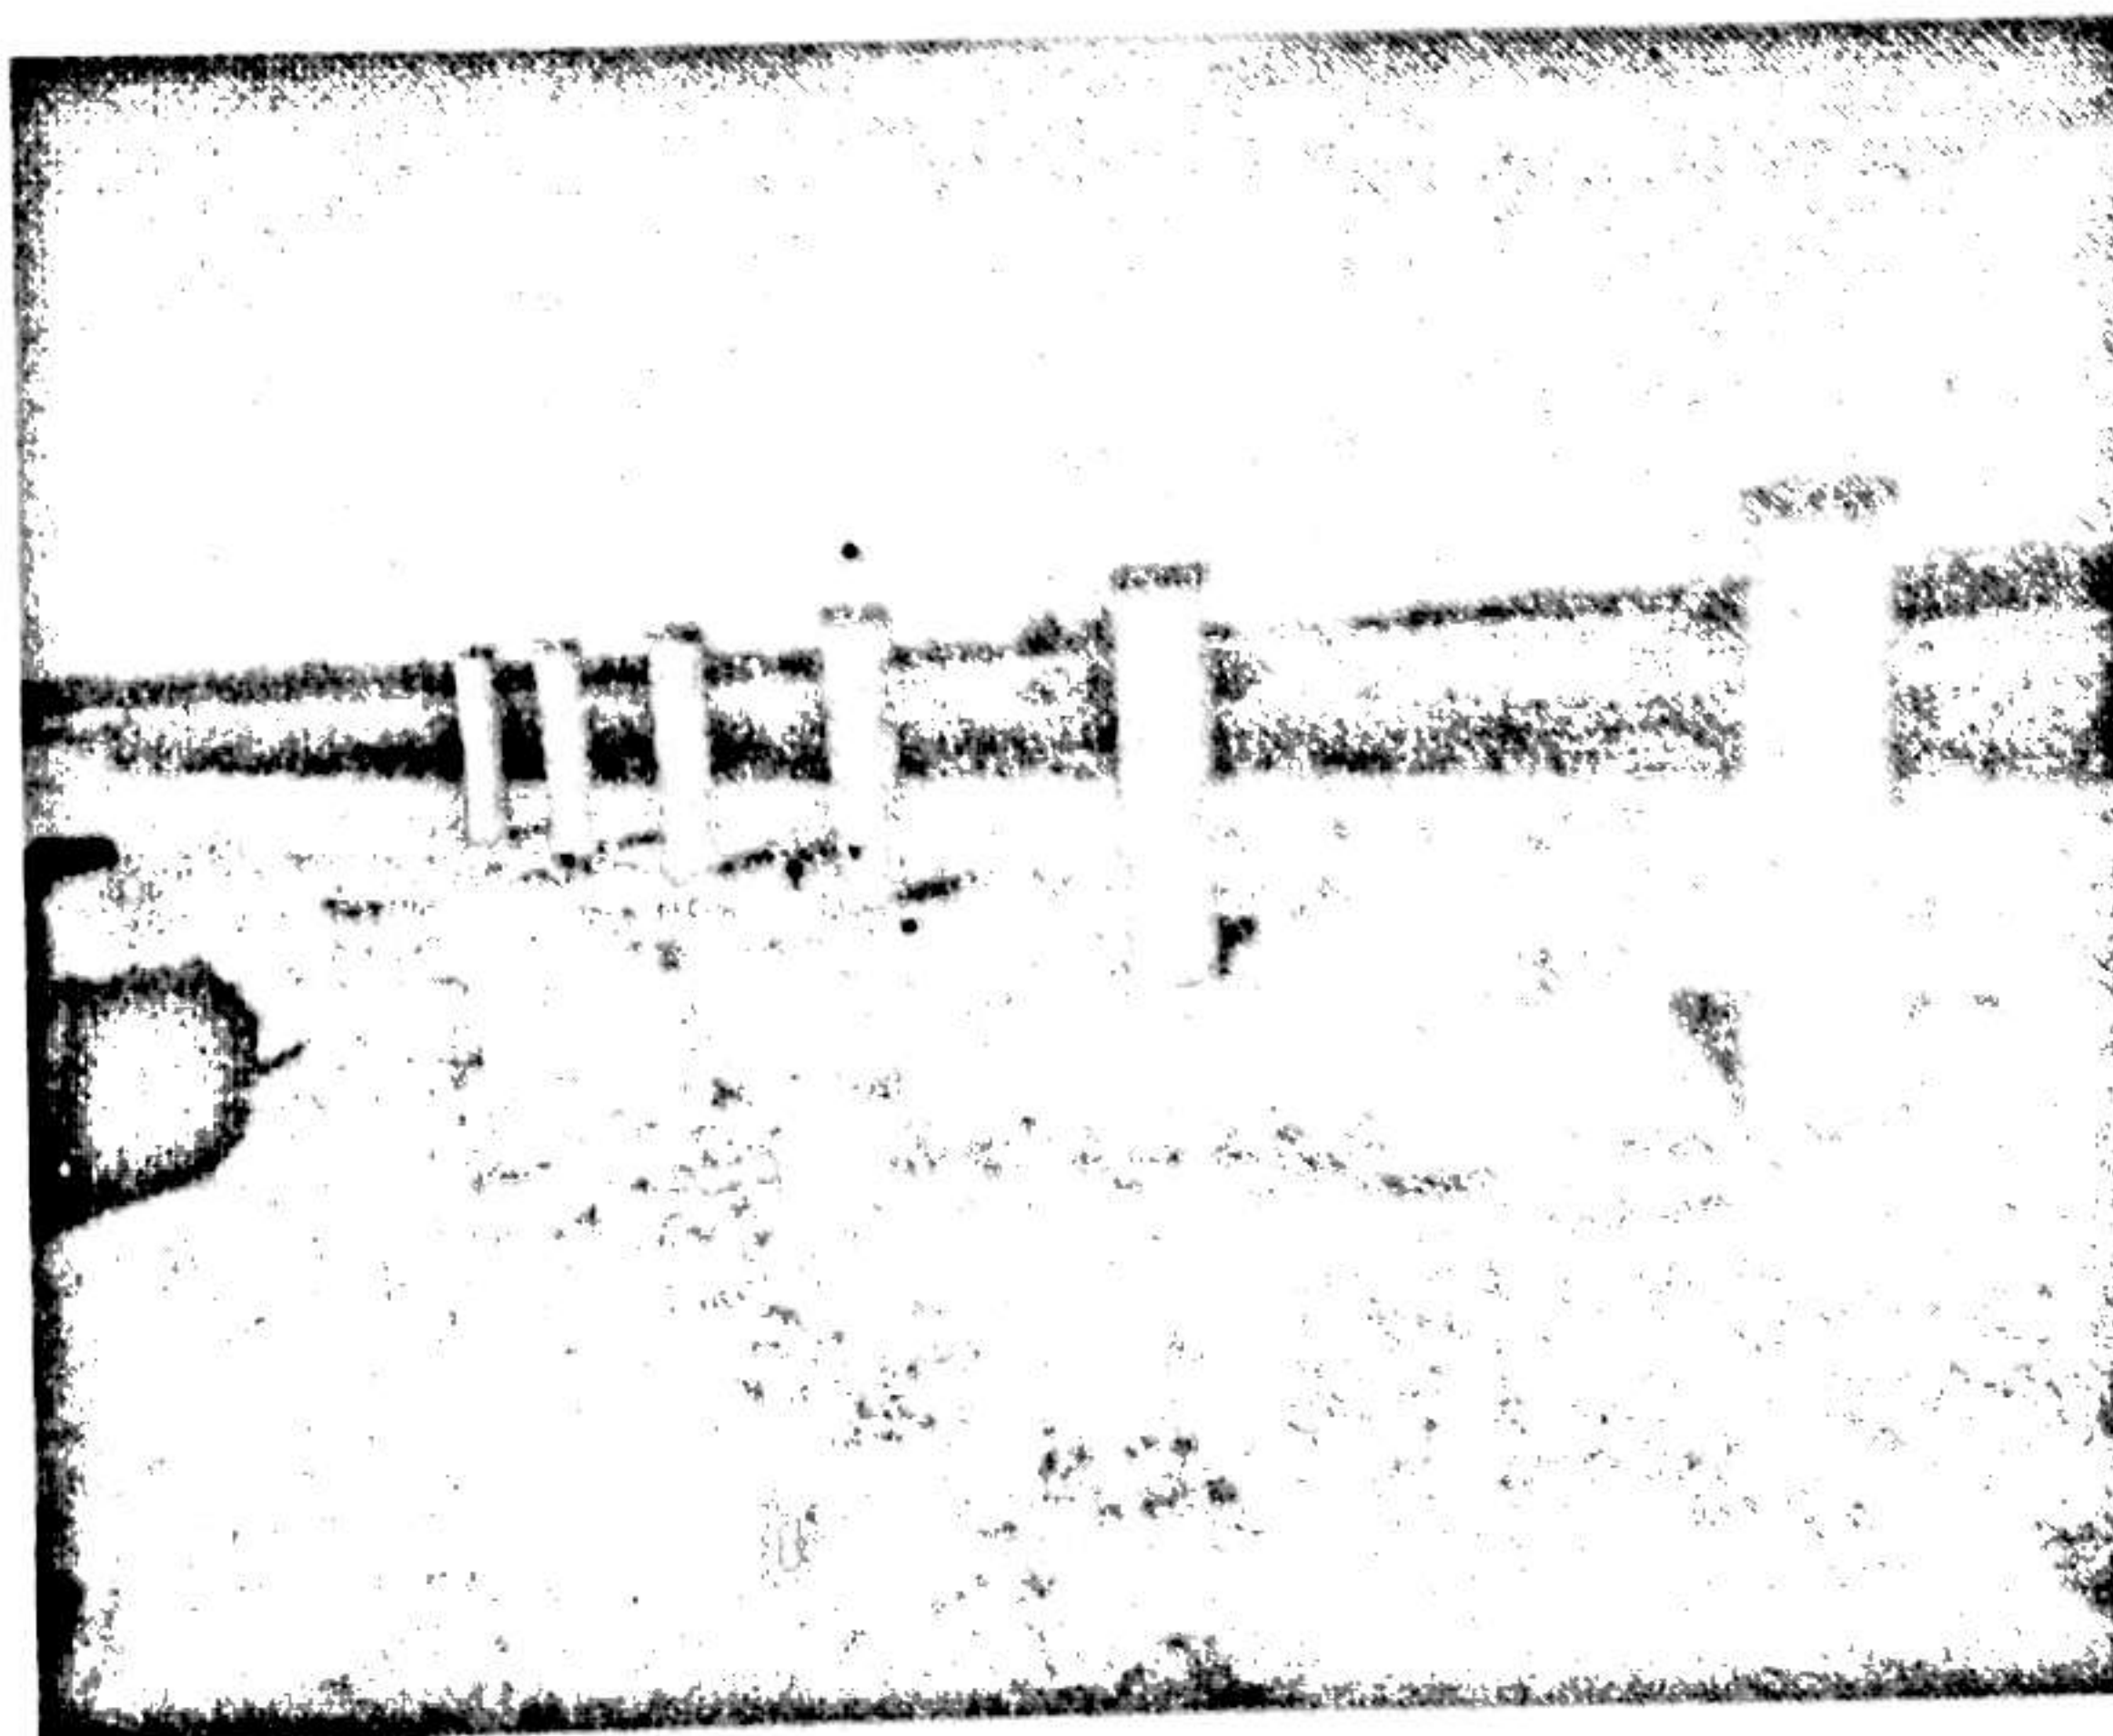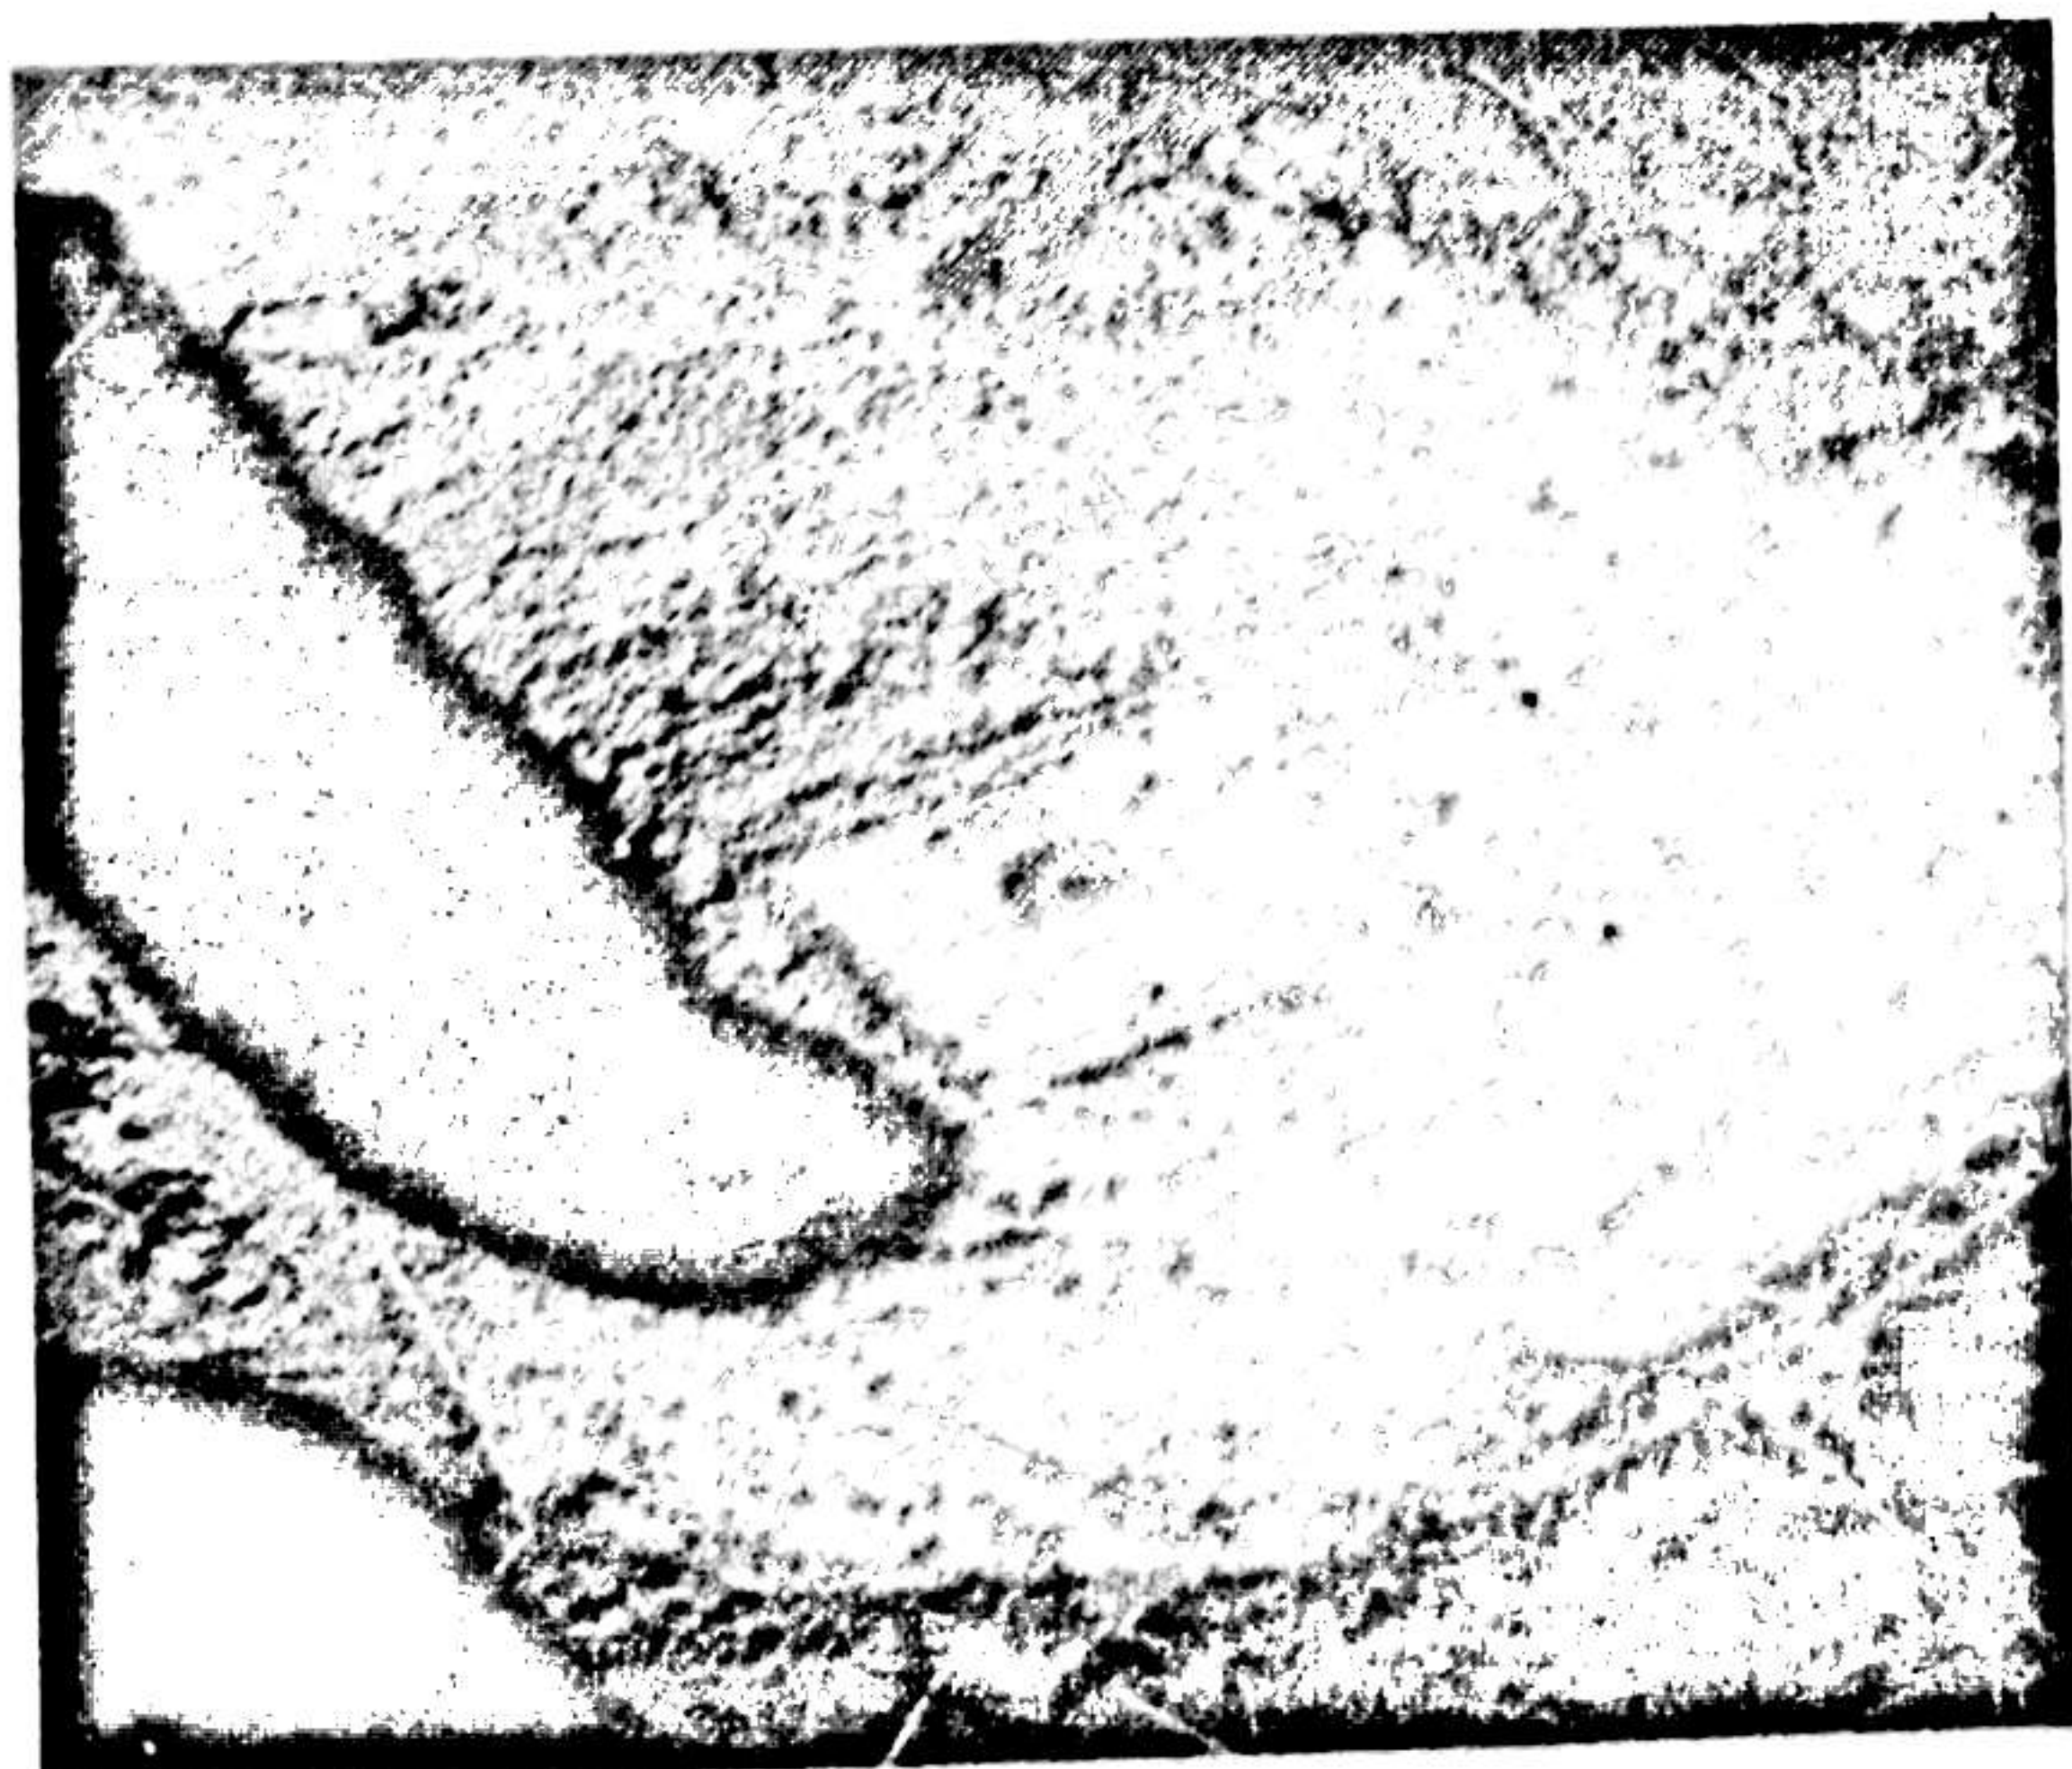

基准点

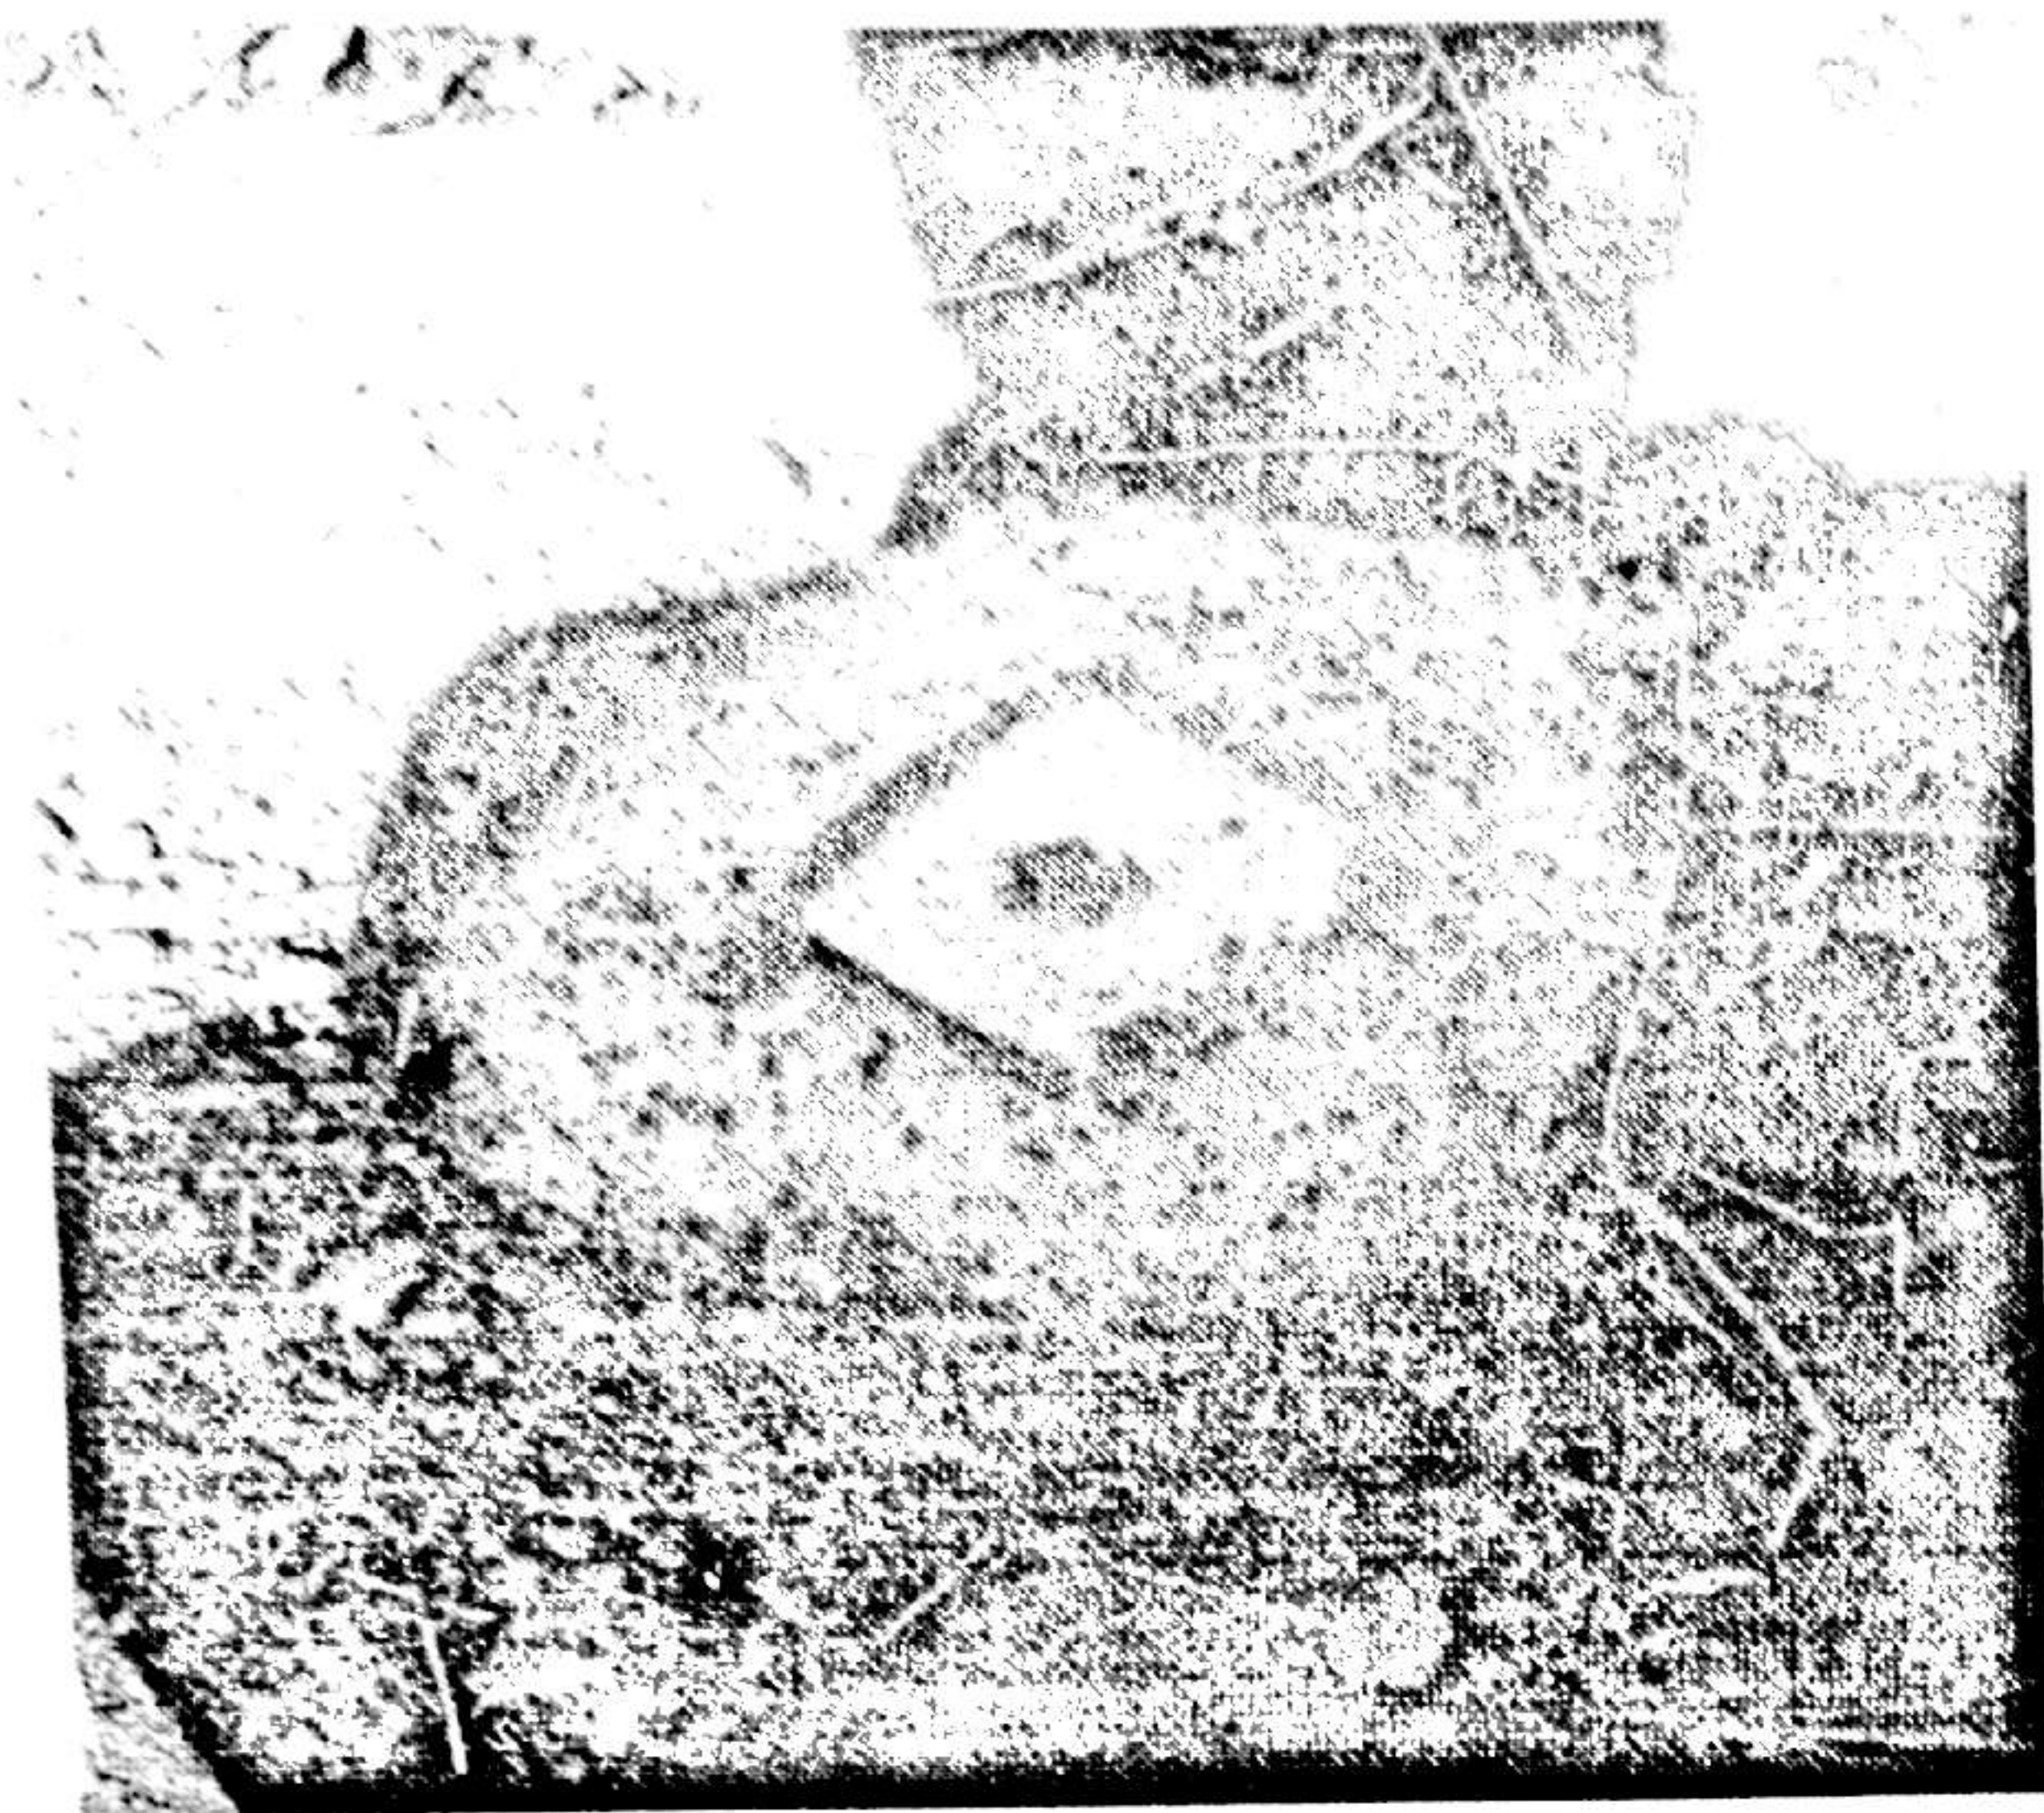


试桩

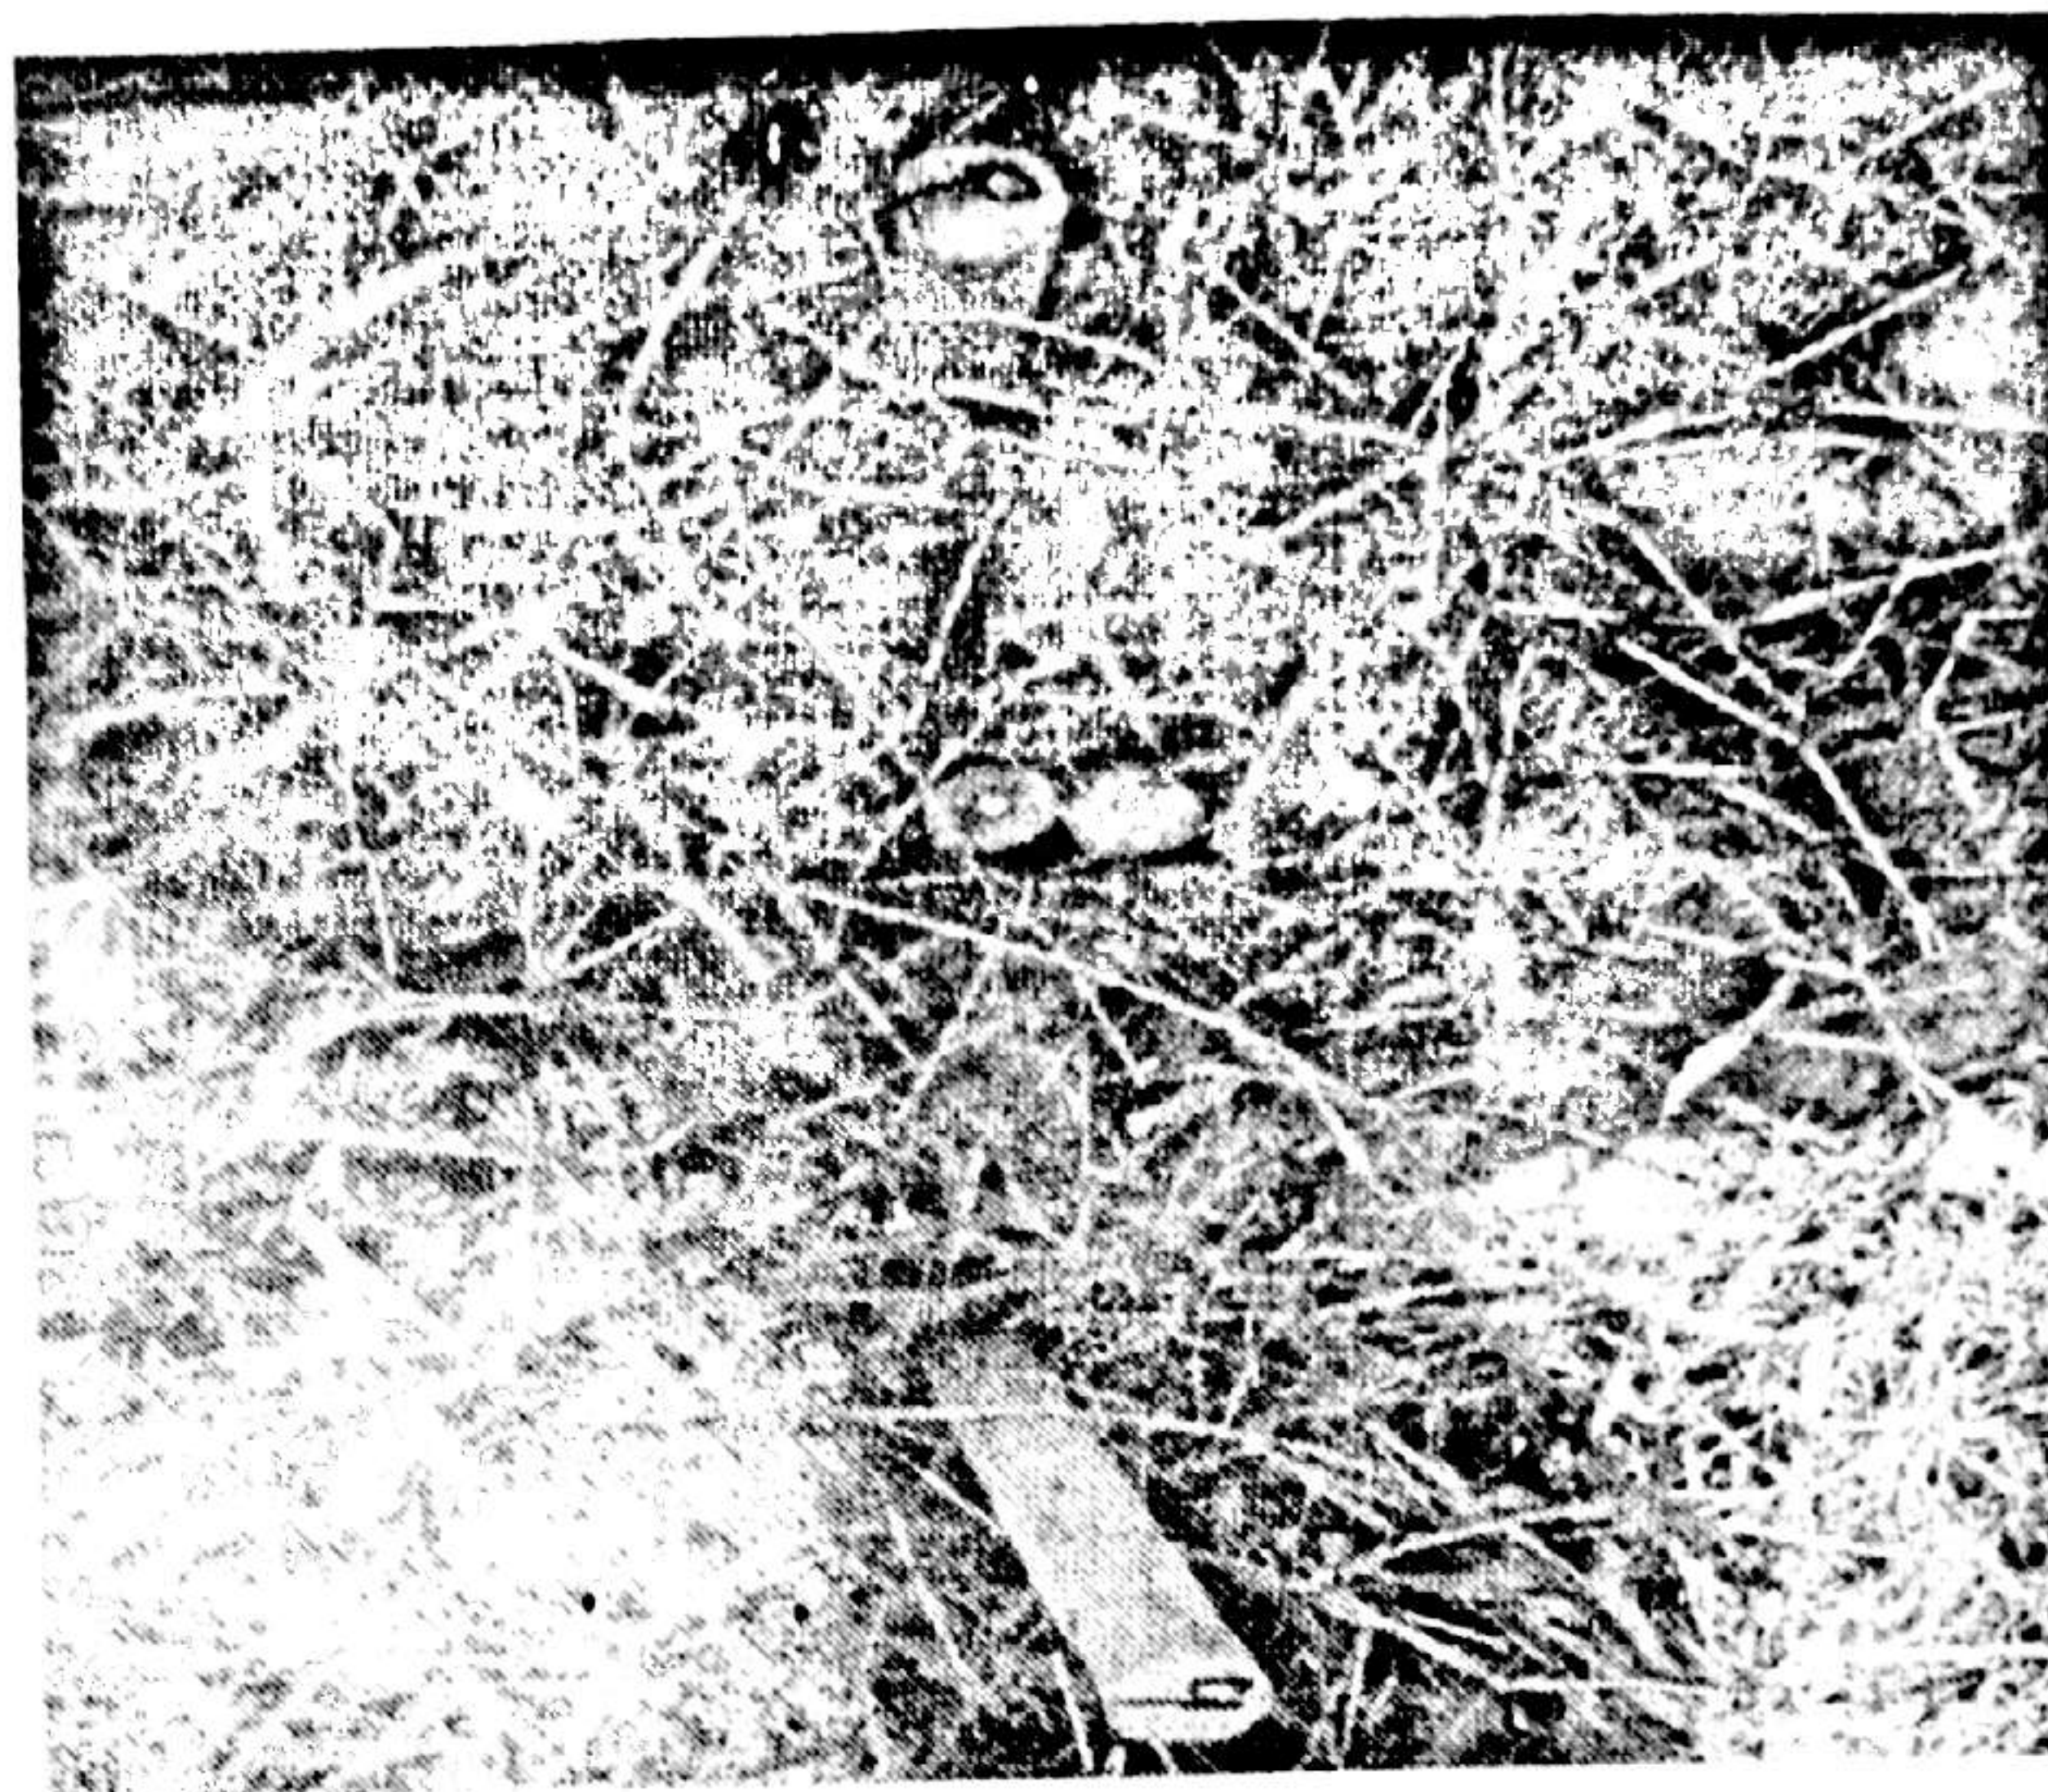

基准点 2

第 9 个基准点

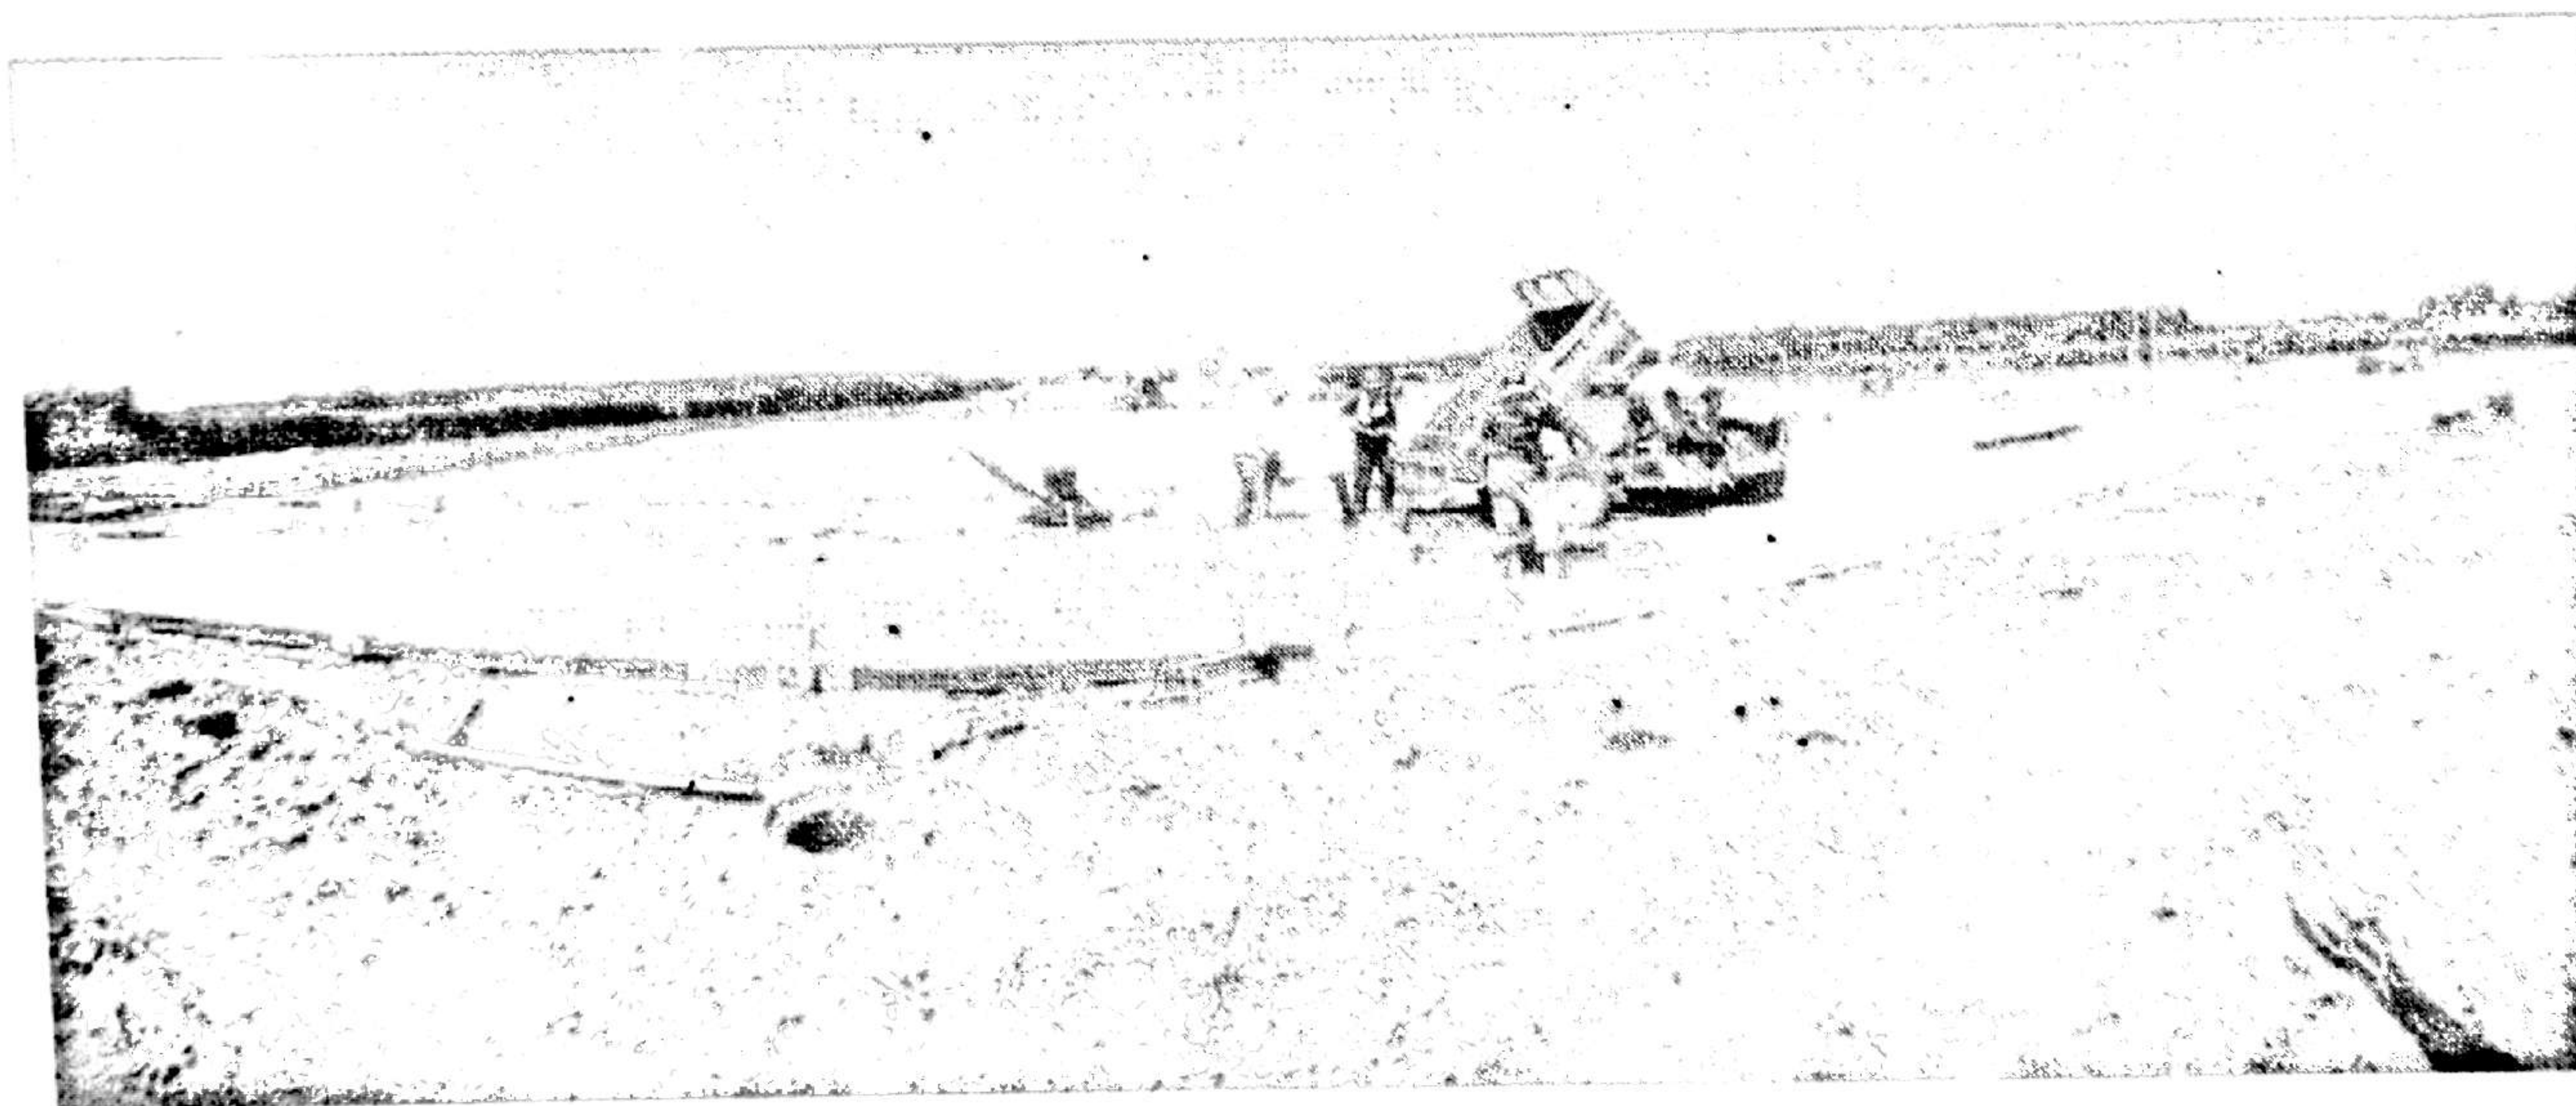

临建场平铺设混凝土

电力新能源项目
工程建设周报
