

监 理 周 报

项目名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地: 无棣县西小王镇




编号: GFDD-JZLB4—003

时间: 2017/06/23

本周 施工 概况	施工单位汇报本周进展情况: 东力土建部分: 1、本周已完成电缆沟支架安装; 2、本周已完成 SVG 基础面工程完成; 3、2017 年 6 月 25 日主变防火墙完成; 电气部分本周完成情况: 1、二次电气设备进行检测。 2、本周 35KV 电缆敷设, 接 3×95、1×185 电缆头已完成。 3、本周外线 1×630 电缆敷设已完成。 电气部分下周计划: 4、二台主变压器附件安装完成。 5、SVG 设备安装完成。 6、一次接线完成。 滨能外线部分: 1、电缆终端接头设及调试计划 6 月 25 日施工完成。
施工质量 情况	电缆沟、事故油池、GLS 基础钢筋与模板安装、SVG 基础、主变基础、配电室放电缆、外线 1×630 电缆敷设, 中间接头等施工质量符合规范与图纸设计要求。
材料进场 情况	良好
进场材料 检验、设备	良好
隐蔽验收 情况	接地敷设、基础钢筋安装、砼浇筑等验收合格, 符合要求。
发文情况	监理发监理工作联系单 2 份, 关于施工资料提交报审事宜。
收文 情况	业主下发联系单 0 份 施工联系单 0 份
安全情况	个别施工人员在高空作业时未系安全带, 已口头通知并整改完毕。

下周工作要	电气部分： 1、二台主变压器附件安装完成。 2、SVG 设备安装完成。 3、一次接线完成。 滨能外线部分： 及调试计划 6 月 25 日施工完成。 东力土建部分： 1、完成电缆沟支架安装基础； 2、完成场里回填工程完成 60%； 3、1#、2#主变压器油池完成；						
	目前施工现场人员在 40 左右。						
天气	17	18	19	20	21	22	23
	晴	晴	多云	晴	晴	晴	晴

编制人: 郭光禧 审核人: 郭光禧 编制时间: 2017 年 06 月 23 日

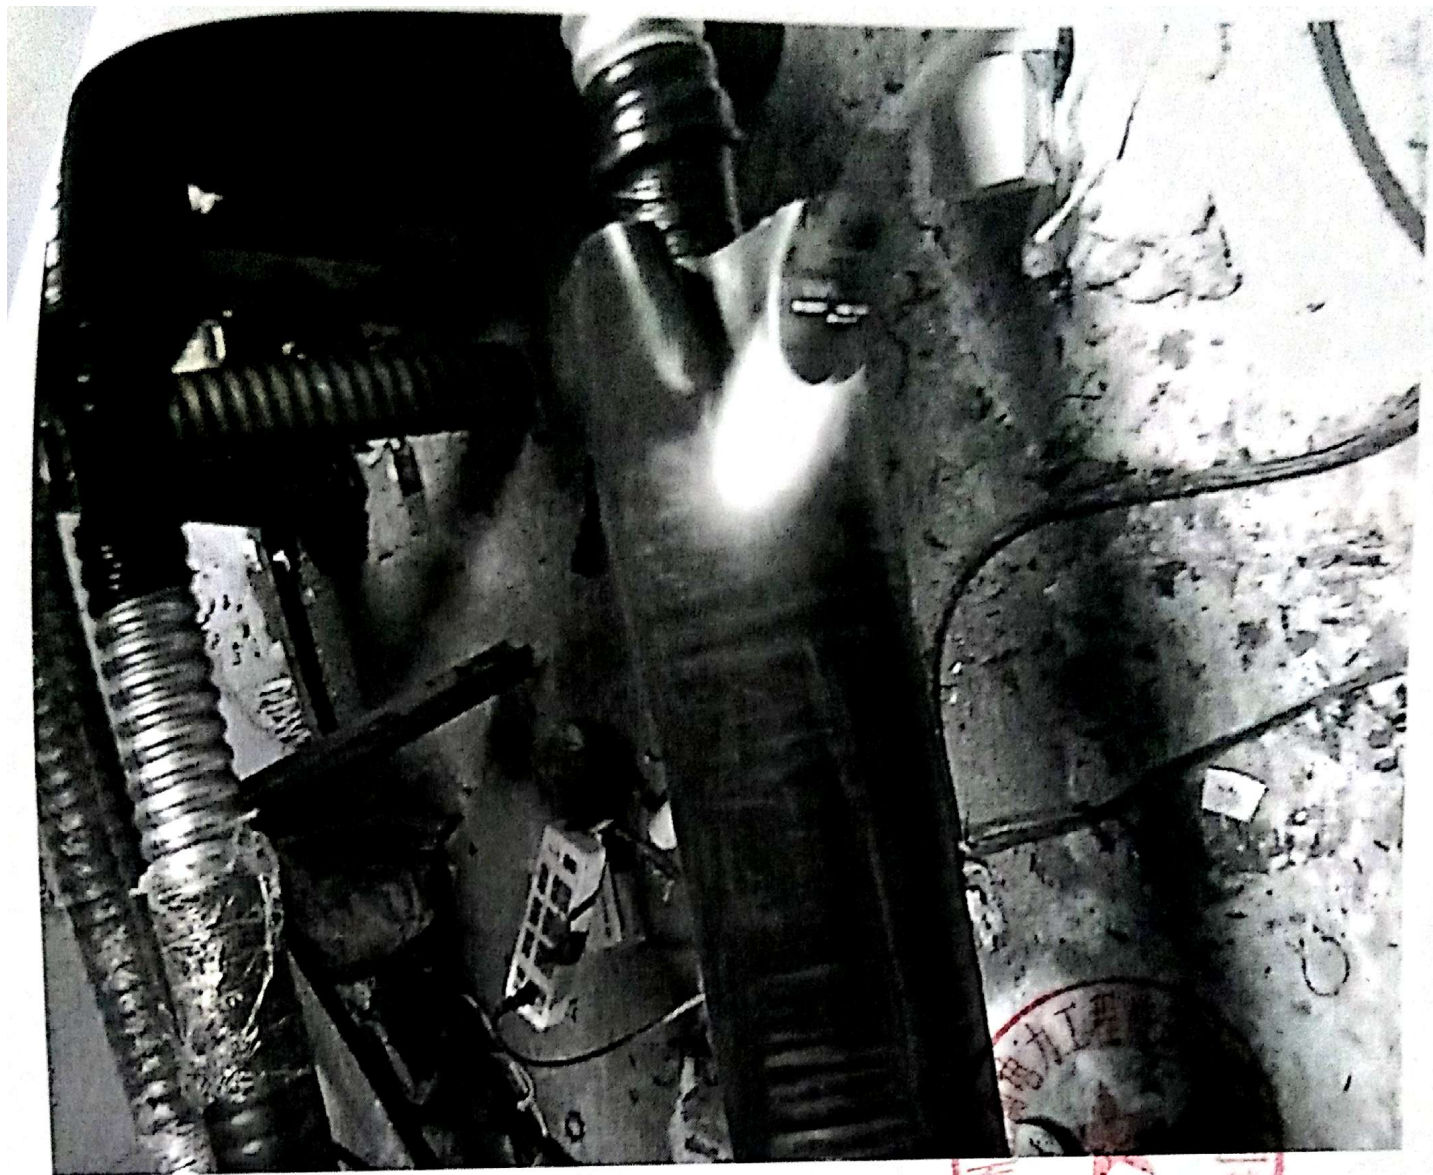

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称:无棣县西小王镇60MWP
农光互补集中式光伏发电
项目
施工部位:升压站构架吊装

2017/06/21
