

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇




<p>本周概况</p>	<p>施工单位汇报进展情况及施工计划： 升压站、外线输电线路，除了监控与照明工程外，其他工程结束 马鞍山： 1、东一区本周已完成高压电线铺设； 2、支架安装完成 325 组，剩余 15 组未安装，总计安装完成 340 组； 3、组件安装完成 260 组，剩余 40 组未安装，总计安装 300 组； 4、汇流箱安装完成 179 个，剩余 11 个未安装，共计安装完成 190 个； 5、4 平方线完成 322 组，剩余 18 组，共计完成 240 组 6、西二区组件安装完成 50 组，剩余 55 组未安装；支架剩余 8 组未安装；4 个单元直流未敷设；高压电缆还有 12 个未完成； 无锡： 1、西区 274 个大棚，支架安装完成 163 组，组件安装完成 136 组； 2、高压电缆铺设完成 6 个，总计 9 个； 3、直流电缆铺设完成 91 个，总计 137 个， 4、汇流箱安装完成 81 个，总计 137 个； 5、4 平方线完成 192 组，总计 274 组； 6、西二区 192 个大棚，完成了 109 个。组件安装 51 组。高压电缆总计 6 个，全部完成；直流电缆完成 96 个，预计明天全部完成；4 平方线完成 72 组，总计 192 组；汇流箱安装完成 26 个，总计 96 个；</p>
<p>施工质量情况</p>	<p>施工现场施工质量不容乐观，安装组件、支架、焊地梁等质量参差不齐。监理会继续跟踪，加强巡查力度，已发监理通知单要求整改。</p>
<p>材料进场情况</p>	<p>良好</p>
<p>材料进场检验</p>	<p>170 组件 3612 箱（137 车）。良好。</p>
<p>隐蔽验收情况</p>	<p>良好</p>
<p>发文情况</p>	<p>业主发文 0 份，监理发通知单 8 份。罚款通知单 2 份</p>
<p>收文情况</p>	<p>业主下发联系单 0 份，施工联系单 0 份</p>

安全情况	部分施工人员未戴安全帽，已口头通知并整改完毕。						
下周工作要	<p>马鞍山： 1、东一区 7月 15-7月 19；完成所有组件和支架安装，完成低压电气、高压电缆头的制作和完成耐压试验； 2、西二区 7月 17-7月 21；完成所有组件和支架安装，完成四个单元直流，完成高压电缆的铺设、高压电缆头的制作和完成耐压试验；</p> <p>无锡： 1、1-2-3 单元：支架计划在 15-18 日完成，组件计划在 19-21 日完成，电气部分计划在 16-20 日完成； 2、7-8-9 单元：支架计划在 14-16 日完成，组件计划在 17-18 日完成，电气部分计划在 16-18 日完成； 下周完成 40MWP 光伏全部施工项目。</p>						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 330 左右。						
天气	8	9	10	11	12	13	14
	晴转多云	阴	晴	晴	晴	晴	晴

编制人：郭光禧 审核人：郭光禧 编制时间：2017年07月14日

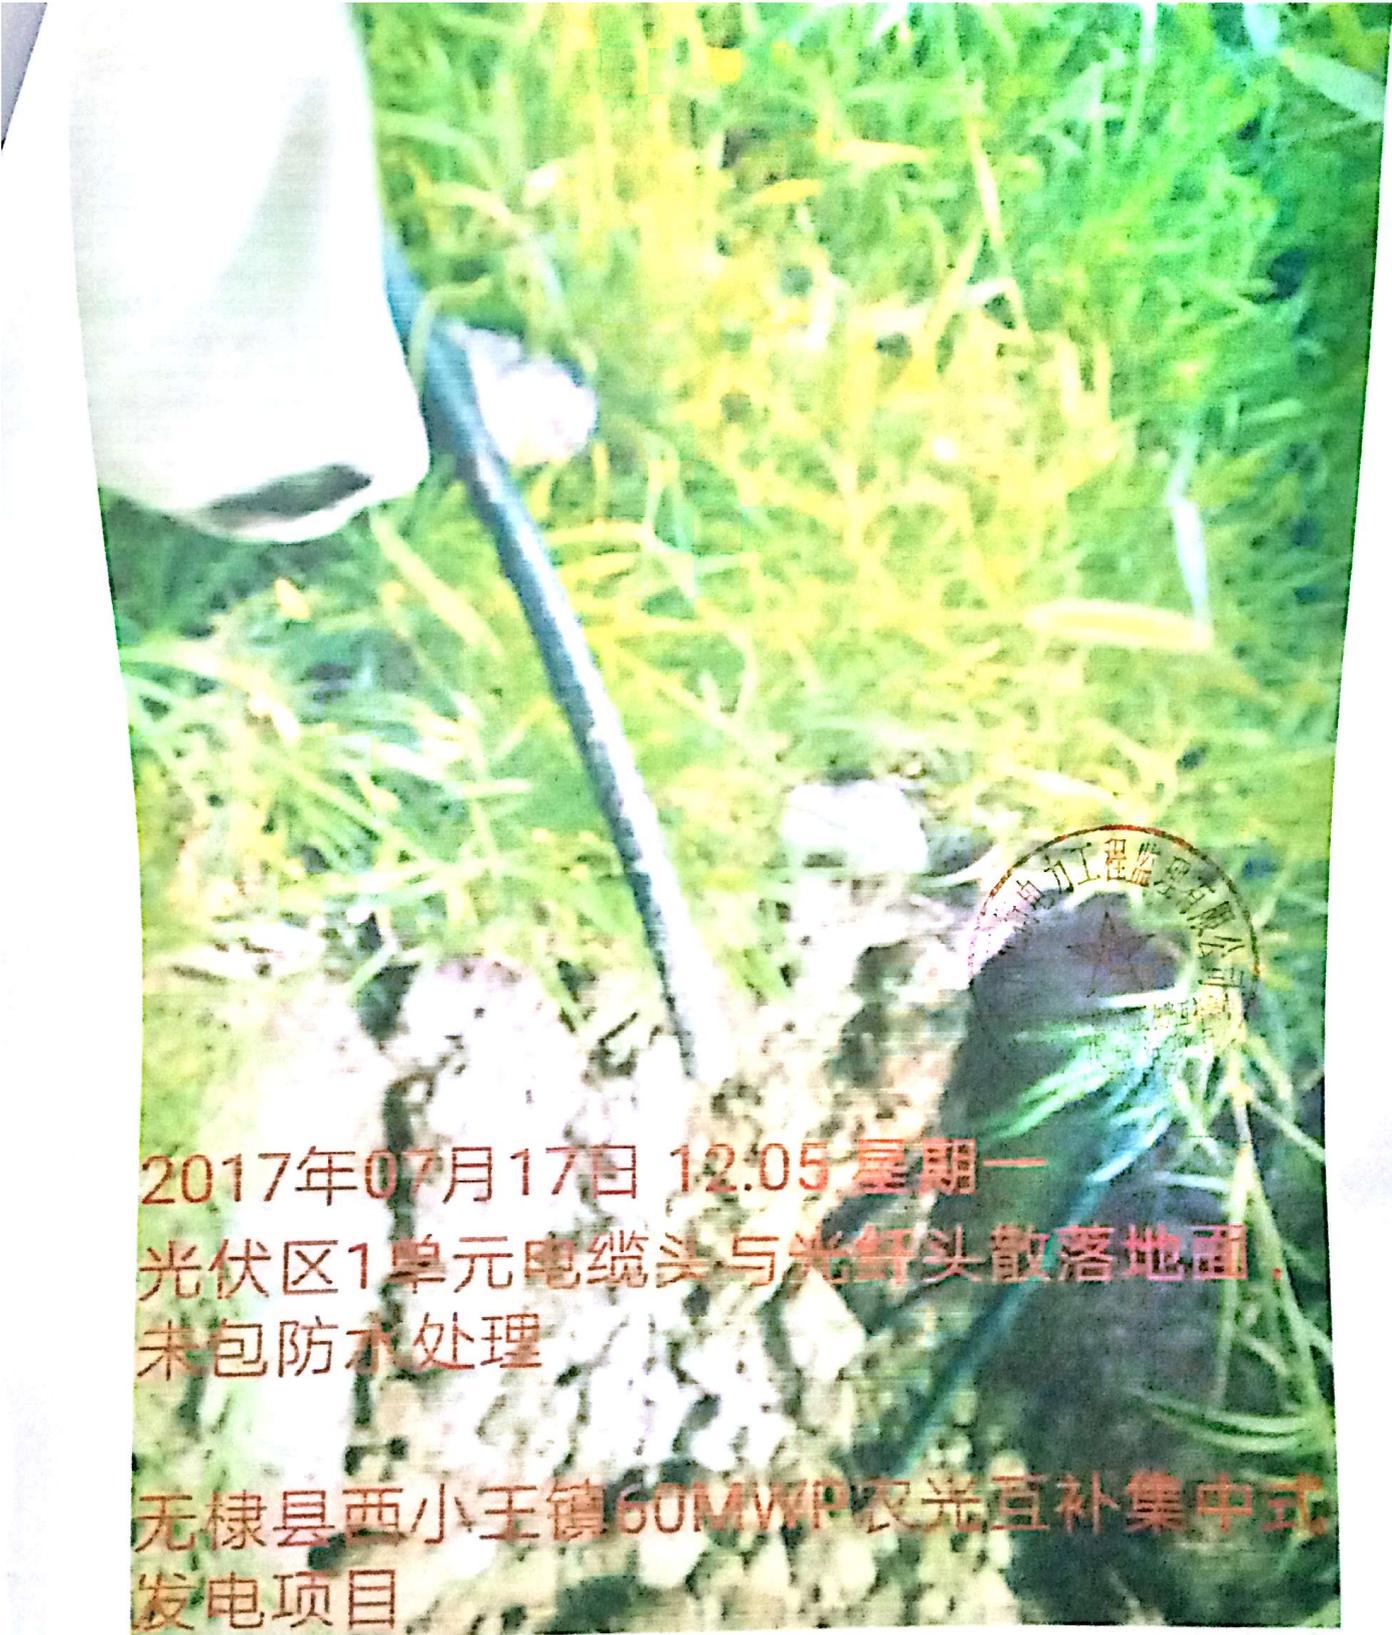

A photograph showing a close-up of a cable head and a fiber head lying on the ground in a field of green grass. The cable head is a dark, cylindrical object, and the fiber head is a smaller, lighter-colored object. A circular stamp is visible on the right side of the image, partially overlapping the fiber head. The stamp contains the text '工程监理单位' (Engineering Supervision Unit) and '无棣县西小王镇60MW农光互补集中式发电项目' (60MW Concentrated Photovoltaic and Agriculture Complementary Project in Xiwang Town, Wude County).

2017年07月17日 12:05 星期一

光伏区1单元电缆头与光纤头散落地面，
未包防水处理

无棣县西小王镇60MW农光互补集中式
发电项目
