

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站


项目地：无棣县西小王镇



本周概况 (监 理 三 人: 郭光禧 132579112 97, 庞和平 152790073 16 本 月 2 日进场, 夏 登 信 本 月 日进场, 本 月 16 日离 场。)	施工单位汇报进展情况及施工计划: 升压站、外线输工程已全部整改完成。 马鞍山: 1、东一区本周支架和组件安装、电缆敷设、电缆接头等已全部完成; 2、西二区支架安装完成 132 组, 剩余 12 组未安装, 总计安装完成 144 组; 3、组件安装完成 106 组, 剩余 38 组未安装, 总计安装 144 组; 4、电气部分: 东一区全部完成, 西二区还剩余 1 个单元电气未完成; 无锡: 1、西一区支架安装完成 244 组, 总计 274 组; 2、组件安装完成 222 组, 总计 274 组; 3、高压电缆铺设全部完成; 4、直流电缆铺设全部完成; 5、汇流箱安装完成 88 个, 总计 137 个; 6、4 平方线全部完成; 7、西二区支架安装完成 90 组, 总计 141 组 8、组件安装完成 78 组, 总计 141 组。 9、高压电缆全部完成; 直流电缆全部完成; 10、汇流箱安装完成 35 个, 总计 70 个;
施工 质量 情况	施工现场施工质量不容乐观, 安装组件、支架、焊地梁等质量参差不齐。 监理会继续跟踪, 加强巡查力度, 已发监理通知单要求整改。
材料进场 情况	良好
材料 进场 检验	组件 6000 箱。良好。
隐蔽 验收 情况	良好
发文情况	业主发文 0 份, 监理发通知单 4 份。罚款通知单 0 份
收文情况	业主下发联系单 0 份, 施工联系单 0 份

安全情况	部分施工人员未戴安全帽，已口头通知并整改完毕。						
下周工作要	马鞍山： 1、全部完成西二区的支架安装、组件安装； 2、电气部分全部完成； 无锡： 1、全部完成西一区、西二区的支架安装、组件安装； 2、电气部分全部完成； 下周完成 40MWP 光伏全部施工项目。						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 340 左右。						
天气	15	16	17	18	19	20	21
	晴	阴	雷阵雨	多云	晴	晴	多云

编制人：郭光禧 审核人：郭光禧编制时间：2017 年 07 月 21 日

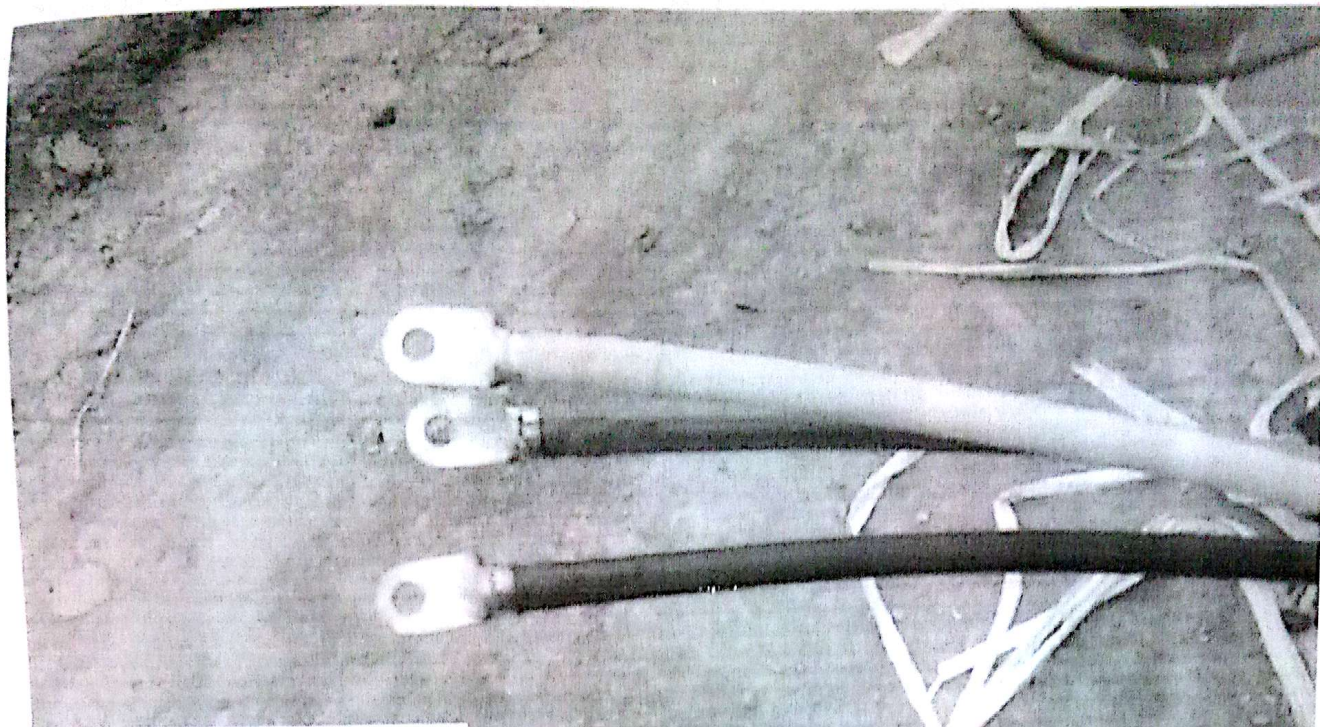

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称 无棣西小王镇60MWP农光互
补集中式光伏电站项目

施工部位 光伏区30单元3X120电缆终
端接头

拍摄日期 2017年7月21日

2017/07/21



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision Co., Ltd.

工程名称 无棣西小王镇60MWP农光互
补集中式光伏电站项目

施工部位 光伏区接高压电缆3*50

拍摄日期 2017年7月21日

7/07/21
