


监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

项目地：无棣县西小王镇



本周概况	施工单位汇报进展情况及施工计划： 升压站、外线输工程已全部整改完成，资料已完成。
(监理四人： 卢洪彦，郭光禧 1325791129 7, 庞和平 1527900731 6, 叶重庆： 1539550948 6)	光伏区： 马鞍山郁工： 1、材料的归类、整理、统一堆放； 2、组件接地； 3、大棚拉管的安装及紧固； 4、接地扁铁接地焊接，下埋土方回填； 5、消缺； 6、配合 40WMP 光伏并网发电工作； 无锡吴工： 1、接地沟开挖，接地扁铁接地焊接、下埋及土方回填； 2、接地扁铁刷防腐剂； 3、物料的归类、整理、统一堆放； 4、消缺； 5、配合 40WMP 光伏并网发电工作；
施工质量情况	施工单位消缺工作质量不容乐观，监理巡视过程中发现接地沟深度不符合图纸要求，已下通知单，要求施工单位整改并回复。监理会继续巡视检查，加强对施工质量的管理。
材料进场情况	
材料进场检验	。
隐蔽验收情况	
发文情况	业主发文 0 份，监理发通知单 1 份。罚款通知单 0 份
收文情况	业主下发联系单 0 份，施工联系单 0 份
安全情况	少数施工人员未戴安全帽、临时用电不规范等，已要求整改。




其他事宜	本月二十三号已成功并网送电;						
下周工作要	马鞍山郁工: 1、消缺; 2、物料的归类、整理、统一堆放; 3、光伏场区内材料的清场; 4、检查已送电的线路、逆变是否正常运行; 5、计划九月中旬完成消缺(光伏场区) 无锡吴工: 1、消缺; 2、物料的归类、整理、统一堆放; 3、光伏场区内材料的清场; 4、检查已送电的线路、逆变是否正常运行; 5、计划九月中旬完成消缺(光伏场区);						
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 30 左右。						
天气	19	20	21	22	23	24	25
	雷阵雨	晴	晴	晴	雷阵雨	晴	晴

编制人: 庞和平

审核人: 郭光禧

编制时间: 2017 年 08 月 25 日



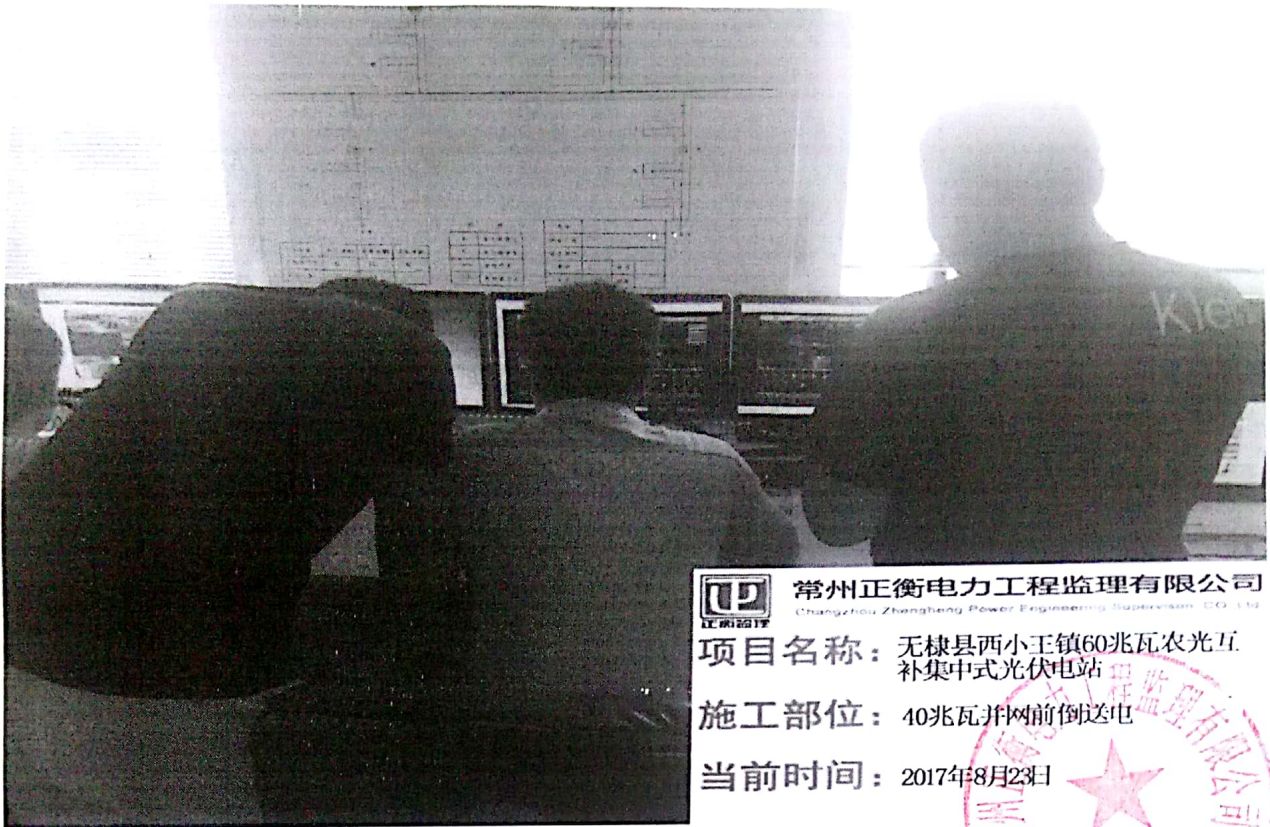


常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

项目名称: 无棣县西小王镇60兆瓦农光互
补集中式光伏电站

施工部位: 40兆瓦并网前倒送电

当前时间: 2017年8月23日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

项目名称: 无棣县西小王镇60MWP农光互
补集中式光伏电站项目
施工部位: 光伏区箱, 逆变送电

2017/08/23



由 扫描全能王 扫描创建
