

监 理 周 报

项目名称：无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站

编号：GJB-JZB1-93

项目地：无棣县西小王镇

时间：2017/09/01

本周概况 (监理四人： 卢洪彦，郭光 槟 1325791129 7，庞和平 1527900731 6，叶重庆： 1539550948 6) 施工 质量 情况	施工单位汇报进展情况及施工计划： 光伏区： 马鞍山郁工： 1、材料的归整，搬运到统一地点堆放； 2、组件接地； 3、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查 1×4 平方线，接地检查； 4、消缺：组件消缺，支架消缺，汇流箱消缺，箱变消缺，逆变消缺，光伏区线路消缺； 无锡吴工： 1、材料的归整，搬运到统一地点堆放； 1、组件接地； 2、接地沟开挖，接地扁铁接地焊接，下埋及土方回填； 3、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查 1×4 平方线，接地检查； 4、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，光伏区线路消缺； 施工单位消缺工作质量不容乐观，监理巡视过程中发现接地沟深度不符合图纸要求，已下通知单，要求施工单位整改并回复。监理会继续巡视检查，加强对施工质量的管理。
材料进场 情况	
材料 进场 检验	
隐蔽 验收 情况	
发文情况	业主发文 0 份，监理发通知单 1 份。罚款通知单 0 份
收文情况	业主下发联系单 0 份，施工联系单 0 份
安全情况	少数施工人员未戴安全帽、临时用电不规范等，已要求整改。



由 扫描全能王 扫描创建

其他事宜															
下周工作要	<p>马鞍山郁工：</p> <p>1、材料的归整，搬运到统一地点堆放； 2、围栏的修补与完善； 3、道路的自检与维修； 4、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查 1×4 平方线，接地检查； 5、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，光伏区电线路消缺； 6、围栏的修补与完善； 7、消缺计划在两天内完成；</p> <p>无锡吴工：</p> <p>1、材料的归整，搬运到统一地点堆放； 2、检查：检查组件是否紧固，检查支架螺丝是否松动，检查 1×4 平方线，接地检查； 3、消缺：组件消缺，支架消缺，箱变消缺，逆变消缺，汇流箱消缺，光伏区线路消缺； 4、接地扁铁接地焊接，下埋及土方回填计划明天完成； 5、道路的自检与维修； 6、消缺计划在一周期内完成；</p>														
现场施工人员班组情况	目前施工现场人员在 30 左右。														
天气	<table border="1"> <thead> <tr> <th>26</th><th>27</th><th>28</th><th>29</th><th>30</th><th>31</th><th>1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>晴</td><td>雷阵雨</td><td>小雨</td><td>阴</td><td>晴</td><td>晴</td><td>多云</td></tr> </tbody> </table>	26	27	28	29	30	31	1	晴	雷阵雨	小雨	阴	晴	晴	多云
26	27	28	29	30	31	1									
晴	雷阵雨	小雨	阴	晴	晴	多云									


编制人：庞和平

审核人：郭光禧

编制时间：2017 年 09 月 01 日



由 扫描全能王 扫描创建

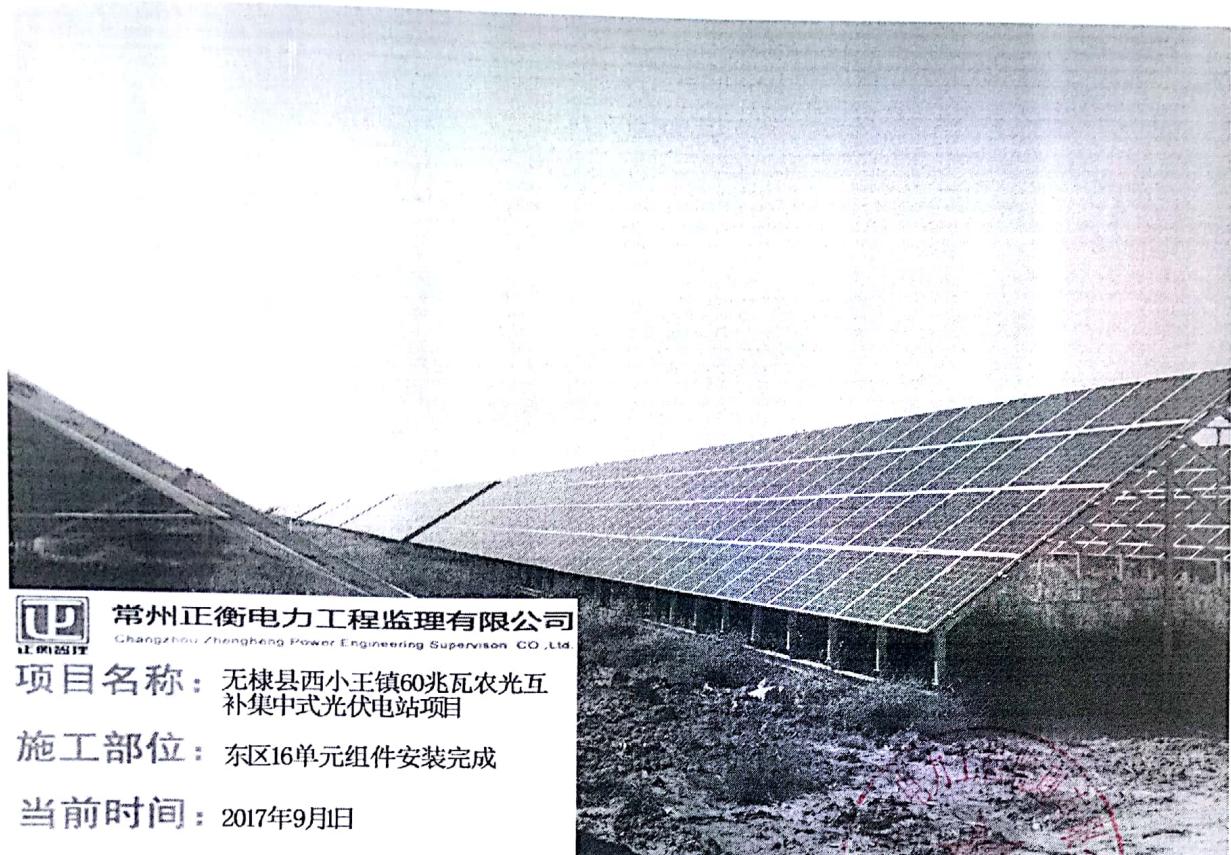

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,Ltd.

项目名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

施工部位：东区16单元组件安装完成

当前时间：2017年9月1日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,Ltd.

项目名称：无棣县西小王镇60兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

施工部位：光伏区接地沟深度检查

当前时间：2017年9月1日



由 扫描全能王 扫描创建
