

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

项目：山东月儿太阳能科技有限公司分布式发电项目一期 10MW		填报周期：2017 年 05 月 05 日—05 月 12 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、分布式光伏发电项目，组件安装全部完成。				
2、箱变 6 台全部安装就位，检测完成等待检测报告。				
3、外线：开关站 2 台布线安装全部完成，外线通讯正在调试中。				
4、维特新厂区：2 台箱变正在进行接线和安装静电接地装置。				
5、维特新厂区：安装整补房顶 1×4mm² 电缆。（后整补的电缆）				
6、维特新厂区：安装两台数据采集柜正在进行施工。				
7、五个厂区：已安装完成的组件，监理、业主现场巡检时有部分组件安装不规范，要求施工单位进行自检，对安装不合格的组件进行调整，调整完成后监理方到现场确认。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程				
2、开关站/升压站		同创、美凯华厂区各一台开关站已检测完成，共计：2 台。 2 台开关站布线和接线完成，现在进行无线通信调试中。		
3、综合楼/附属建筑				
4、场内桩基施工				
5、支架及组件安装		安装全部完成。		
6、逆变器及箱变		安装全部完成。逆变器共计：180 台；箱变 6 台。		
7、送出工程（含对侧）				
8、现场调试		外线开关站通讯调试中。		
9、出图情况		电子版图纸		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	数据采集柜		2017.5.7	6 台

11、人员/机械情况				
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	2017.4.15	2017.5.25		维特新厂区已协调完成已开工。
5、全容量并网	9MW	9MW		
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	业主已协调完成。			
未解决的协调问题解决进展	租赁费用已付，同意进场施工。			
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	道路顶管 100%完成。			
2、综合楼工程				
3、升压站及开关站工程	开关站已测试完成，等待测试检验报告。			
4、组件区域工程				
5、逆变/箱变工程	全部安装完成。			

6、外线工程	高压电缆已试压完成。
7、其他	


填报人： 王林 审核人： 王林 时间： 2017 年 05 月 11 日



箱变进行检测。



箱变高压部分进行试压。

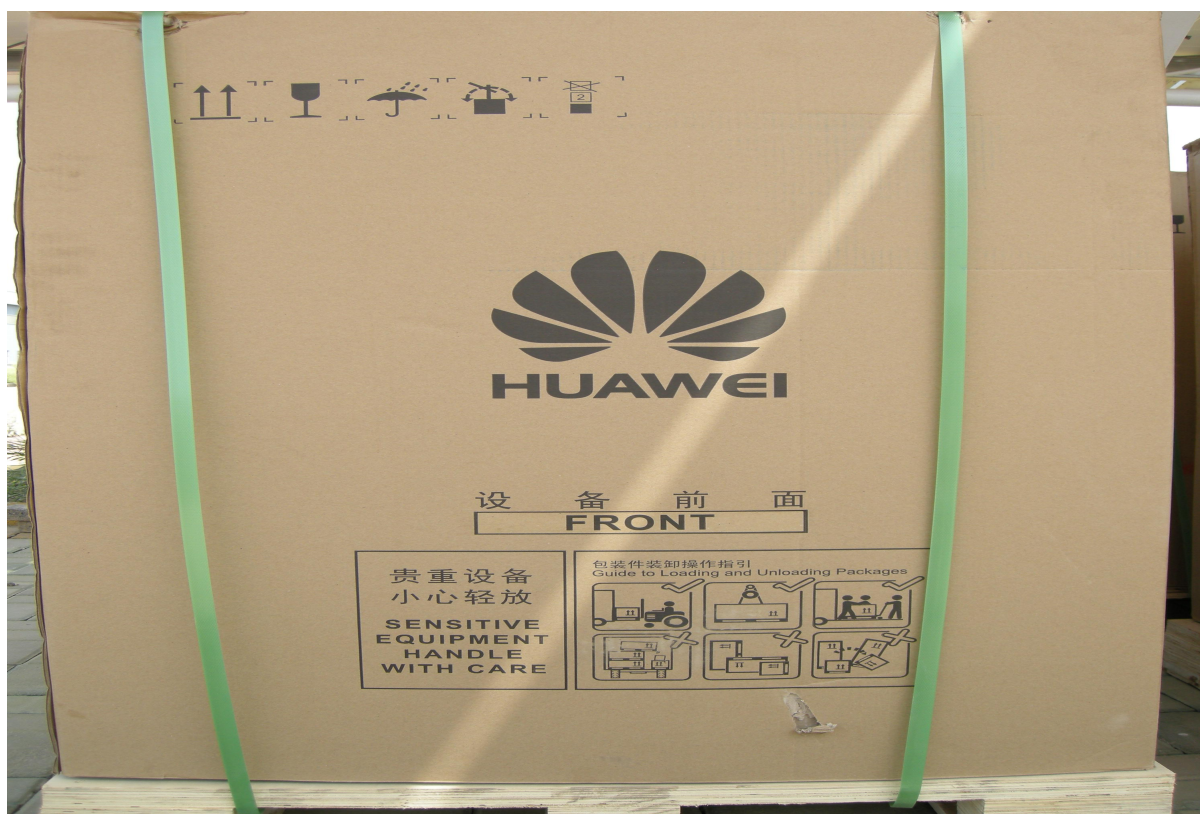

数据采集柜进场 6 台。



数据采集柜开箱检验。



数据采集柜已安装完成 5 台，鑫茂厂区一台正在进行安装过程中。共计：6 台



开关站：无线网络采集卡安装调试完成。（联通）
