

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2016 年 12 月 5 日 至 2016 年 12 月 11 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2016 年 12 月 10 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：西安亮丽电力工程设计有限责任公司

施工单位：陕西银泰建筑工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

1、综合楼模板开始拆除。

2、主变基础开挖

3、室外构架基础砼浇筑

三、下周计划完成工作量

1、主变基础砼浇筑完成。


2、室外构架基础完成。

3、综合楼模板拆除完成。

四、工程影像资料



P2 区 SVG8x50 镀锌接地扁铁未三面焊接

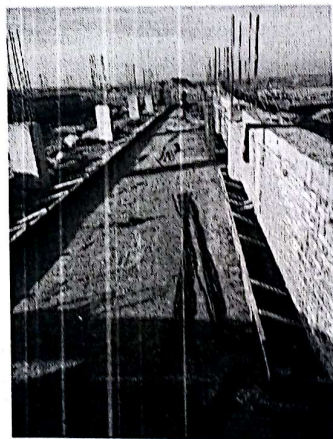

P2 区升压站电气楼
