

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2017 年 5 月 27 日 至 2017 年 6 月 02 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 6 月 02 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

设计单位：中船重工西安天虹电气有限公司

施工单位：江苏宏大建设集团有限公司


二、本周完成工作量

- 1、综合楼墙面一层顶刮白完成 50%。
- 2、车库砌体完成。
- 3、门房砌体完成。
- 4、化粪池砌体完成。
- 5、接地变油池完成。
- 6、主变油池完成 2 个，剩余 1 个。


三、下周计划完成工作量

- 1、门房、车库顶板绑扎钢筋，浇筑砼。
- 2、水泵房顶板绑扎钢筋，浇筑砼。
- 3、围墙砌筑完成。
- 4、电气楼防水施工。
- 5、综合楼卫生间防水。

四、工程影像资料

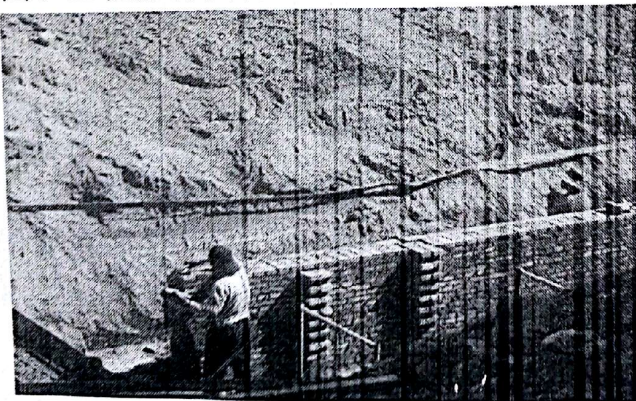

污水池墙体砌筑

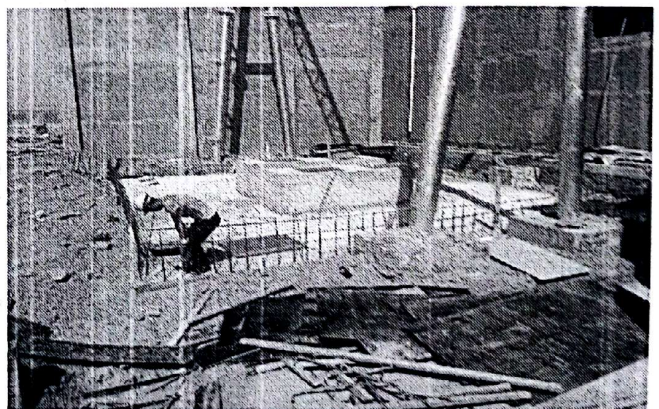

主变基础钢筋绑扎
