

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2017 年 4 月 10 日 至 2017 年 4 月 16 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王辉



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 4 月 14 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：西安亮丽电力工程设计有限责任公司

施工单位：陕西银泰建筑工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


二、本周完成工作量

- (1) 综合楼内墙抹灰完成 60%。
- (2) 电气楼砌体完成 40%。
- (3) 电缆沟构架完成。
- (4) SVG 砼基础浇筑完成，砌体完成 40%。


三、下周计划完成工作量

- (1) 综合楼内外墙抹灰全部完成。
- (2) 电气楼砌体完成。
- (3) 电缆沟、SVG 基础完成。
- (4) 接地变、事故油池完成。
- (5) SVG 砌体、抹灰完成；电缆沟完成。

四、工程影像资料

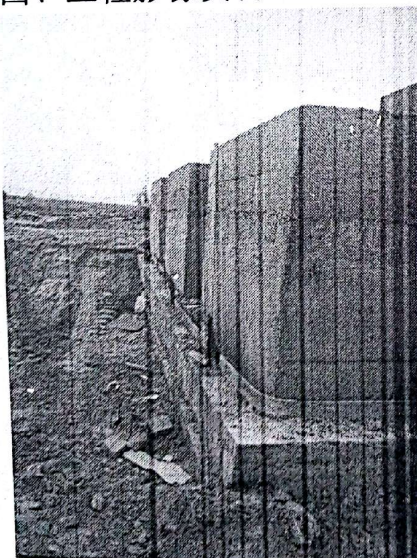

SVG 接地成闭合回路不符合要求

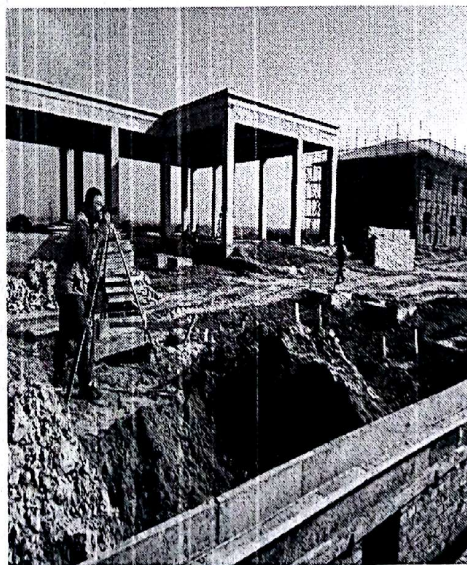

监理、业主及施工方技术员复测构架基础标高。
