

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2017 年 4 月 3 日 至 2017 年 4 月 9 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王锋



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 4 月 7 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：西安亮丽电力工程设计有限责任公司

施工单位：陕西银泰建筑工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


二、本周完成工作量

- (1) 电气楼电缆沟完成 60%。
- (2) 综合楼外墙抹灰已完成。
- (3) SVG 完成 50%。
- (4) 消防水池基础完成。
- (5) 接地变完成 80%。


三、下周计划完成工作量

- (1) SVG 基础完成。
- (2) 电气楼砌体完成 50%。
- (3) 综合楼抹灰完成。
- (4) 接地变基础完成。
- (5) 电缆沟完成 80%。
- (6) 消防水池基础完成。

四、工程影像资料

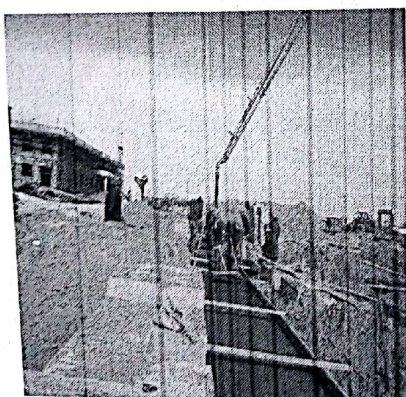

电缆沟垫层浇筑

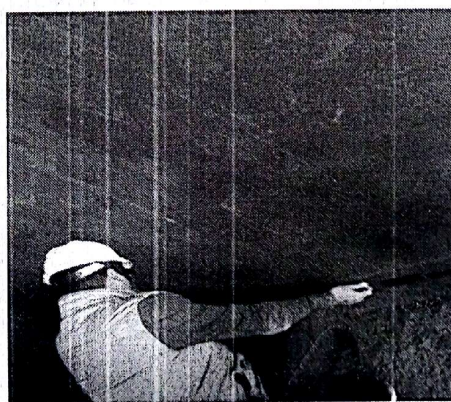

综合楼检查垂直平整度。
