

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2017 年 5 月 13 日 至 2017 年 5 月 19 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰

编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司



定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 5 月 19 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：西安亮丽电力工程设计有限责任公司

施工单位：陕西银泰建筑工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


二、本周完成工作量

- (1) 电气楼批腻子完成。
- (2) 电气楼外墙抹灰完成。
- (3) 电气楼后开挖浇筑垫层，支护，绑扎完成。
- (4) SVG 抹灰完成。
- (5) 浇筑电缆沟完成。

三、下周计划完成工作量

- (1) 综合楼一层地面垫层完成 100%
- (2) 综合楼墙面刮白完成 30%
- (3) 电气楼抹灰完成 100%
- (4) 墙面、顶板刮白完成 70%
- (5) 电缆沟完成 90%
- (6) 围墙砌体完成 40%
- (7) 门房基础砌体完成 100%
- (8) 库房基础完成 100%

四、工程影像资料

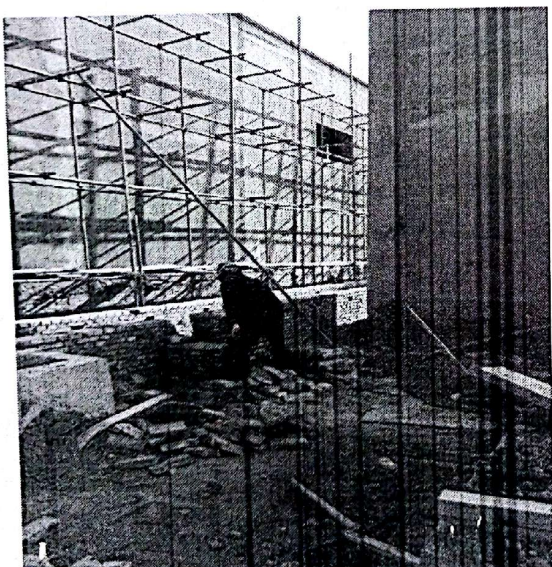

电气楼外砖砌电缆沟



综合楼底层浇筑地坪
