

定边县公布井光伏园区 P2 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2016 年 12 月 12 日 至 2016 年 12 月 18 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王锋

编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司



定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2016 年 12 月 16 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：西安亮丽电力工程设计有限责任公司

施工单位：陕西银泰建筑工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

1、室外构架基础砼浇筑。

2、电气楼开挖电缆沟。


3、主变基础砼浇筑。

三、下周计划完成工作量


1、电气楼室内电缆沟砼浇筑完成。

2、避雷针基础放线。

四、工程影像资料

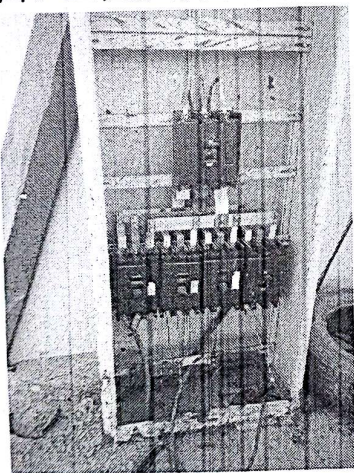

P2 区三级配电箱无保护措施，且接线杂乱

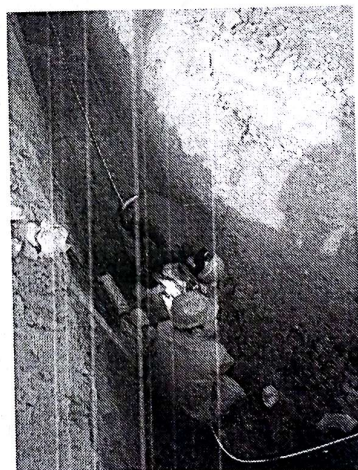

焊接 80x8 接地扁铁
