

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2016 年 11 月 21 日 至 2016 年 11 月 27 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2016 年 11 月 25 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：中船重工西安天虹电气有限公司

施工单位：江苏宏大建设集团有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

1、现场生活区、办公区的临时设施已完成

2、SVG 接地扁铁焊接。


3、综合楼墙体砌筑

三、下周计划完成工作量


1、综合楼墙体砌筑完成

2、SVG 接地扁铁焊接完成

四、工程影像资料

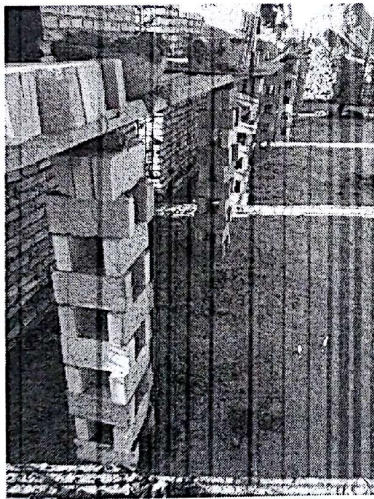

P3 区综合楼墙体施工未使用安全
脚手架

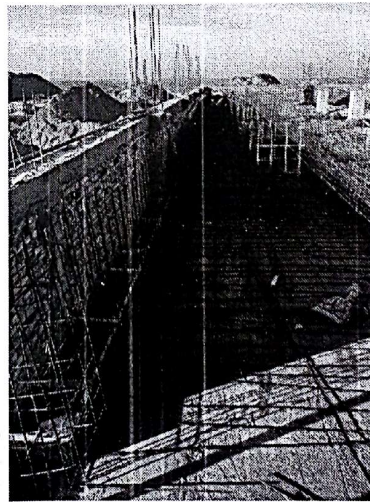

P3 区升压站 SVG 基础钢筋绑扎
