

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2017 年 3 月 13 日 至 2017 年 3 月 19 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰

编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司



定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 3 月 16 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：中船重工西安天虹电气有限公司

施工单位：江苏宏大建设集团有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


二、本周完成工作量

- (1) P3 区室外构架基础全部完成。
- (2) P3 区 SVG 基础全部完成。
- (3) P3 区全场接地完成 90%。
- (4) P3 区全场电缆沟支模完成。
- (5) P3 区门卫房、车库完成。
- (6) P3 区综合水泵房底板完成。

三、下周计划完成工作量

- (1) P3 区电气楼墙体抹灰 10 天内完成；
- (2) 全场区道路 P3 区垫层完成。
- (3) P3 区综合水泵房主体施工完成。

四、工程影像资料

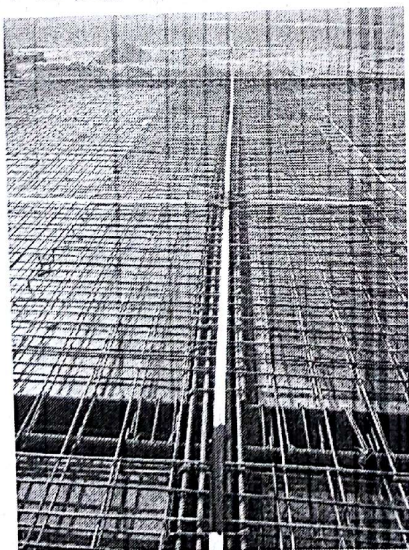

检查电气楼屋面防雷接地



P2 区升压站电气房屋面浇筑
