

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

工程 监 理 周 报

(2017 年 2 月 20 日 至 2017 年 2 月 26 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 2 月 24 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：中船重工西安天虹电气有限公司

施工单位：江苏宏大建设集团有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、本周完成工作量

(1) 35KV 及主变：①主变基础已完成；②主变防火墙已完成；③主变构架基础已完成；④35KV 电气楼 P3 墙体砌筑已完成；P4 主体结构已完成；⑤设备支柱安装已完成；

(2) 110KV：①断路器基础垫层浇筑已完成；②110KV 构架基础已完成；

③避雷器基础、电压互感器基础、电流互感器基础、隔离开关基础、设备支柱安装、端子箱、检修电源箱垫层浇筑已完成；④SVG 成套主体已完成；⑤接地变、独立避雷针基础垫层浇筑已完成；

(3) 办公区：①综合楼一般用房、主控室主体已完成；②消防泵池、消防水池底板浇筑已完成；③门卫室门头、库房主体已完成。

三、下周计划完成工作量


(1) 35KV 及主变：①主变基础、主变防火墙、主变油坑、主变构架基础、主变构架安装、母线桥基础 3 月 5 日全部完成；②主变端子箱、主变检修电源箱、中性点基础、设备支柱安装 3 月 5 日全部完成；

(2) 110KV 区：①断路器基础 3 月 5 日全部完成；②避雷器基础、电压互感器基础、电流互感器基础、隔离开关基础、设备支柱安装、端子箱、检修电源箱 3 月 5 日全部完成；③全场接地 3 月 5 日全部完；④SVG 成套、接地变、独立避雷针 3 月 5 日全部完成；

四、工程影像资料



开挖主网接地

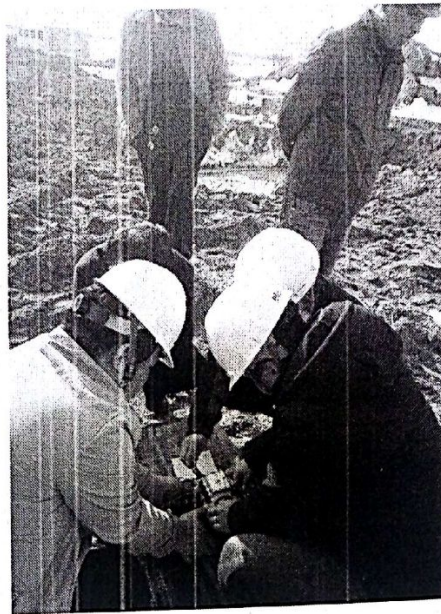

测试主网接地电阻
