

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

工 程 监 理 周 报

(2017 年 5 月 6 日 至 2017 年 5 月 12 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王祥



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 5 月 12 日

一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：中船重工西安天虹电气有限公司

施工单位：江苏宏大建设集团有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


二、本周完成工作量

- (1) 综合楼抹灰及给排水完成。
- (2) 外墙抹灰完成。
- (3) 电气房内墙抹灰完成
- (4) 室内电缆沟完成


三、下周计划完成工作量

- (1) 综合楼屋面盖瓦完成。
- (2) 综合楼屋内批腻子完成。
- (3) 综合楼底层抹灰完成。
- (4) 电气楼外墙抹灰完成。
- (5) 围墙支护绑扎完成。

四、工程影像资料

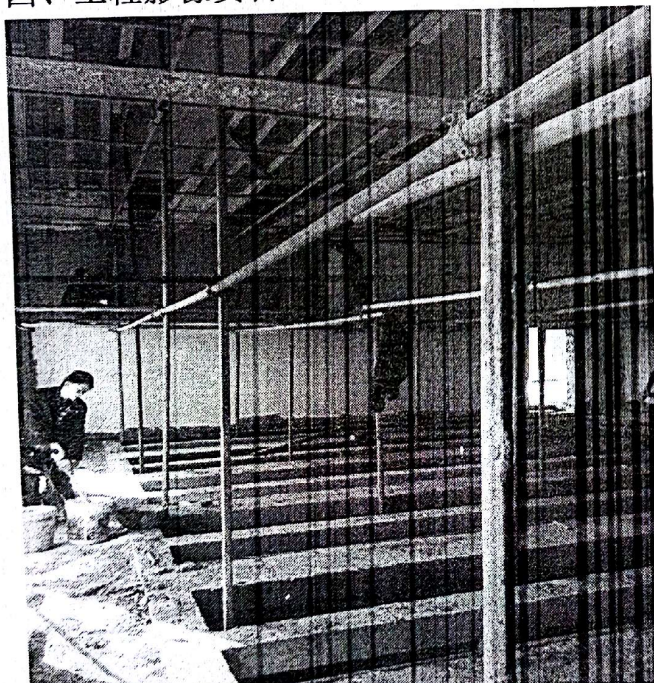

电气楼内批腻子

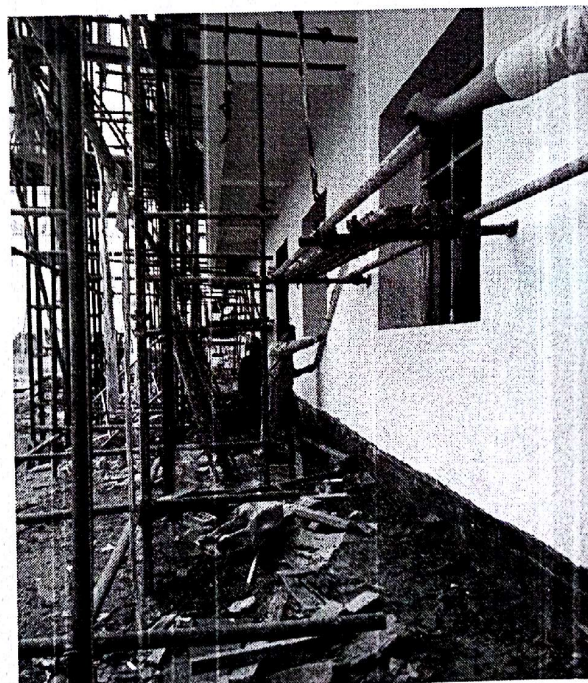

检查保温墙面
