

定边县公布井光伏园区 P3 区 110KV 升压站建设工程

# 工程 监 理 周 报

(2017 年 4 月 27 日 至 2017 年 5 月 5 日)

批 准: 梅波

审 核: 李维军

编 制: 王峰



编 制 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司

定边县公布井光伏园区 110KV 升压站建设工程监理部

2017 年 5 月 5 日

## 一、参建单位信息

建设单位：陕西正信天航电力科技有限公司

运行单位：陕西正信天航电力科技有限公司

设计单位：中船重工西安天虹电气有限公司

施工单位：江苏宏大建设集团有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司


## 二、本周完成工作量

- (1) P3 电气楼屋面保温完成，防水完成。
- (2) P3 全场区电缆沟完成。
- (3) P3 综合楼室内地坪砼浇筑、屋面铺瓦。
- (4) P3 门卫室、车库屋面防水完成。
- (5) P3 污水池、化粪池砌体完成。
- (6) P3 围墙完成 70%。

## 三、下周计划完成工作量

- (1) 综合楼抹灰及给排水完成。
- (2) 外墙抹灰完成。
- (3) 电气房内墙抹灰完成
- (4) 室内电缆沟完成。

## 四、工程影像资料

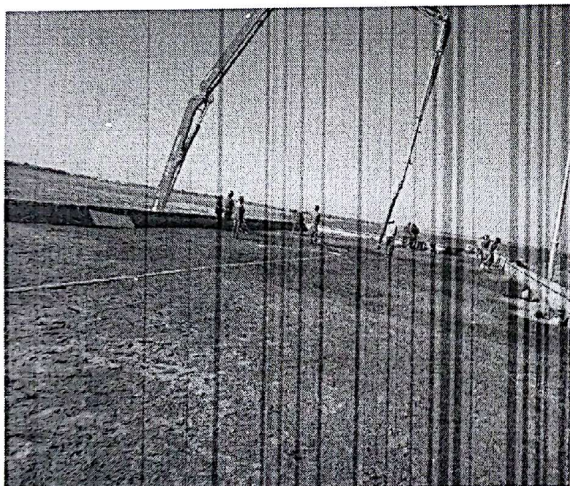

区升压站电气房屋面浇筑保温层



测试电容器容量
