

监 理 周 报

工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站
项目

2017 年 2 月 17 日第 3 期

内容提要：

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部（章）

总监理工程师：



李维军

报告日期： 2017 年 2 月 17 日



工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
中设无锡机械 设备工程 有限公司		本周作业安排		
	1	钢筋绑扎	开关站一层钢筋绑扎	开关站一层钢筋绑扎完成 60%
	2	组件安装	2#厂房组件吊装、倒运	
	3			
	4			
		下周作业安排		
	1	开关站	一层顶板钢筋绑扎，混凝土浇筑，二层屋面模板安装，钢筋绑扎	
	2	2#厂房	组件安装	
	3			
	4			

二、主要监理工作

1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施工单位尽快报审；



2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行为予以制止。

3、检查到场的施工材料，对需送检的材料进行留样，后期送至检测中心进行检测，要求施工方提供合格的材料手续。

4、督促施工单位加强现场施工进度的管控，及时上报后期工期计划及材料设备的到厂计划。

三、工程存在的问题及建议


- 1、内业资料，跟不上现场实际施工。
- 2、开关站施工面临边无安全防护，已要求施工单位增加安全围网。
- 3、2#屋面组件倒运时，施工人员对组件未轻拿轻放，易造成组件破损，施工单位需加强工人的安全教育。

四、下周监理工作安排

- 1、加强施工进度的管控，对开关站钢筋绑扎、混凝土浇筑、2#厂房组件安装进行重点检查及旁站，并做好各项旁站记录和平行检测记录，严把工程质量关，确保好工程质量。
- 2、督促施工单位严格按照施工工序施工。
- 3、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。
- 4、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况



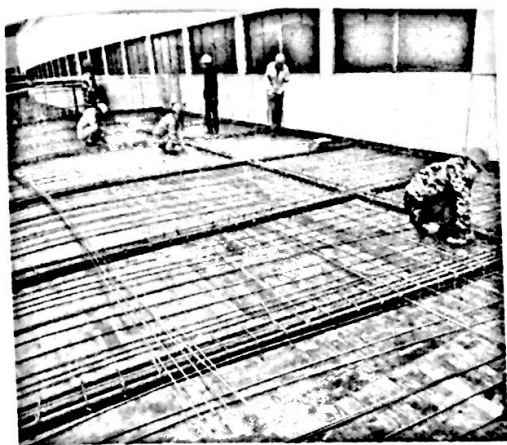

开关站一层顶板钢筋绑扎



2#厂房组件吊装



2#厂房组件倒运

常州正衡电力工程监理有限公司

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

2017 年 02 月 17 日



由 扫描全能王 扫描创建
