

监 理 周 报

工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站
项目

2017 年 2 月 24 日第 4 期

内容提要：

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部 (章)：_____

总监理工程师：_____李维军



报告日期：2017 年 2 月 24 日



工程名称: 长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
中设无锡机械 设备工程 有限公司		本周作业安排		
	1	钢筋绑扎	开关站一层钢筋绑扎	开关站一层钢筋绑扎已完成
	2	组件安装	1#、2#厂房组件安装	组件安装已完成 1.1MW
	3	混凝土浇筑	开关站一层浇筑	已浇筑完成
	4			
		下周作业安排		
	1	开关站	二层模板安装、钢筋绑扎,	
	2	1#、3#厂房	组件安装	
	3			
	4			

二、主要监理工作

1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集, 施工单位尽快报审;

2、对施工现场的作业进行安全管控, 对违反安全规范的操作行



为予以制止。

- 3、检查到场的施工材料，对需送检的材料进行留样，后期送至检测中心进行检测，要求施工方提供合格的材料手续。
- 4、督促施工单位加强现场施工进度的管控，及时上报后期工期计划及材料设备的到厂计划。

三、工程存在的问题及建议


- 1、内业资料，跟不上现场实际施工。
- 2、组件进场吊装倒运时，个别施工人员未佩戴安全帽，施工单位需加强工人的安全教育。

四、下周监理工作安排


- 1、加强施工进度的管控，要求施工单位严格按照施工进度计划进行施工；
- 2、对开关站钢筋绑扎、混凝土浇筑进行重点检查及旁站，并做好各项旁站记录和平行检验记录，严把工程质量关，确保好工程质量。
- 3、对 1#、3#厂房组件安装进行重点检查，严禁施工人员踩踏组件，防止任何施工行为对组件造成损坏。
- 4、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。
- 5、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况



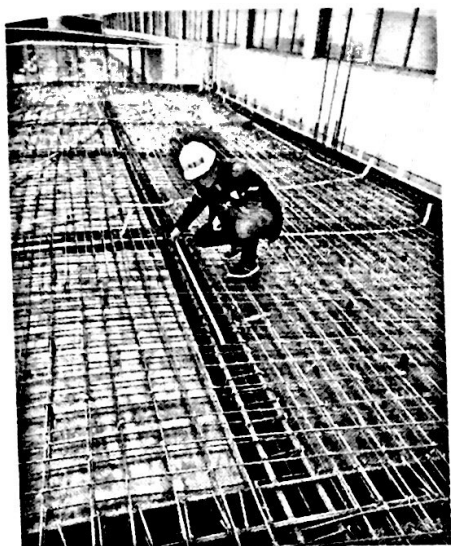

开关站一层钢筋检验收

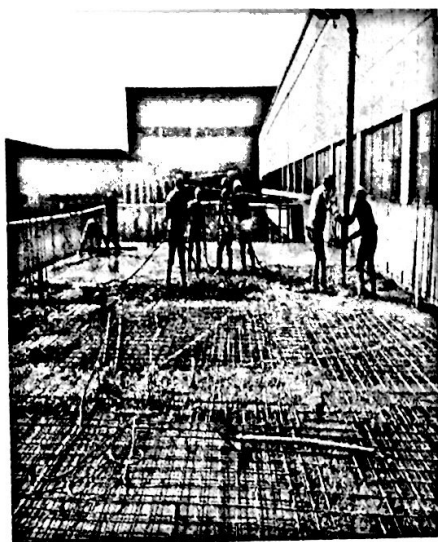

开关站一层混凝土浇




开关站二层模板安装




组件进场



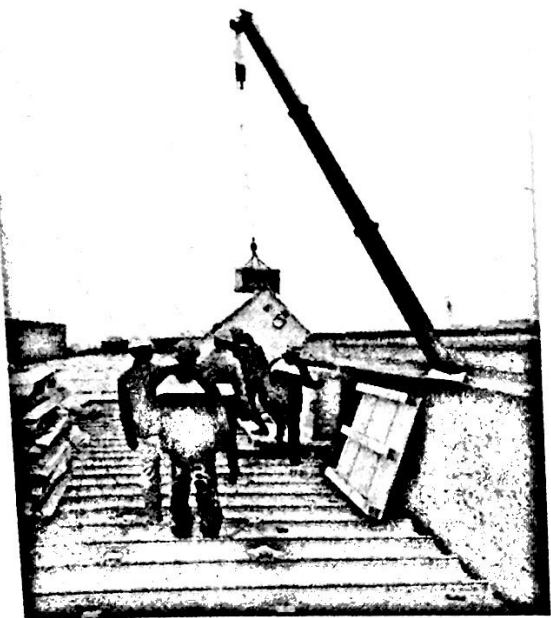

组件进场吊运

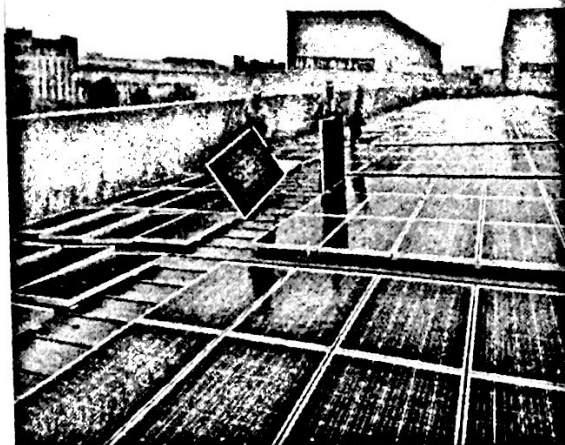

组件安装

常州正衡电力工程监理有限公司

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

2017 年 02 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建
