

监 理 周 报

工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站
项目

2017 年 3 月 24 日第 7 期

内容提要：

工程进度

主要监理工作

工程存在问题及建议

下周监理工作安排

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2017 年 3 月 24 日



工程名称：长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程进度

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目				
施工单位	序号	分项工程	施工内容	已完成工程量
中设无锡机械设 备工程有 限公司		本周作业安排		
	1	电缆敷设	1#、3#厂房电缆敷设	电缆已全部敷设完成
	2	接地焊接	2#厂房接地焊接	1#、3#厂房接地全部焊接完成；2#接地焊接完成 50%
	3	逆变器支架安装	1#、2#、3#厂房支架安装	2#、3#厂房支架安装完成；1#厂房逆变器支架安装完成 50%
	4	逆变器安装	3#厂房逆变器安装	3#厂房逆变器安装完成
	5	混凝土浇筑	开关站电缆沟混凝土浇筑	电缆沟浇筑完成
	6	墙体砌筑	开关站墙体砌筑	开关站外墙砌筑完成 50%
		下周作业安排		
	1	墙体砌筑	开关站墙体砌筑	墙体全部砌筑完成
	2	逆变器安装	1#、2#厂房	全部安装完成
	3	接地焊接	2#厂房接地焊接	2#厂房接地焊接完成
	4	汇流箱安装	1#、2#、3#厂房安装	全部安装完成
	5	电缆接线	逆变器电缆接线	1#、3#逆变器接线完成
	6	防腐施工	2#接地焊接防腐施工	2#接地防腐施工完成

二、 主要监理工作

1、监理单位要求施工单位进场所需要提交的资料进行汇集，施



工单位尽快报审；

- 2、对施工现场的作业进行安全管控，对违反安全规范的操作行为予以制止。
- 3、检查到场的施工材料，对需送检的材料进行留样，后期送至检测中心进行检测，要求施工方提供合格的材料手续。
- 4、督促施工单位加强现场施工进度的管控，及时上报后期工期计划及材料设备的到厂计划。

三、工程存在的问题及建议

- 1、内业资料，跟不上现场实际施工。
- 2、施工进度与进度计划表相比稍微滞后，施工单位需采取措施保证施工进度；
- 3、开关站施工时设计变更的图纸未及时到场；

四、下周监理工作安排

- 1、加强施工进度的管控，要求施工单位严格按照施工进度计划进行施工；
- 2、对开关站墙体砌砖进行重点检查，并做好平行检验记录，严把工程质量关，确保好工程质量。
- 3、对 2#厂房接地焊接进行重点检查，要求施工单位做好防腐施工。
- 4、严格施工质量，及时发现施工过程中的质量问题，消除各种因质量造成的安全隐患。



5、督促施工单位及时上交施工资料报验。

五、现场施工情况



开关站墙体砌筑



开关站电缆沟钢筋绑扎




开关站电缆沟浇筑



逆变器支架焊接安装




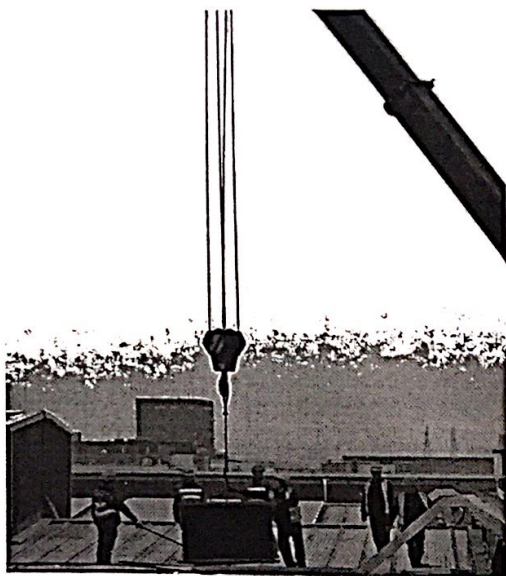

电缆敷设



逆变器安装

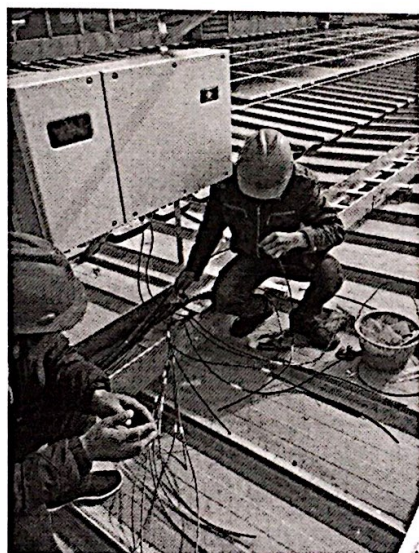

逆变器接线

常州正衡电力工程监理有限公司

长华长盛汽车零部件有限公司 3.2MW 分布式光伏电站项目

2017 年 03 月 24 日



由 扫描全能王 扫描创建
