

工程监理周报

项目名称：洛阳丰盈新能源有限公司 60兆瓦光伏电站项目

项目地：洛阳市新安县五头镇

时间：2017/1/13


本周施工概况	光伏区：寺上放点 2280 个、引孔 1450 个、压桩 720 根、生活楼二层支护模板捆扎钢筋； 北沟安装支架 25 组、安装组件 24 组； 升压站：围墙基础砌砖完成；
施工质量情况	通过各单位的通力配合，工程已有明显好转
材料进场情况	管桩；支架；组件；
材料进场检验	进场产品合格证齐全，包装完整。
隐蔽验收情况	验收合格
发文情况	下发监理周报；监理例会会议纪要
安全情况	通过整改，现场安全情况已有好转



由 扫描全能王 扫描创建

下周工作要点	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收						
	1、做好现场施工的质量把控						
	2、做好隐蔽工程的拍照留存，按要求验收						
	3、检查光伏区孔位是否符合要求						
	4、检查管桩打入情况						
	5、检查支架及组件的安装质量						
	6、检查材料是否符合图纸要求						
天气	7	8	9	10	11	12	13
	晴	晴	多云	多云	多云	多云	晴

编制人：厉生雷 审核人：刘士发 编制时间：2017年1月13日

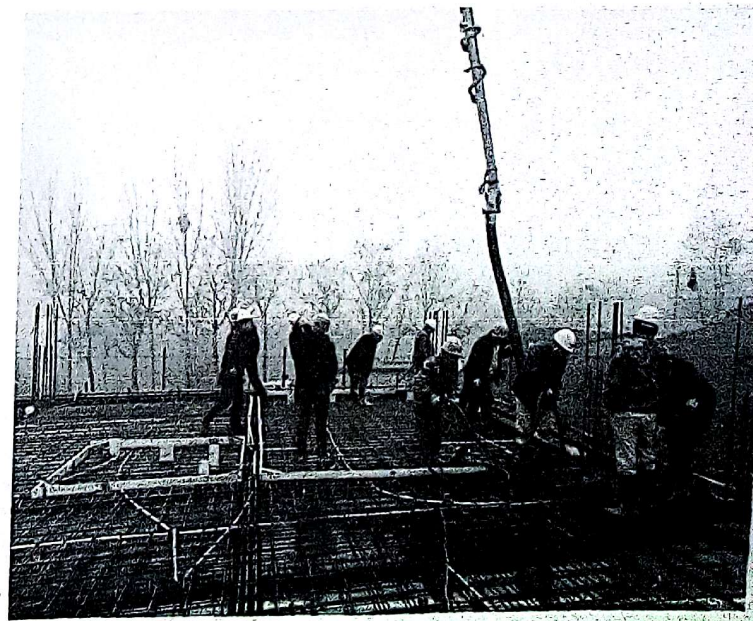

由 扫描全能王 扫描创建
