

监 理 周 报

项目名称：洛阳丰翌新能源有限公司 60MWp 光伏电站项目

项目地：洛阳市新安县五头镇

时间：2017/5/12


本周 施工 概况	光伏区：北沟光伏区电缆沟开挖 2.5 兆瓦； 寺上组件安装 11.5 兆瓦； 梁村安装组件 7 兆瓦； 生活楼：装修，吊顶； 升压站：一次设备安装； 35Kv 线路塔基：混凝土浇筑完成； 110Kv 线路塔基：共计浇筑砼完成共 8 基塔基；
施工 质量 情况	通过各单位的通力配合，工程已有明显好转
材料进 场 情况	管桩；支架；组件；
材料 进场 检验	进场产品合格证齐全，包装完整。
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程
发文 情况	下发监理周报；监理例会会议纪要



由 扫描全能王 扫描创建

安全情况	通过整改，现场安全情况已有好转						
下周工作要点	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、做好现场施工的质量把控 2、做好隐蔽工程的拍照留存，按要求验收 3、检查光伏区电缆沟是否符合要求 4、检查塔基基础情况 5、检查支架及组件的安装质量 6、检查材料是否符合图纸要求						
天气	6	7	8	9	10	11	12
	多云	多云	多云	晴	晴	晴	晴

编制人：厉生雷 审核人：刘士发 编制时间：2017年5月12日

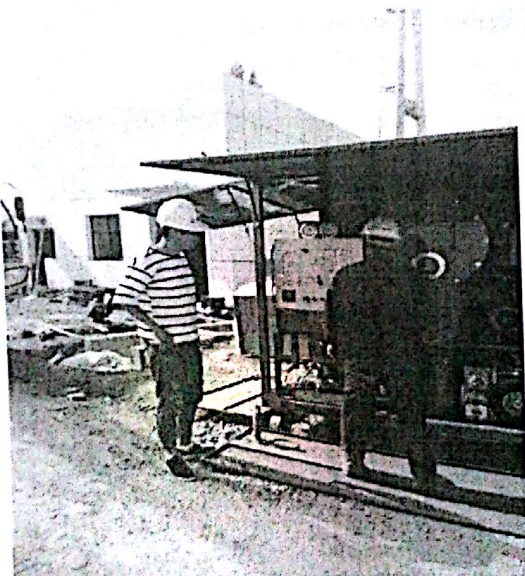

附现场施工照片

