

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

1、本周项目进展情况

- 1) 施工准备工作及手续办理：林业局国土局批复
- 2) 设计工作：施工图未进行设计交底及图纸会审。
- 3) 土建工程：升压站办公楼室内地坪浇筑完成，正在进行砖砌体砌筑；电气综合楼室内满堂架搭建，屋面梁钢筋绑扎。光伏区 8 号方阵混凝土灌注桩试桩施工。
- 4) 送出工程：外线共浇筑了 27 基塔基基础。
- 5) 主设备到货情况：管桩到货 10784 根。
- 6) 安全、文明生产情况：总包对施工方进行了森林防火技术专项交底。

2、下周工作计划

外线：42-44 号基础浇筑完成，铁塔组立。

内场：升压站部分：电气楼室内满堂架搭建完成，柱、梁、板支模板并浇筑完成；办公楼砖砌体砌筑完成，构造柱钢筋绑扎并浇筑完成。挡土墙开挖完成。

光伏场区部分：4 个方阵动工场平，挖机三台，打桩机 2 台；8 号方阵混凝土灌注桩施工完成。

3、存在问题及需要协调事宜

合同、资金

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础开始施工		因为土地问题 暂未施工
首个光伏发电单元开始安装		因为土地问题 暂未施工
开关站基础开始浇筑	2017 年 3 月 14 日	实际 2017 年 3 月 18 日浇筑
综合楼屋面封顶	2017 年 4 月 8 日	
开关站受电	2017 年 6 月 18 日	
首个光伏发电单元发电	2017 年 7 月 16 日	
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时 并网试运行	2017 年 6 月 18 日	
项目整体正式移交生产	2017 年 7 月 16 日	

5、现场影像资料



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD.

工程名称: 盘县老黑山50MW光伏电站项目

活动内容: G37基础开挖

当前日期: 2017年4月01日



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD.

工程名称: 盘县老黑山50MW光伏电站项目

活动内容: G39基础开挖

当前日期: 2017年4月01日



2017/04/01

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.


工程名称:盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目
活动内容:升压站办公楼室内卫生间预埋管道施工
当前日期:2017年4月01日



2017/04/01

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.


工程名称:盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目
活动内容:升压站办公楼砖砌体砌筑
当前日期:2017年4月01日

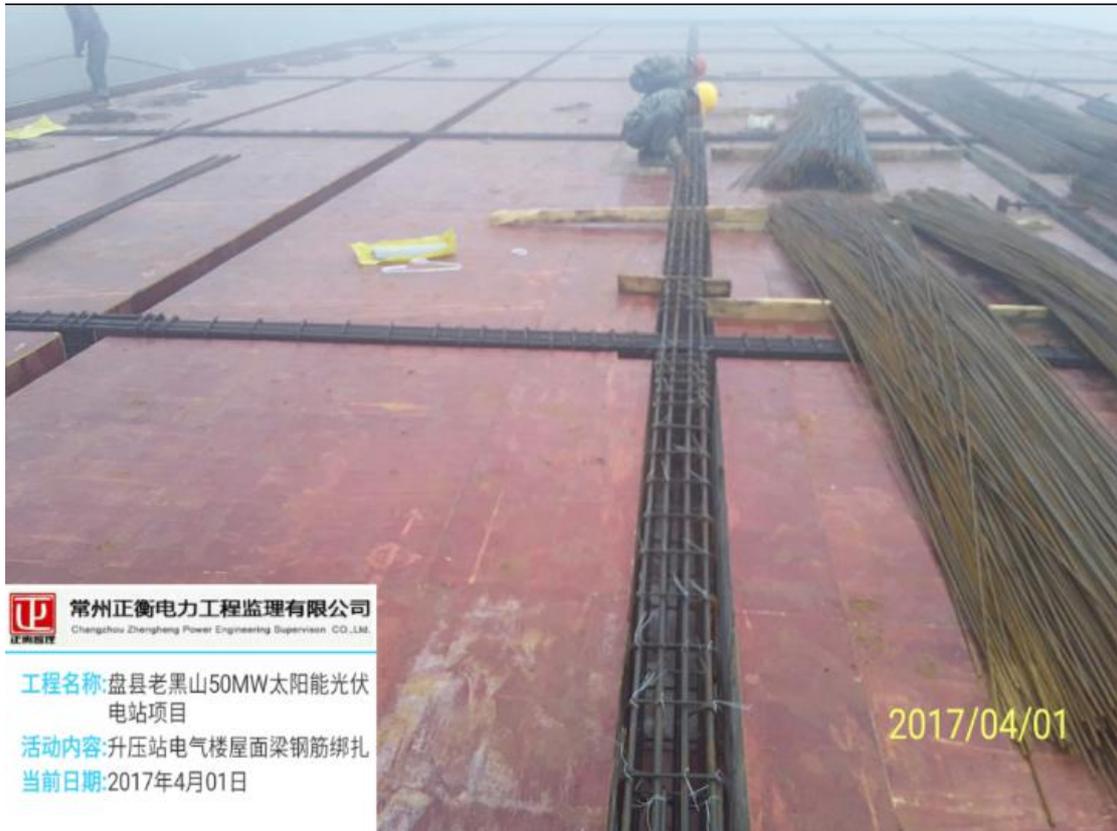

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目
活动内容: 升压站电气楼屋面梁钢筋绑扎
当前日期: 2017年4月01日

2017/04/01

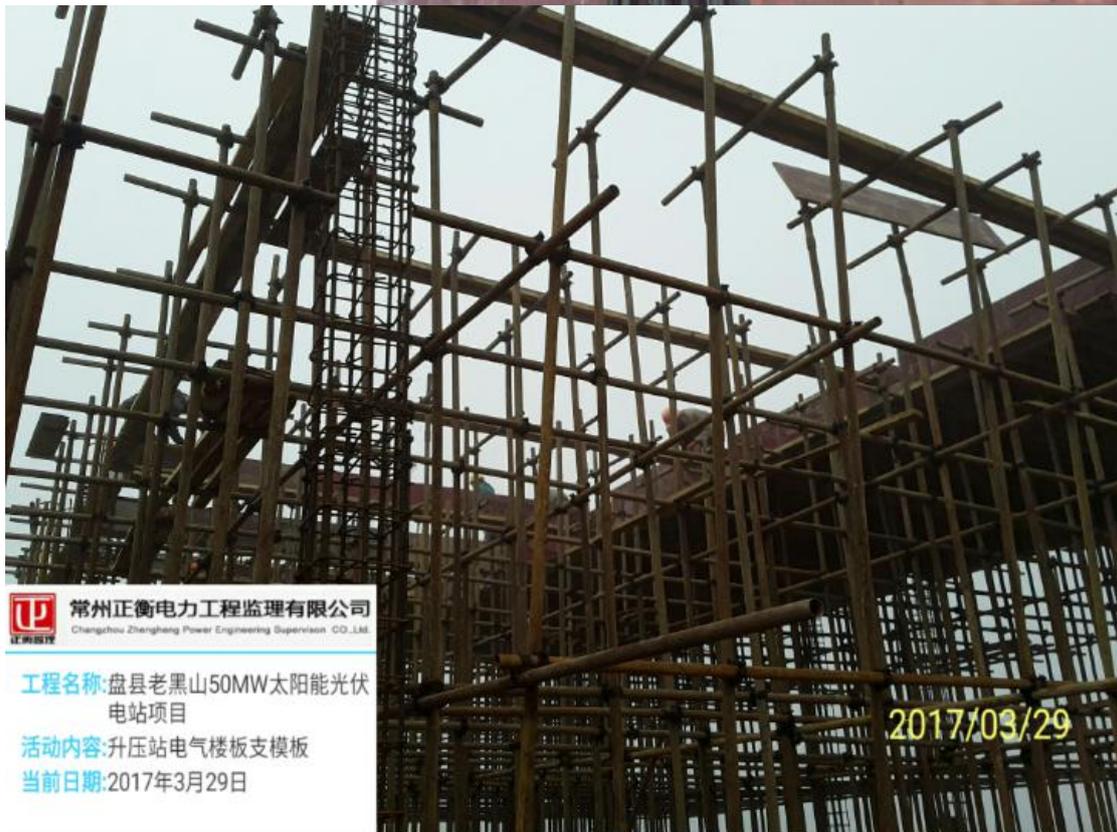

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目
活动内容: 升压站电气楼板支模板
当前日期: 2017年3月29日

2017/03/29



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

活动内容: 升压站办公楼土方回填并夯实

当前日期: 2017年3月29日

2017/03/29



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

活动内容: 升压站电气楼框架柱钢筋绑扎

当前日期: 2017年3月29日

2017/03/29



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

活动内容: 光伏区8号方阵混凝土灌注桩试桩

当前日期: 2017年3月29日

2017/03/29



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

活动内容: 升压站办公楼卫生间管道预埋

当前日期: 2017年3月28日

2017/03/28



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

活动内容: 升压站办公楼室内土方回填

当前日期: 2017年3月28日

2017/03/28



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

活动内容: 升压站电气楼室内满堂架搭建

当前日期: 2017年3月27日

2017/03/27



 **常州正衡电力工程监理有限公司**
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

活动内容: 外送线路33#塔基础立塔

当前日期: 2017年3月27日

2017/03/27



 **常州正衡电力工程监理有限公司**
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO.,LTD.

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目

活动内容: 办公楼砖基础砌筑

当前日期: 2017年3月26日

2017/03/26

