

盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

1、本周项目进展情况

- 1) 施工准备工作及手续办理： 林业局国土局批复
- 2) 设计工作：
 - ①场内升压站电气楼、办公楼图纸完成；
 - ②南区桩位图已完成。
- 3) 土建工程：
 - ①升压站办公楼砖基础砌筑完成，正在进行构造柱模板安装；
 - ②电气综合楼屋面封顶，正在进行女儿墙砖砌体砌筑；
 - ③挡土墙搭建施工中；
 - ④生活污水处理系统-化粪池垫层浇筑正在施工中；
- 5) 送出工程： 外线共浇筑了 31 基塔基基础。
- 6) 主设备到货情况：管桩到货 10767 根。
- 7) 安全、文明生产情况：总包对施工方进行了森林防火技术专项交底以及脚手架搭建技术安全交底。

2、下周工作计划

- 外线：36-41 号基础浇筑完成，铁塔组立。
- 内场：升压站部分：
 - ①电气楼室屋面女儿墙砖砌体砌筑；
 - ②办公楼砖砌体砌筑完成，构造柱模板安装完成以及圈梁钢筋绑扎完成；
 - ③生活污水处理系统土方开挖
- 光伏场区部分：
 - ①4 个方阵动工场平，挖机三台，打桩机 2 台；
 - ②南区 5 号方阵桩机钻孔施工并进行混凝土灌注桩施工。

3、存在问题及需要协调事宜

- ①光伏区打桩机钻孔施工进度缓慢，施工方正在商讨中。
- ②缺少升压站设备基础图、室内电缆沟图

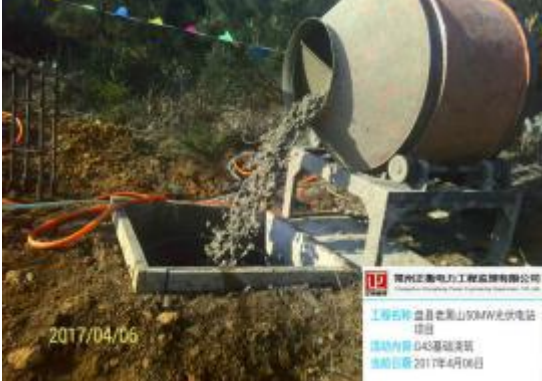
4、里程碑节点执行情况

里程碑节点名称	完成时间	备注
首个光伏发电单元基础开始施工		因为土地问题 暂未施工

首个光伏发电单元开始安装		因为土地问题 暂未施工
开关站基础开始浇筑	2017 年 3 月 14 日	实际 2017 年 3 月 18 日浇筑
综合楼屋面封顶	2017 年 4 月 8 日	实际 2017 年 4 月 4 日封顶
开关站受电	2017 年 6 月 18 日	
首个光伏发电单元发电	2017 年 7 月 16 日	
全部光伏发电单元整套启动开始 240 小时 并网试运行	2017 年 6 月 18 日	
项目整体正式移交生产	2017 年 7 月 16 日	

5、现场影像资料

	
G24 铁塔组立	G25 铁塔组立
	
生活污水处理系统-化粪池土方开挖	升压站办公楼构造柱支模板

 2017/04/08	 2017/04/06
升压站办公楼砖砌体砌筑	升压站办公楼雨蓬浇筑混凝土
 2017/04/05	 2017/04/03
升压站电气楼屋面楼板洒水养护	升压站电气楼柱、梁、板浇筑混凝土
 2017/04/03	 2017/04/06
升压站电气楼柱、梁、板质量验收	G43 基础浇筑混凝土
