

工程建设监理周报

2018 年 12 月 17 日 第二期

老坝港光伏电站容配比优化改造工程		填报周期：2018 年 12 月 11 日—12 月 17 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、弘煜区拆装组件完成 4480 块。				
2、建海区组件安装完成约 300 块。				
3、建海区柱头焊接完成 524 根。支架完成 48 架				
目前施工进度与所报施工计划稍滞后，要求施工单位进行赶工措施，已落实并进行赶工措施。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、打桩	100%	全部完成，消缺整改		
2、弘煜组件拆装	95%	工人多为当地百姓，专业性不高，但在可控状态		
3、建海区柱头焊接	55%			
4、建海区支架安装	20%	施工人员偏少造成工程量滞后		
5、建海区组件安装	20%	施工人员偏少造成工程量滞		
9、出图情况	电子版图纸，部分图纸			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2018、12、	2018.05.	满足现场施工条件

		10	10	
	组件	2018、11、25	2018、11、25	全部到齐
	一二次电气设备			
11、人员/机械情况	挖机 1 台、，打桩机 1 台，施工人员 28 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个管桩施工	20181203		20181203	
2、首套组件安装	20181205		20181205	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、打桩				
2、弘煜组件拆装	100%			
3、建海区柱头焊接	100%			
4.建海区支架安装	85%			


常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

5 建海区组件安装	85%
7、出图情况	电子版图纸，部分图纸

填报人： 李金梁 审核人： 苗守明 时间： 2018 年 12 月 17 日



工程现场照片（含文字描述）：

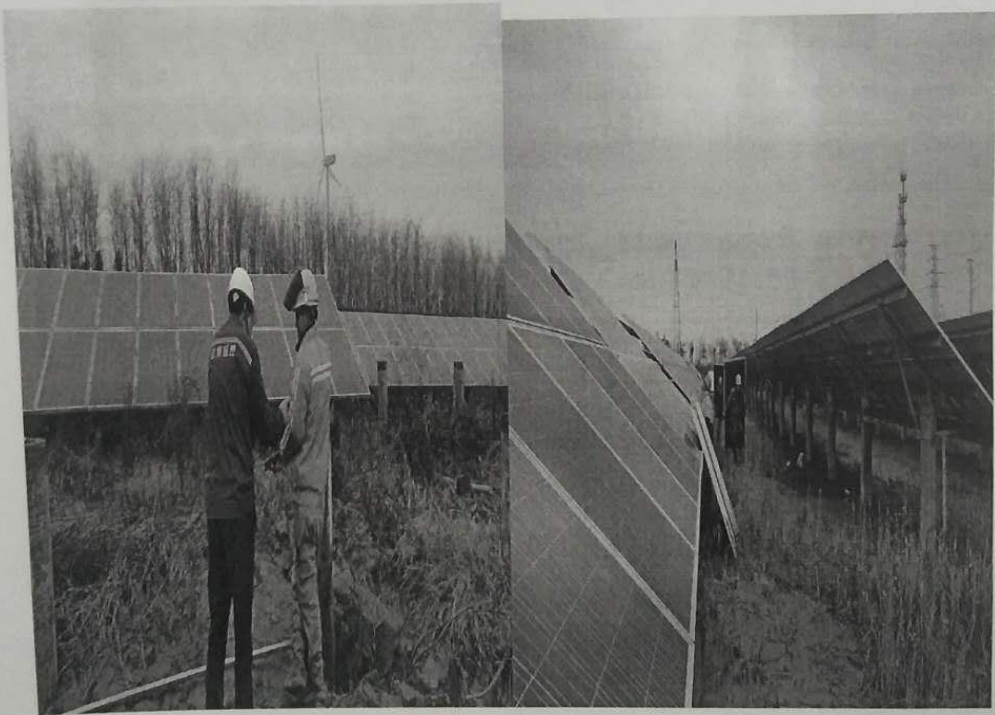

指导支架安装	组件拆除
--------	------



检查组件安装



指导组件做防护
