

工程建设监理周报

2018 年 12 月 31 日 第四期

老坝港光伏电站容配比优化改造工程		填报周期：2018 年 12 月 24 日—12 月 31 日
一、项目总体建设进度汇总： 二、 1、建海区支架安装、组件安装、柱头焊接全部完成。 2、建海 1 区 2 区并网发电。 3、建海区直流电缆低压电缆完成 650 米。 4、电缆桥架、接地安装完成约 900 米。 5、汇流箱安装全部完成。		
二、本周工程建设工作内容及完成情况		
1、打桩	100%	全部完成，消缺整改
2、弘煜组件拆装	100%	
3、建海区柱头焊接	100%	
4、建海区支架安装	100%	
5、建海区组件安装	100%	
6、电缆桥架安装	45%	
7、直流柜改造、逆变器改造		
8、接地工程	35%	
9、汇流箱安装	100%	
10 直流电缆、低压电缆敷设	30%	
11、出图情况	电子版图纸，部分图纸	


12、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2018、12、10	2018.05.10	满足现场施工条件
	组件	2018、11、25	2018、11、25	全部到齐
	一二次电气设备			
13、人员/机械情况	施工人员 18 人			
三、截止本周建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个管桩施工	20181203		20181203	
2、首套组件安装	20181205		20181205	
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网	20181231		20181231	
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	无			
未解决的协调问题解决进展	无			
五、下周计划主要工作内容				
1、电缆桥架安装	100%			

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

逆变器改造	
3、接地工程	100%
4.直流电缆，低 压电缆敷设	100%
5.鼎辉区支架 组件安装	
7、出图情况	电子版图纸，部分图纸

填报人：李金梁 审核人：苗守明 时间：2018 年 12 月 31 日

工程现场照片（含文字描述）

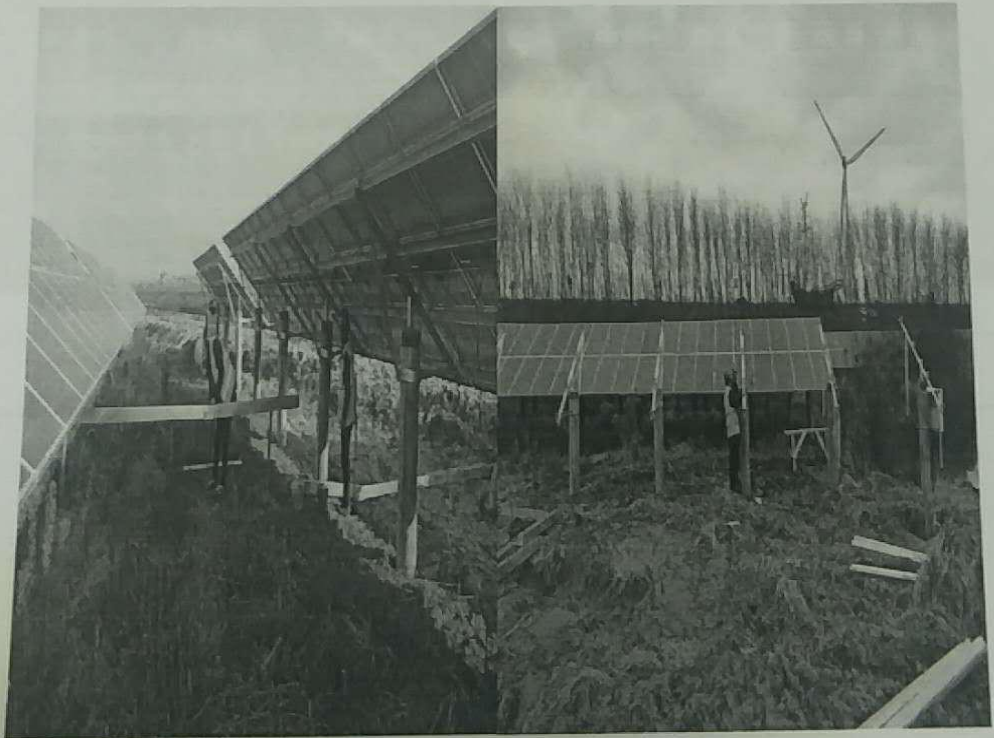

桥架安装

支架安装



组件安装

接地未安装牢固
