

安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目工程监理周报

2017 年 3 期

项目：		填报周期：2017 年 03 月 26 日—04 月 01 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、子系统打孔完成 0.88MW，累计完成 32.88MW；				
2、子系统基础浇筑完成 1.85MW，累计完成 24.54MW；				
3、升压站管理区渣土清理完成 8.76%，累计完成 100%；				
4、电控楼基础开挖完成 20%，累计完成 20%；				
5、综合楼基础开挖完成 100%，累计完成 100%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、升压站	升压站管理区渣土清理完成 8.76%，累计完成 100%； 电控楼基础开挖完成 20%，累计完成 20%；			
3、综合楼/附属建筑	综合楼基础开挖完成 100%，累计完成 100%；			
4、场内桩基施工	子系统基础打孔完成 0.88MW,累计完成 32.88MW； 子系统基础浇筑完成 1.85MW，累计完成 24.54MW；			
5、支架及组件安装	未施工			
6、逆变器及箱变	未施工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试	未施工			
9、出图情况	升压站进场道路图/升压站场平图/电控楼基础图/电控楼建筑结构图/综合楼基础图/综合楼建筑结构图/220Kv 配电装置构架图/动态无功补偿装置设备基础图/避雷针图纸/GIS 基础图/围栏示意图/光伏支架基础图已完成			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2017.03.27		本周未到货，延误原因：未支付预付款，措施：加快预付款项支付
	组件	2017.03.30		本周未到货，延误原因：未支付预


				付款，措施：加快预付款项支付
	电缆	2017.04.25		
	一次设备	2017.04.12		
	二次设备	2017.04.22		
	箱变	2017.04.04		
	汇流箱	2017.04.04		
11、人员/机械情况	打孔机械 32 台，挖掘机 5 台，人员：341 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017.03.13		2017.03.06	
2、首套组件安装	2017.03.30			组件未到货，措施：到货后加班抢工
3、线路倒送电	2017.06.09			
4、首个发电单元并网	2017.06.10			
5、全容量并网	2017.06.10			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、集电线路征地滞后，请尽快协调解决； 2、H2/H3/H4/H5/辉渠 9/辉渠 14/辉渠 5/石埠子 41/柘山 7/柘山 8/辉渠 48/Z16 号地块需尽快流转完成；			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	基础开挖完成 80%，基础浇筑完成 100%			
3、电控楼工程	基础浇筑完成 100%			
4、光伏区工程	基础浇筑完成 35MW			
5、逆变/箱变工程	基础开挖完成 10 个；			
6、外线工程	无			

7、其他	集电线路复测完成 100%
------	---------------

填报人：张大宝 审核人：严卫忠 时间： 2017 年 04 月 01 日

工程现场照片（含文字描述）：

地锚桩浇筑

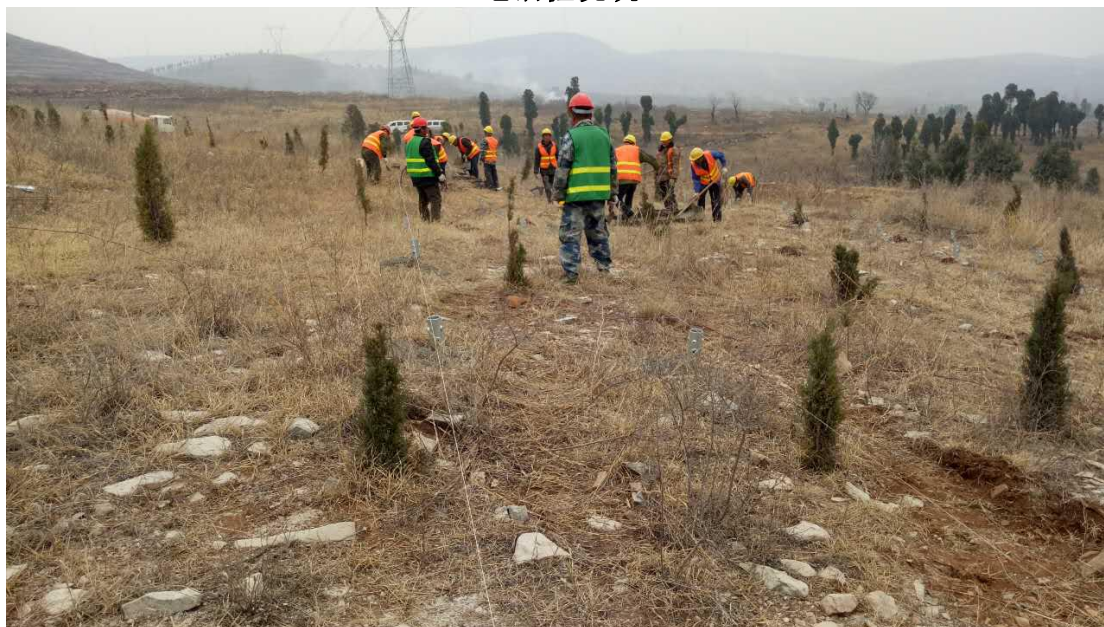

综合楼基础开挖



监理人员现场抽检



地锚桩浇筑作业



地锚桩基础整改

