

安丘市 60MW+80MW 光伏扶贫电站项目工程建设周报

2017 年 2 期

项目：	填报周期：2017 年 03 月 19 日—03 月 25 日			
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、子系统打孔完成 7.29MW，累计完成 36.53MW；</p> <p>2、子系统基础浇筑完成 13.3MW，累计完成 23.69MW；</p> <p>3、升压站管理区渣土清理完成 68.24%，累计完成 91.24%（不包含虚方）；</p>				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、道路工程	无			
2、升压站	渣土清理完成 68.24% ，累计完成 91.24% （不包含虚方）；			
3、综合楼/附属建筑	未施工			
4、场内桩基施工	子系统基础浇筑完成 13.3MW ，累计完成 23.69MW ；			
5、支架及组件安装	未施工			
6、逆变器及箱变	未施工			
7、送出工程（含对侧）	无			
8、现场调试				
9、出图情况	电控楼基础图/电控楼建筑结构图/综合楼基础图/综合楼建筑结构图/动态无功补偿装置设备基础图/升压站场平面图/围栏示意图/光伏支架基础图已完成			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2017.03.27		
	组件	2017.03.30		
	电缆	2017.04.25		
	一次设备	2017.04.12		

	二次设备	2017.04.22		
	箱变	2017.04.04		
	汇流箱	2017.04.04		
11、人员/机械情况	打孔机械：43 台，人员：335 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工	2017.03.13		2017.03.06	
2、首套组件安装	2017.03.30			
3、线路倒送电	2017.06.09			
4、首个发电单元并网	2017.06.10			
5、全容量并网	2017.06.10			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	1、使用北坡降效地块责任归属书面文件，请尽快出具； 2、子系统施工用地流转缓慢，请尽快解决； 3、子系统红线外进场道路，请尽快协调完成； 4、集电线路征地滞后，请尽快协调解决；			
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、道路工程	无			
2、综合楼工程	基础开挖完成 100%			
3、电控楼工程	基础开挖完成 100%			
4、光伏区工程	基础浇筑完成 35MW			
5、逆变/箱变工程	基础开挖完成 8 个；			
6、外线工程	无			
7、其他				


填报人：张大宝 审核人：严卫忠 时间：2017 年 03 月 25 日

工程现场照片（含文字描述）：

升压站渣土倒运



跟踪支架试装

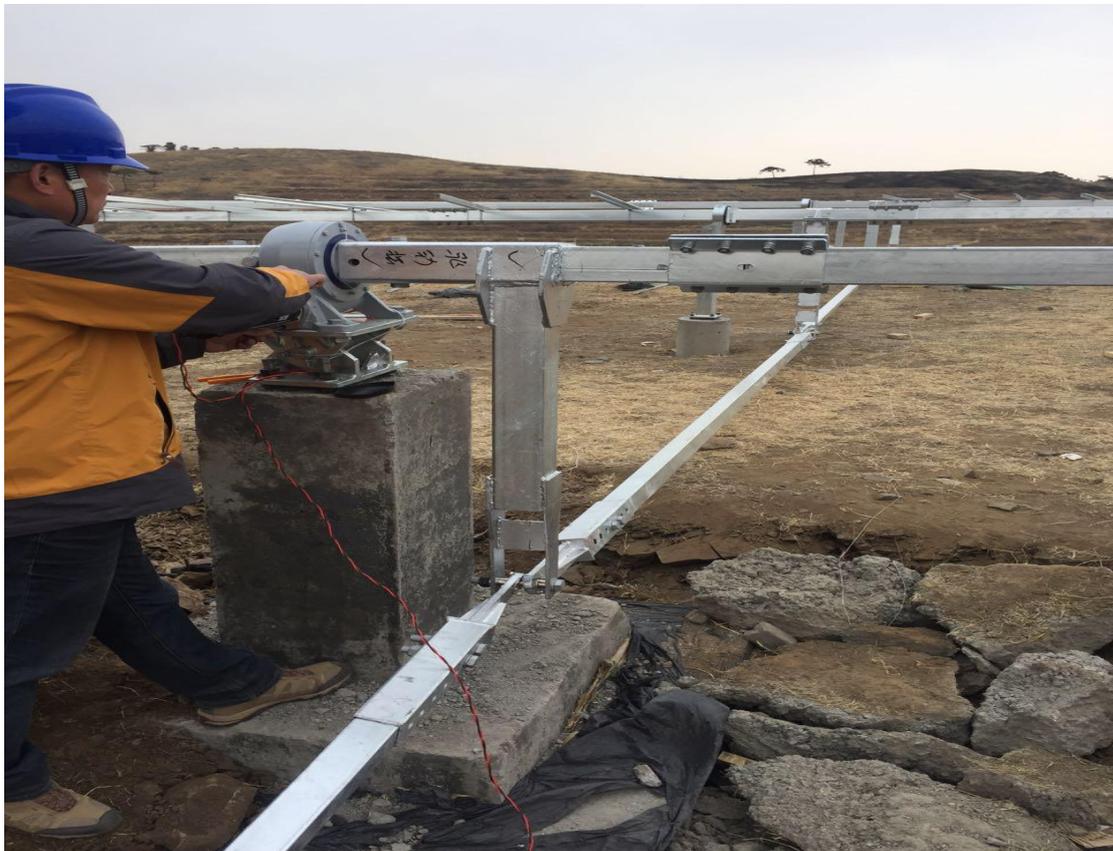

地锚桩浇筑作业



地锚桩钻孔作业



地锚桩浇筑监理人员现场巡检



监理人员现场抽检



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称:安丘惠永60MW+惠利80MW
光伏扶贫电站项目

施工部位:监理在柘山十八地锚桩孔检
验

当前日期:2017年3月24日

2017/03/24
