

湖南华容景港上横州20MWp、和平20MWp分布式农光

互补项目周报(2017.04.23~2017.04.29)



1、本周项目进展

1) 施工准备工作

前期手续办理完成内容：1、项目立项申请及批复；2、项目核准申请及批复
3、建设工程规划申请、许可证；4、项目选址意见书、审查、批复；5、建设用地评估报告、用地申请及各级政府土地主管部门审批文件、国土资源部建设用地预审批复文件；6、地震安全性评价报告、审查、备案；7、节能评估报告及批复；
8、防洪评价报告及审查意见（防洪规划同意书）；9、建设工程文物调查评价报告及文物古迹勘探、发掘、保护工作等报告；10、压覆矿产资源报告（调查表）及审查意见；11、接入系统设计方案、审查；12、项目勘测定界报告及图纸；13、征（占）用林地、林木砍伐可研、审查、许可。

2) 设计工作

施工图审查、图纸移交内容（电子版）：

升压站：配电房及检测楼土建及所有设备基础建筑及结构图。

外线：塔基础施工图；杆塔安装施工图、架线施工图。

光伏区：一期管桩、支架、组件平面及箱逆变基础施工图。

3) 工程建设

光伏区工程：

桩基共计 24360 个/根，完成 11288 根，完成总量 46.33%，支架安装完成 14MWp，完成总量 35%；修路 3.1KM 完成总量 35.6%。箱逆变基础浇筑 2 基。

升压站工程：

配电楼室内外墙壁粉刷完、室内设备基础及电缆沟砌筑完成 80%，SVG 室室内外墙粉刷完、室内设备基础浇筑完，检测房主体砌砖完成 40%，排水管预埋 45%、刀闸构架竖立完，连接变、接地变、FC 基础已全部浇筑完成，避雷针安装 2 座。

送出线路工程：

基础浇筑完成 24 基，完成总量 85.7%。（7、25、27、28 四基正在加紧施工）

正
高
光



组塔 5 基，完成 17.8%。

4) 尾工缺陷

5) 阶段验收

2、下周工作计划

1) 进度计划

光伏区工程：

- (1) 打桩 3000 根。
- (2) 支架安装完成 350 组。
- (3) 箱逆变基础浇筑 4 座。
- (4) 施工便道修筑完。

升压站工程：

- (1) 配电楼、SVG 间内外墙粉刷完。
- (2) 检测楼主体墙砌筑完。
- (3) 构架立柱全部安装完。
- (4) 场外雨水砌筑完、电缆沟完成 50%。
- (5) 配电楼电缆沟及高配电箱基础预埋槽钢完。

3. 送出线路工程：

- (1) 塔基全部浇筑完成。
- (2) 塔杆安装 8 座。

2) 设备采购计划

无

3、存在问题及需要协调事宜

外线

4、现场影像资料







8#塔组立



A型塔吊装灌装

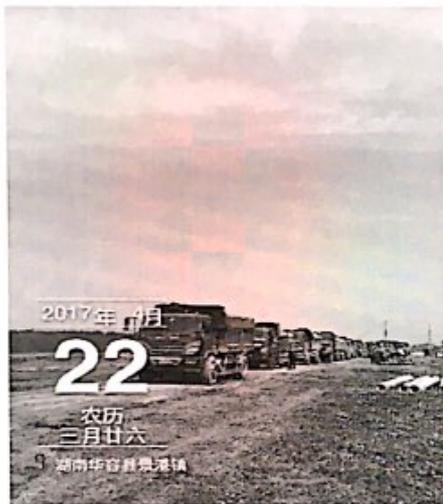

修路石材进场

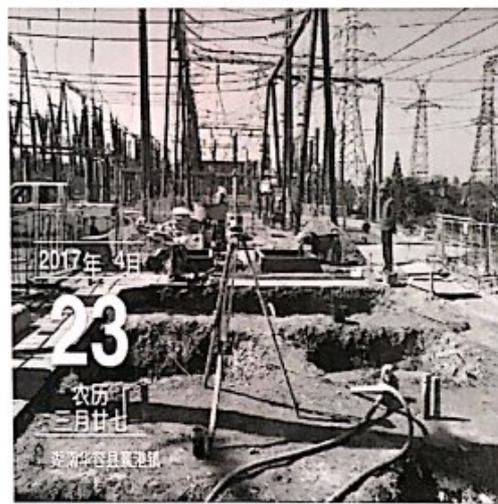

对侧间隔基础制模浇筑




21#组塔



避雷针安装

工程
湖南华容县景港镇



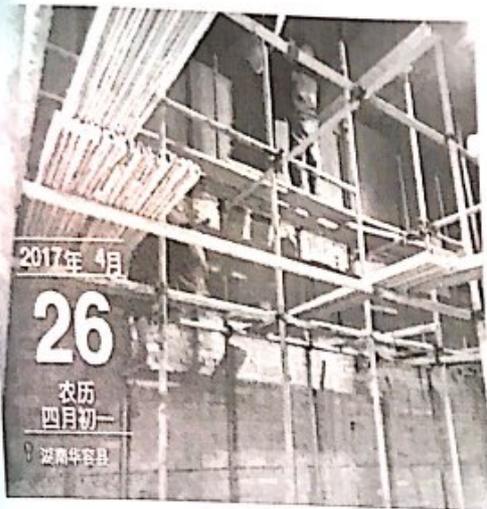

SVG 室内墙粉刷



配电楼排架拆除



光伏区打桩



支架安装



光伏区修路



箱逆变平台浇筑

理有
新
光伏
项目

