

监 理 周 报

项目名称：南网能源南京中建五洲 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB-003

项目地：南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号，南京中建五洲设备制造有限公司厂区内

时间：2017/05/13—2017/05/19

本周 施工 概况	1. 1 期、2 期屋面定位放线、导轨夹具安装 2. 3 期屋面定位放线、导轨夹具安装 3. 5 月 18 日对 3 期材料吊装
施工 质量 情况	目前主要的施工阶段还是屋面夹具的安装，施工质量一般
材料 进场 情况	5 月 18 日进场 3 期导轨： 1、进场导轨—2120，L=2120 的有 2764 支 2、进场导轨—3140，L=3140 的有 5100 支 3、进场导轨—5180，L=5180 的有 156 支 4、进场导轨—6200，L=6200 的有 92 支 5 月 18 日进场 1、2 导轨： 1、进场导轨—6200，L=6200 的有 600 支
材料 进场 检验	进场材料包装完整；相关资质证明文件齐全。
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程



发文情况	第 3 期监理会议纪要 第 2 期监理工程师通知
收文情况	无文件
安全情况	1、本周对上周存在的安全隐患进行检查，目前已有很大改善。 2、3 期屋面临时通道铺设不规范，施工人员上下班未按照铺设的通道行走。 3、吊装材料时未配备散件吊装箱，存在安全隐患；未配备对讲机进行吊装作业。 4、要求施工单位各班组负责人加强对现场施工人员的安全交底工作。
下周工作要点	按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、督促施工单位上报已进场材料的相关证明材料及合格证。 2、严格控制导轨安装、夹具安装的质量情况。 3、做好现场施工人员的安全技术交底工作，杜绝施工人员违章作业。 4、在保证安全、质量的前提下，督促施工单位加快施工进度，按计划完工。
现场施工班组情况	1、2 期厂房施工人员 15 人 3 期厂房施工人员 16 人。



	13	14	15	16	17	18	19
天气		多云	多云	晴	晴	晴	多云

编制人: 吉海平
附现场照片: (6)
监理单位: 上海电力工程监理有限公司
监理项目部

编制时间: 2017 年 5 月 19 日




3 期材料吊装



3 期定位放线




3 期夹具安装

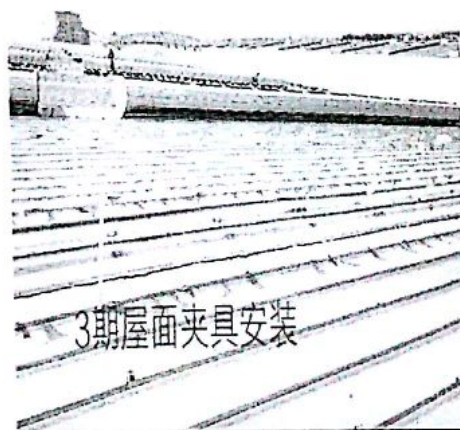


3期屋面夹具安装



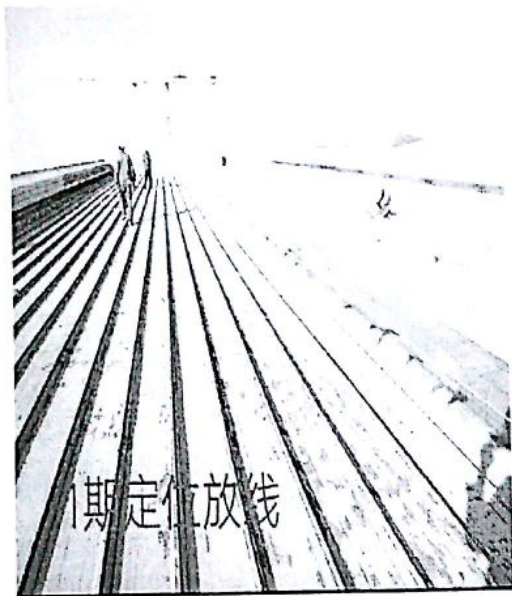

1期定位放线

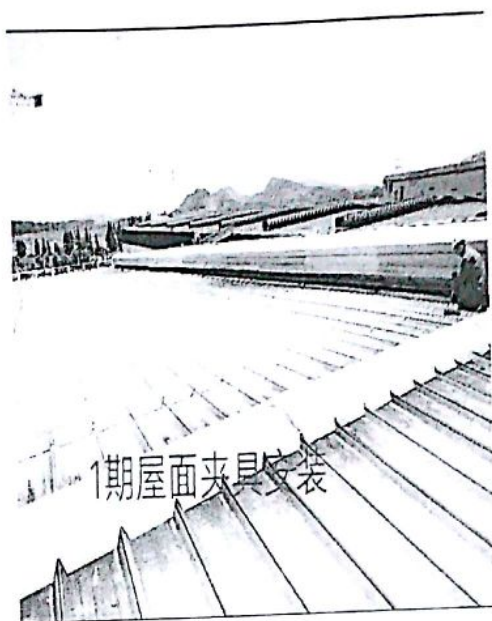

1期屋面来具安装

