

# 监 理 周 报

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB-030

项目地：南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号，南京中建五洲设备制造有限公司厂区内

时间：2017/11/25—2017/12/1

本周 施工 概况	1、三期走道板整改 2、汇流箱接线 3、一二期 4 平方线缆敷设 4、走道板施工、桥架施工
施工 质量 情况	一期屋面桥架未使用铝合金螺栓固定，采用自攻螺丝固定，不符合设计要求。 二期接地搭接面不符合规范。 三期屋面组件与组件之间的接地未做完整，部分接地线固定不到位，导致掉落。
材料 进场 情况	逆变器进场卸货（182 台）
材料 进场 检验	逆变器资料未上报
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程施工
发文 情况	第 30 期会议纪要
收文 情况	未收到文件



安全情况	1、一、二、三期屋顶作业时，个别施工人员未戴安全帽。 2、现场吊装作业时未设置安全警戒线、安全警示牌。 3、其他方面暂无安全问题。						
下周工作要点	1、三期逆变器安装及接线。 2、一二期屋面 4 平方线缆敷设。 3、一、二期屋面接地焊接。 4、三期走道板不符合要求的进行整改。						
现场施工人员班组情况	三期施工人员 12 人 一期施工人员 12 人						
天气	25	26	27	28	29	30	1
	多云	多云	多云	阴	阴	阴	多云

编写人：吉海平

编制时间：2017 年 12 月 1 日

### 附现场照片



二期小厂房 4 平方线缆敷设






逆变器进场



二期接地焊接



二期4平方线缆敷设

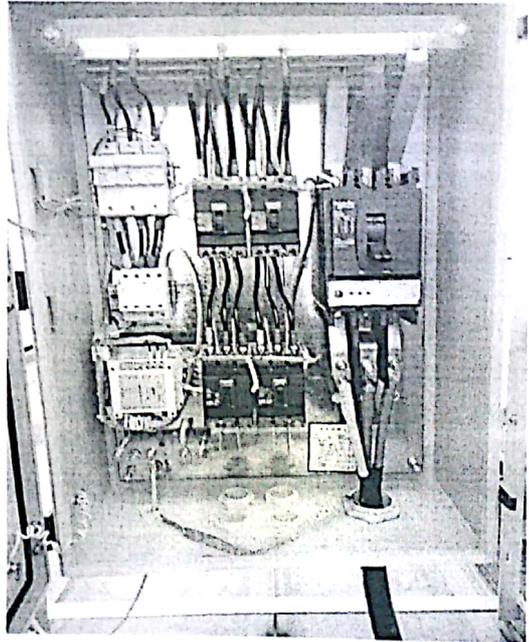

三期汇流箱接线完成

