

监 理 周 报

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB—031

项目地：南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号，南京中建五洲设备制造有限公司厂区内

时间：2017/12/3—2017/12/8

本周 施工 概况	1、三期走道板整改 2、三期逆变器、汇流箱接线 3、一二期 4 平方线缆敷设 4、一二期桥架安装；3×25 线缆敷设 5、一期走道板施工
施工 质量 情况	施工质量一般
材料 进场 情况	本周无材料进场
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程施工
发文 情况	第 31 期会议纪要
收文 情况	未收到文件
安全 情况	1、三期施工人员在逆变器接线过程中未戴安全帽。 2、二期下料工段垂直桥架安装时施工人员未断开航车线路




	施工。 3、施工现场垃圾清理不及时 4、施工负责人对施工人员安全交底工作不到位。						
下周工作要点	1、三期逆变器安装及接线。 2、一、二期屋面电缆敷设；接地施工。 3、一、二期屋面逆变器安装；走道板安装。 4、三期组件之间接地线整改。						
现场施工人员班组情况	三期施工人员 7 人 一二期施工人员 12 人						
天气	2	3	4	5	6	7	8
	多云	多云	多云	阴	阴	阴	多云

编写人：吉海平


编制时间：2017 年 12 月 8 日

附现场照片

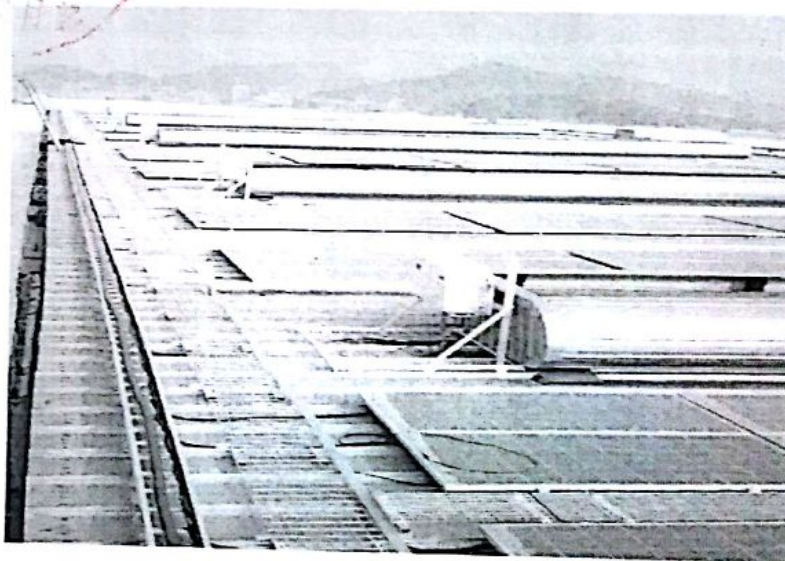

逆变器安装




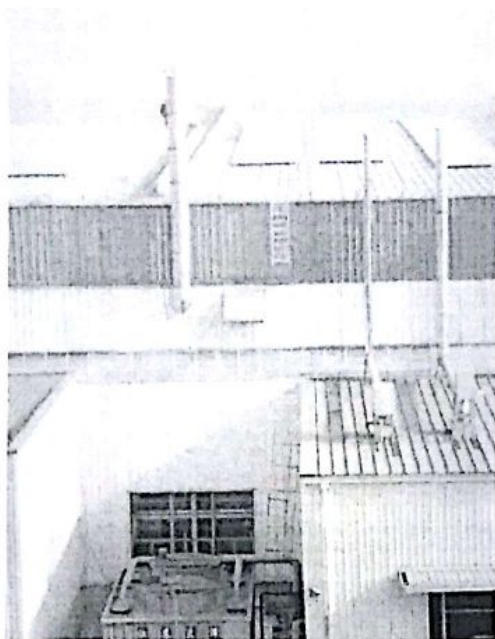

一期垂直桥架安装



逆变器接线

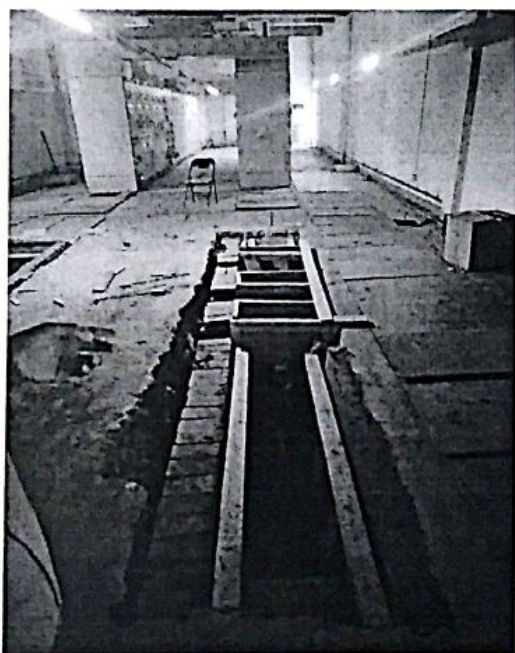

二期下料厂房箱变基础施工



设备基础施工

