

监 理 周 报

项目名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB-032

项目地：南京经济技术开发区栖霞园区七乡河大道 88 号，南京中建五洲设备制造有限公司厂区内

时间：2017/12/9—2017/12/15

本周 施工 概况	1、三期环网接地焊接 2、三期组件间的接地安装 3、一、二期屋顶逆变器、汇流箱安装 4、一、二期屋顶 3×25 线缆敷设
施工 质量 情况	施工质量一般
材料 进场 情况	本周无材料进场
材料 进场 检验	无
隐蔽 验收 情况	暂无隐蔽工程施工
发文 情况	第 32 期会议纪要 下发监理通知单（010）
收文 情况	未收到文件
安全 情况	1、一、二期屋顶部分施工人员在施工过程中未戴安全帽。 2、三期屋顶施工时个别施工人员有抽烟现象。 3、一、二期屋顶吊装时，未设置安全标语标牌



	4、施工负责人对施工人员安全交底工作不到位。						
下周工作要点	1、三期厂区高压电缆敷设。 2、一、二期屋面电缆敷设：接地施工。 3、一、二期屋顶走道板安装。 4、一、二期屋顶逆变器、汇流箱电缆头制作及接线。						
现场施工人员班组情况	三期施工人员 7 人 一二期施工人员 12 人						
天气	9	10	11	12	13	14	15
	多云	晴	晴	晴	多云	小雨	小雨

编写人：吉海平


编制时间：2017年12月15日

附现场照片






一、二期电缆截取

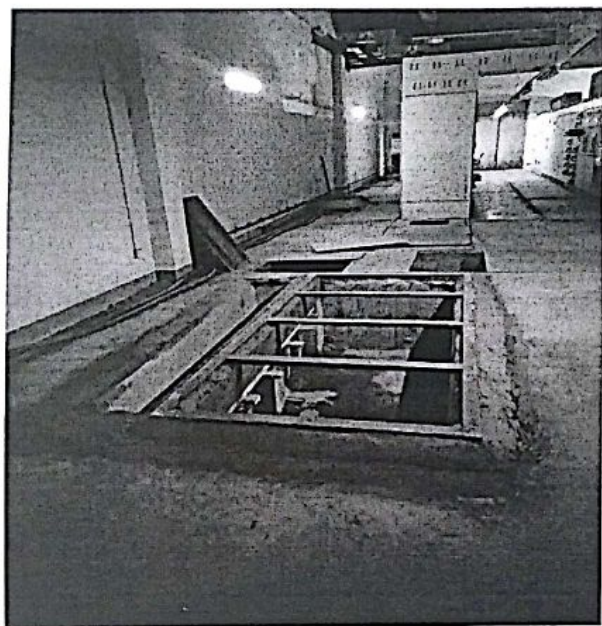

一、二期一次设备基础混凝土浇筑

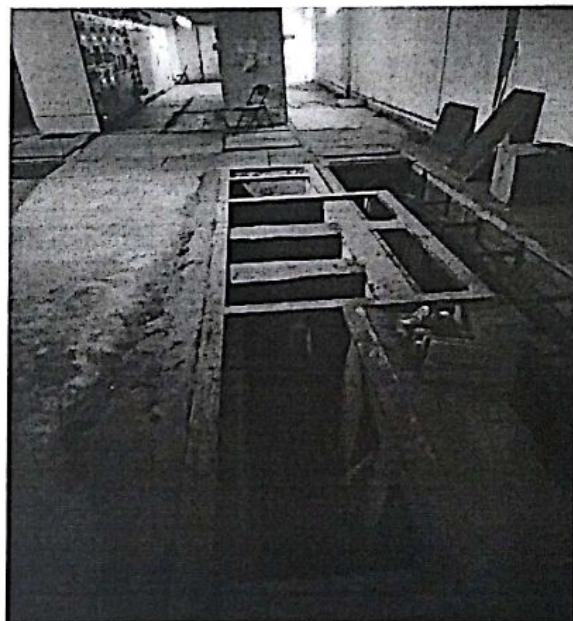

二期成品工段箱变基础混凝土浇筑

