

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

17 年 01 期

项目：山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目			填报周期：17 年 03 月 25 日—03 月 31 日	
一、项目总体建设进度汇总： A、组件支架基础浇筑已完成 30%； B、支架安装已完成 28 个屋面； C、接地装置安装已完成 13 个屋面； D、电缆支架(桥架)安装已完成 18 个屋面； E、彩钢瓦屋顶加固已完成 8 根； F、汇流开关站基础已完成 4%。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、土建工程	已完成 30%			
（1）组件支架基础浇筑				
（2）汇流开关站基础	已完成 4%			
（3）场区内电缆沟开挖及顶管	未展开			
（4）电缆井砌筑	未展开			
2、阵列区机电安装工程	已完成 28 个屋面			
(1)支架安装				
(2)接地装置安装	已完成 13 个屋面			
(3)电缆支架(桥架)安装	已完成 8 个屋面			
(4)彩钢瓦屋顶加固	已完成 8 根			
3、现场调试	无			
9、出图情况	汇流站平面施工图、光伏组件施工图			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）% 延误原因及催货措施
	无			
	无			

	无			
	无			
	无			
	无			
	无			
	无			
11、人员/机械情况	人员 106 人，挖机 2 台，铲车 1 台。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、首个基础施工				
2、首套组件安装				
3、线路倒送电				
4、首个发电单元并网				
5、全容量并网				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	屋顶加固进度缓慢。			
未解决的协调问题解决进展	与园区协商作业计划、顶管施工计划。			
五、下周计划主要工作内容				
1. 顶管工作施工开始； 2. 送出工程签订； 3. 送出工程合同签订。				

填报人： 常庆斌 审核人： 徐彪 时间： 2016.03.31

工程现场照片（含文字描述）：




正在召开第一次工程例会。



35kV 汇流站工人正在施工。



D4-2 理货区工人正在支架安装。

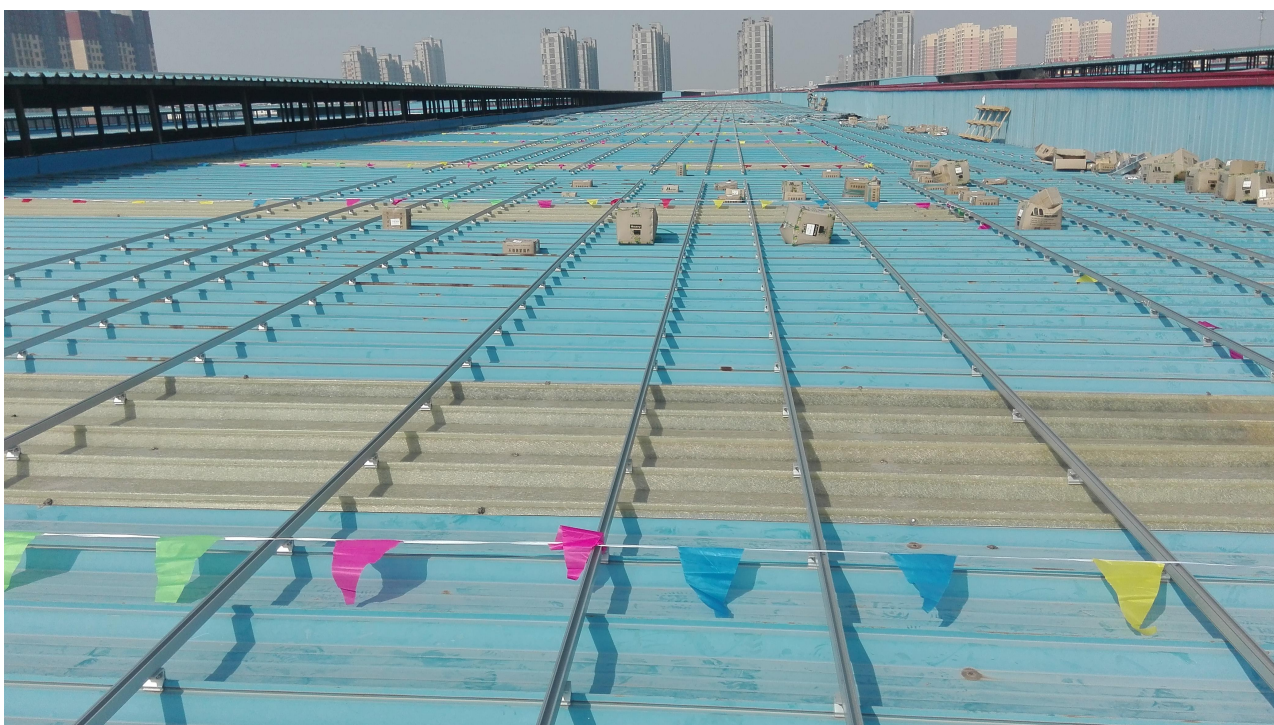

一号交易大厅屋顶的采光带周围安装警戒彩带。
