

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

监 理 周 报

第六期

(2017 年 5 月 1 日-2017 年 5 月 7 日)




常州正衡电力工程监理有限公司


商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

工程名称	商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目	建设单位	商洛市商州区北电光伏科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	施工单位	中国能能源建设集团北京电力建设公司
本周施工内容及进度	光伏区本周施工情况： 1. 定位放点累计完成：6190 个，累计 9.15MWp。 2. 桩基成孔 406 个，累计完成：5832 个，累计 8.6MWp。 3. 混凝土灌注桩 1335 个，累计完成 4117 个，累计 6.0MWp。 4. 支架安装 156 组，累计完成 610 组，累计 3.6MWp。 5. 接地扁铁沟开挖累计完成 2.7MWp。 升压站本周施工情况： 1. 升压站进行土方开挖。		
安全文明施工情况	1、要求进场工人进行安全三级教育（进行中）。 2、现场现场多处布置了警示牌。 3、现场安全消防自检自查。 4、现场道路进行平整畅通		
施工质量	1、对支架进行验收 2、对焊接的接地扁铁进行检验。		
设备材料进场情况	1、水泥、砂子、石子进场 2、接地扁铁进场 3、光伏板、支架组件进场		

人员机械情况	1、本周施工人员共计 113 人 2、挖机 6 台、打桩机 3 台、装载机 4 台、搅拌机 2 台
下周施工安排 (5 月 7 日-5 月 14 日)	1、光伏场区道路修整、场地平整 2、光伏场区桩基成孔（补桩） 3、光伏场区桩基浇筑 4、光伏场区支架安装 5、箱变基础开挖 6、升压站土方开挖

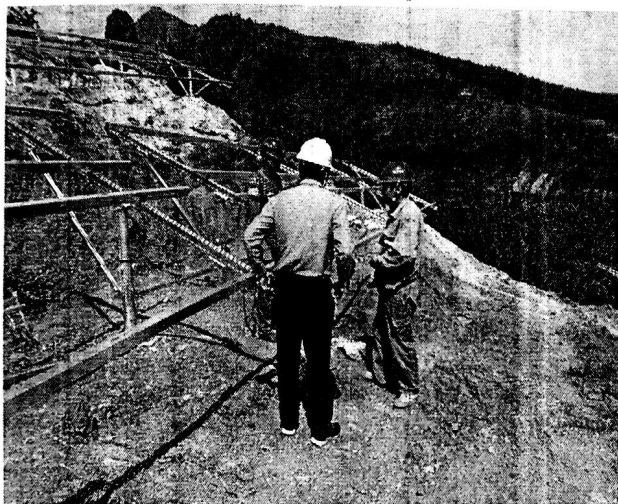

支架验收

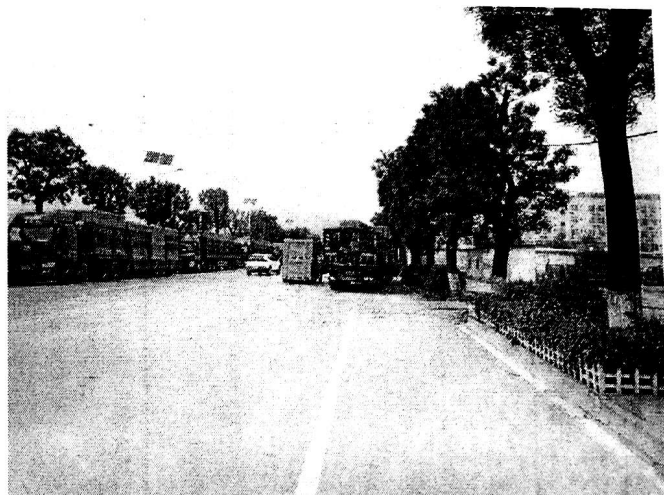

组件进场



升压站土方外送
