

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

监 理 周 报

第九期

(2017 年 5 月 22 日-2017 年 5 月 28 日)

编制: 吴振东

审批: 赵焕新

常州正衡电力工程监理有限公司

商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目

工程名称	商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目	建设单位	商洛市商州区北电光伏科技有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	施工单位	中国能能源建设集团北京电力建设公司
本周施工内容及进度	光伏区本周施工情况： 1、定位放点累计完成 48%。 2、桩基成孔、人工成（补孔）累计完成：6370 个，累计 47%。 3、混凝土灌注桩（补桩）累计完成 6121 个，累计 46%。 4、支架安装累计完成 1367 组，累计 40%。 5、组件安装 537 组，累计完成 747 组，累计 22%。 6、接地沟开挖累计完成 38%；电缆沟累计开挖 30%。 7、箱变基础砌砖墙累计完成 2 个；逆变器基础、汇流箱基础累计完成 36 个。 8、塔基基础土方开挖完成。		
安全文明施工情况	1、现场安全消防自检自查。 2、安全列会。		
施工质量	1、箱变基础施工进行检查。 2、对焊接的接地扁铁进行检验。 3、光伏板开箱发现一块破损。		
设备材料进场情况	1、水泥、砂子、石子进场。 2、砌筑用砖、钢筋、塔基预埋件。		

人员机械情况

1、本周施工人员共计 185 人。

2、挖机 7 台、打桩机 1 台、装载机 5 台、搅拌机 2 台。

下周施工安排
(5 月 29 日-6 月 4 日)

1、组件安装完成 7.5 兆瓦

2、支架安装完成

3、光伏场区接地、电缆沟施工

4、综合配电室基础梁


5、光伏场区电缆敷设。

6、箱变基础及塔基施工。

7、护坡护墙土方开挖。

8、综合配电室基础垫层，独立基础。

9、外线塔基基础施工。

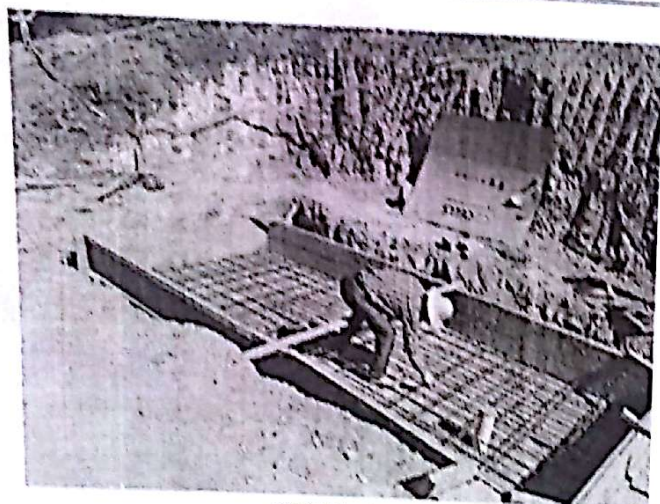

箱变基础施工



组件按装



升压站土地平整



圆梁钢筋绑扎
